MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

CRO/12
2909

DIEx Nº 468-Sec Tec/CRO/12
EB: 64333.003168/2023-92

Manaus, 30 de agosto de 2023.

Do Chefe da Seção Técnica
Ao Sr Chefe da Salc
Assunto: Termo de Contrato nº 02/2023 - Justificativa para aditivo de acréscimo e supressão de serviços
Anexos:
1) 202302TA01_280823; e
2) 202302_TA01_CS_assinado.

1. Acerca do assunto, solicito ao senhor, confeccionar e propor ao senhor Ordenador de Despesas desta Comissão Regional de Obras, minuta de **Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 02/2023**, relativo à **Concorrência Pública 09/2022**, cujo objeto trata-se da obra de engenharia visando a **construção do pavilhão da 2ª Cia de Fuzileiros do 7º BIS, em Boa Vista/RR**, e submetê-lo à aprovação jurídica pela Consultoria Jurídica da União (e-CJU).

2. Sugiro, incluir o Checklist de encaminhamento de Termo Aditivo na lista de verificação dessa Seção e solicito que, antes de ser encaminhado o processo para a CJU, essa Chefia faça a conferência de toda a documentação.

3. Solicito, ainda, que a Seção Técnica seja mantida informada quanto ao andamento do respectivo processo, informando tempestivamente quaisquer necessidades de informação e/ou retorno daquela Consultoria Jurídica.

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS - Maj
Chefe da Seção Técnica

Ten. Braulio
Ten. Carneiro

CRO/12
2910
PLS

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 12ª REGIÃO MILITAR
CHECK LIST – ENCAMINHAMENTO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA.

1. Cada item da Lista de Verificação foi conferido com base nos documentos entregues pela CONTRATADA e gerados pela FISCALIZAÇÃO do Contrato.

2. O resultado da inspeção da presente Lista de Verificação foi anotado nos campos disponíveis.

3. DADOS DO CONTRATO

3.1	Objeto: Construção do Pavilhão 2º Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR				
3.2	Empresa executora:	MLOBATO ENGENHARIA EIRELI			
3.3	Nº TC:	**02/2023**			
3.4	Valor inicial contratado:	R$	6.630.295,32		
3.5	Valor acrescido:	R$	-		
3.6	Valor suprimido:	R$	-		
3.7	Valor total apostilado:	R$	-		
3.8	Valor atual do contrato:	R$	6.630.295,32		
3.9	Vigência do contrato inicial:	04/04/2023	a	20/09/2025	
3.10	Aditamento de vigência:	900 dias			
3.11	Vigência do contrato atual:	04/04/2023	a	20/09/2025	
3.12	Data da Ordem de Serviço:	08/05/2023			
3.13	Período de execução inicial:	08/05/2023	a	27/04/2025	
3.14	Aditamento de prazo de exec.:	720 dias			
3.15	Período de execução atual:	08/05/2023	a	27/04/2025	

4. INFORMAÇÕES QUANTO AO CRONOGRAMA

Valor previsto	%	Valor executado	%	Obra no prazo?
R$ 53.392,50	0,81%	R$ 58.188,85	0,88%	

5. Tabela Resumo de Termos Aditivos

	Acréscimos (R$)	Supressões (R$)	Prazo de Execução	Prazo de Vigência
TA 01	R$ 391.984,05 5,91%	R$ -	120,00	900,00
Total	R$ 391.984,05 5,91%	R$ -	120,00	900,00

6. ANEXOS

ITEM		Conformidade		
		SIM	NÃO	Observações
5.1	Solicitação da Contratada	X		Sem alteração
5.2	Justificativa do fiscal	X		Sem alteração
5.3	Planilha orçamentária	X		Sem alteração
5.4	Projetos (plantas) e desenhos do projeto atualizado contemplando as alterações propostas no aditivo		X	Não é o caso
5.5	Declaração de concorde do Projetista Originário com as modificações propostas no aditivo		X	Não é o caso
5.6	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Aditivo		X	Não é o caso
5.7	Cronograma físico-financeiro vigente	X		Sem alteração
5.8	Cronograma físico-financeiro proposto	X		Sem alteração
5.9	Memória de cálculo de quantitativos a serem aditivados/suprimidos	X		Sem alteração
5.10	Cotações de insumos/serviços complementares		X	Não é o caso
5.11	Relatório de Acompanhamento Simplificado do OPUS	X		Sem alteração
5.12	Ficha de Informações Gerais de Obra (FIGO)	X		Sem alteração
5.13	Outros julgados necessários	X		Não é o caso

6. DADOS RELEVANTES DO ADITIVO

Prazo atual de vigência			Aditamento proposto	Prazo final de vigência proposto		
04/04/2023	a	20/09/2025	**0**	04/04/2023	a	**20/09/2025**
Prazo atual de execução			Aditamento proposto	Prazo final de execução proposto		
08/05/2023	a	27/04/2025	**120**	08/05/2023	a	**25/08/2025**

Valor atual do Contrato (R$)	Acréscimo Proposto (R$)	% Acréscimo Proposto	Supressão Proposta (R$)	% Supressão Proposta	Valor Final Proposto (R$)	% Total de acréscimo	% Total de supressão
R$ 6.630.295,32	R$ 391.984,05	5,91%	R$ -	0,00%	R$ 391.984,05	5,91%	0,00%

CRO/12
2911
Pl. 5

7. DADOS RELATIVOS AO CRONOGRAMA


7.1 CRONOGRAMA VIGENTE

Cronograma Previsto x Realizado

Ano	Mês	Previsão	Pru Acu	Executado	Exec Acu
2023	1	53.392,50	53.392,50	58.188,85	58.188,85
2023	2	104.801,22	158.193,72	0,00	58.188,85
2023	3	147.730,88	305.924,60	0,00	58.188,85
2023	4	231.999,36	537.923,96	0,00	58.188,85
2023	5	271.501,03	809.424,99	0,00	58.188,85
2023	6	303.093,61	1.112.518,60	0,00	58.188,85
2023	7	331.983,82	1.444.502,42	0,00	58.188,85
2023	8	352.292,19	1.796.794,61	0,00	58.188,85
2024	9	373.949,11	2.170.743,72	0,00	58.188,85
2024	10	396.278,44	2.567.022,16	0,00	58.188,85
2024	11	406.572,20	2.973.594,36	0,00	58.188,85
2024	12	412.135,64	3.385.730,00	0,00	58.188,85
2024	13	400.105,90	3.785.835,90	0,00	58.188,85
2024	14	394.517,89	4.180.353,79	0,00	58.188,85
2024	15	386.799,83	4.567.153,62	0,00	58.188,85
2024	16	371.353,65	4.938.507,27	0,00	58.188,85
2024	17	340.202,32	5.278.709,59	0,00	58.188,85
2024	18	312.043,35	5.590.752,94	0,00	58.188,85
2024	19	279.224,95	5.869.977,89	0,00	58.188,85
2024	20	243.188,55	6.113.166,44	0,00	58.188,85
2025	21	221.825,20	6.334.991,64	0,00	58.188,85
2025	22	166.751,19	6.501.742,83	0,00	58.188,85
2025	23	87.810,53	6.589.553,36	0,00	58.188,85
2025	24	40.741,97	6.630.295,32	0,00	58.188,85

Página

7.2 CURVA S

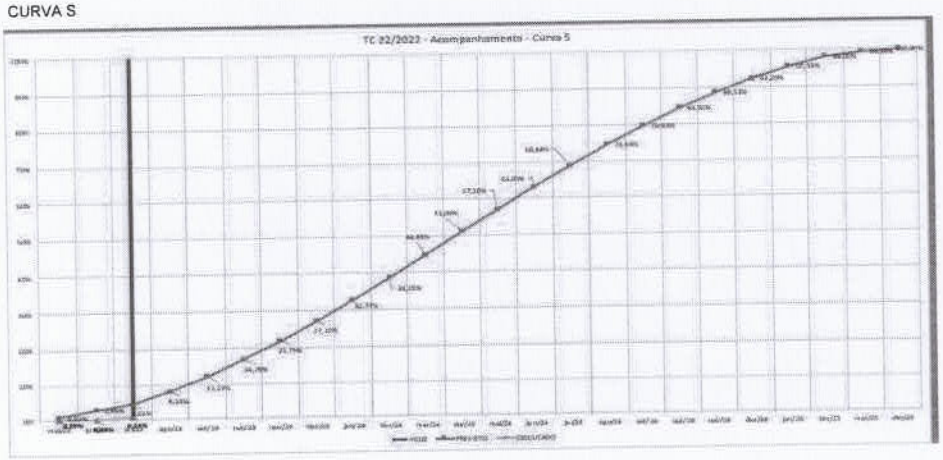

8. ENCAMINHAMENTO DO ADITIVO

Aprovação interna (CRO/12)	
2º Gpt E	
Diretoria de Obras Militares	
Obs: Após aprovação do aditamento, o mesmo deverá ser registrado no OPUS para validação da Diretoria de Obras Militares. Aditamentos de Prazo que não importem em ônus financeiro são dispensados de aprovação pela DOM	

9. CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DO ADITIVO

AÇÃO	DATAS					
	1	2	3	4	5	6
Tramitação interna: dias ([6]-[1])						

[1] Protocolo do pedido de aditivo;
[2] Despacho Ch CRO 12;
[3] Entrega na Sec Tec (Seap)
[4] Saída da Sec Tec ao Ch CRO 12;
[5] Assinatura do OD;
[6] Upload no OPUS/ Encaminhamento ao 2ºGpt E

10. FATOS RELEVANTES OU CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DO FISCAL DE CONTRATO

Serviços referente a elaboração de projeto executivo de terraplanagem, limpeza da camada vegetal, escavação, transporte e carga de material para execução de aterro para elevação da cota do terreno na área da construção da 2cia e vias conforme projeto inicial.

CRO/12
2912
PLS

11. CONFERÊNCIA

ASSINATURA: DANIEL FERNANDES FERREIRA:04487905303

Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras

DATA: ____/____/____

12. OBSERVAÇÕES GERAIS E DESPACHO

CH SSEÇ FISC OBRAS:

CH SEC TEC:

OD DA CRO/12:

CRO/12
2913
PLS

mlobato
ENGENHARIA

Ofício n.º 55/2023

Manaus/AM, 18 de julho de 2023.

Ao,
EXÉRCITO BRASILEIRO,
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR,

Ilmo. Sr.
Fábio Barros de Sousa – Tenente Coronel - Ordenador de Despesas
Avenida Coronel Teixeira, nº 2061, Bairro Ponta Negra
CEP 69037-000, Manaus

REF.; TERMO DE CONTRATO Nº. 02/2023
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE SERVIÇOS

Prezado Senhor,

Utilizo-me da qualidade de representante legal da empresa contratada, **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 24.342.072/0001-85**, para respeitosamente solicitar desta douta Administração, nos termos do referido contrato, a solicitação de cálculo de aditivo de serviços, uma vez que para a perfeita execução destes, serão necessárias as adições conforme planilha e memória de cálculo anexa.

Informamos ainda, que não iniciamos os serviços devido o terreno existente apresentar desnivelamento necessitando de um serviço não contemplado na planilha contratual. Diante deste fato houve a necessidade de ser realizado no local do terreno um levantamento topográfico do platô existente, para que a MLOBATO elaborasse um projeto executivo de terraplanagem com as devidas adequações técnicas necessárias ao nivelamento do platô, na qual gerou serviços de movimentação de terra com aterro compactado no terreno do contratante, conforme detalhado na planilha de serviços de solicitação de aditivo.

MLobato Engenharia Ltda
- Comercial: (92) 4104-7316
- E-mail: mlobatoengenhariamao@gmail.com
- Endereço: Av. Jacira Reis - 391 - Sala 8A - Garden Center São Jorge, Manaus/AM, 69.033-008

www.mlobatoengenharia.com.br

CRO/12
2914
PLS

mlobato
ENGENHARIA

A prorrogação dos prazos contratuais é excepcional e assim é a estipulação contida na Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos: Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

> §1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> I – alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
> II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Portanto, com fulcro no Art. 57, da Lei nº. 8666/93, a contagem do prazo de 7(sete) dias para o início dos serviços conforme estabelecido no subitem 8.2.1 do projeto básico deve ser cancelada, e em virtude dos fatos expostos a contagem deve iniciar somente após a celebração do termo aditivo, propiciando assim respaldo jurídico para ambas as partes ao decorrer da execução deste termo de contrato, já que o objetivo principal do contrato é, em suma, evitar que haja incertezas na solução de eventual conflito, ou até mesmo impedir esses conflitos.

Certos do atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno.

Mlobato Engenharia Ltda
CNPJ Nº 24.342.072/0001-85
CONTRATADA

MLobato Engenharia Ltda

- Comercial: (92) 4104-7316
- E-mail: mlobatoengenhariamao@gmail.com
- Endereço: Av. Jacira Reis - 391 - Sala 8A - Garden Center São Jorge. Manaus/AM. 69.033-008

www.mlobatoengenharia.com.br

CRO/12
2915
PLS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITOBRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO 02/2023

1. CONTRATO

1.1 Objeto

Construção do Pavilhão 2º Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS

1.2.1 Condições iniciais contratadas

- **Licitação:** Tomada de Preço CP 09/2022
- **Regime de execução:** Empreitada por preço unitário
- **Data de referência de preços:** set/22
- **Empresa contratada:** M LOBATO ENGENHARIA
- **Valor inicial contratual:** R$ 6.630.295,32
- **Prazo de execução da obra:** 720 dias
- **Prazo de vigência da obra:** 900 dias
- **Data da Ordem de Serviço:** 08/05/2023
- **Período de execução da obra:** 08/05/2023 a 27/04/2025
- **Data da assinatura do contrato:** 04/04/2023
- **Período de vigência contratual:** 04/04/2023 a 20/09/2025

1.2.2 Termos Aditivos celebrados

- Não houve

1.2.3 Termos de Apostilamento celebrados

- Não houve

1.2.4 Situação atual do contrato

- **Prazo de execução:** 720 dias
- **Termino da execução:** 27/04/2025
- **Prazo de vigência:** 900 dias
- **Termino da vigência:** 20/09/2025
- **Valor contratual atualizado (incluindo apostilamento):** R$ 6.630.295,32
- **Valor total empenhado:** R$ 500.000,00

2. EXPOSIÇÃO DOS FATOS / JUSTIFICATIVA TÉCNICA

2.1 Justificativa técnica para o acréscimo de serviços

A obra em questão, trata-se da construção Pavilhão da 2ª Cia de Fuzileiros, a ser implantada no 7º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado na cidade de Boa Vista/RR, a qual irá proporcionar o aumento qualitativo e operativo do C Fron RR/ 7º BIS no cumprimento de suas atribuições, incluindo a sua atuação nesta faixa de fronteira no mais alto grau de profissionalismo e operacionalidade, em razão das diversas missões, das variadas características do terreno (lavrado, selva, ambiente urbano, ambiente rural, grandes cursos de rios e afluentes).

De forma a atender a solicitação da OM, a fiscalização e equipe técnica verificou que será necessário o acréscimo dos serviços de levantamento topografico planialtimétrico, projeto executivo de terraplanagem, limpeza do terreno e movimentação de terra, considerando a declividade e nivéis diferentes identificados na área da construção.
Tais serviços, serão para elevar o nivel do terreno para uma cota de segurança acima do nível da rua, evitando dessa forma situações futuras de alagamento nas instalações da 2ªcia.

Cabe ressaltar que estes serviços não foram previstos anteriormente, porém, conforme calculado na Planilha de Cálculo do Valor de Aditivo, esse percentual é de 5,91%, enquandrando-se nos limites adimitidos por Lei.

CRO/12
2916
PLS

2.2 justificativa técnica para a prorrogação do prazo de execução e de vigência

Para se aguardar a aprovação técnica/jurídica do aditivo, bem como a execução de levantamento e elaboração de projetos executivo de terraplanagem, faz-se necessário um acréscimo de prazo de execução de 120 dias. Além disso, para o recebimento do crédito, e pagamento do mesmo, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 – Dilação de Prazos.

Prazo		Observações
Execução	120 dias	Prazo para análise, aprovação e recebimento do crédito.

2.3 Do acréscimo e supressão de serviços

Os itens acréscidos e suprimidos, bem como suas justificativas se encontram pormenorizados na planilha de cálculo de valor de aditivo e na memória de cálculo, anexos a essa justificativa

2.4 Cálculo do Aditivo

Para o cálculo do valor a ser aditado, há a necessidade de seguir a seguinte metodologia:

- Elaborar a planilha do Aditivo a ser celebrado, a preços da Administração e a preços da Contratada, conforme preconizado no Art 3º do Decreto nº 7.903, de 4 ABR 13, da Presidência da República;

- Calcular o desconto global ofertado pela Contratada, em relação ao valor global orçado pela Administração; e
- Aplicar o desconto citado anteriormente para a manutenção da proporcionalidade da diferença entre o valor global orçado pela Administração e o valor global contratado, em conformidade com o Art 14º do Decreto nº 7.903, de 4 ABR 13, da Presidência da República.

Para os itens a serem inseridos na planilha, ou seja, os que não constam na planilha contratada, foi realizada a pesquisa de preços nos bancos do SINAPI, com preços do mês de referência.

É o que será mostrado na sequência:

a) Desconto global ofertado pela Contratada, em relação ao valor global orçado pela Administração:

Valor Global Estimado pela Administração = R$ 7367822,89
Valor Global Contratado : VGC = R$ 6630295,32
Desconto : D = 0,1001

b) Planilha do Aditivo a ser celebrado a preços da Administração e a preços da Contratada:

Os quantitativos totais dos preços de cada item a ser acrescido ou suprimido estão em planilha **anexa** a este documento, cujos valores totais são os seguintes:

Valor Total do **Acréscimo** a Preços da **Administração**	R$	435.586,78
Valor Total da **Supressão** a Preços da **Administração**	R$	-
Valor **Global** do Aditivo a Preços da **Administração**	R$	435.586,78

Valor Total do Acréscimo a Preços da Contratada	R$	430.840,24
Valor Total da Supressão a Preços da Contratada	R$	-
Valor Global do Aditivo a Preços da Contratada	R$	430.840,24

CRO/12
2917
PLS

c) Cálculo do Valor Final do Aditivo.

O Valor Máximo a ser aditado (VMA) é mostrado nas tabelas abaixo:

Valor Global do Aditivo a Preços da Administração	R$	435.586,78
Desconto Global ofertado pela Contratada (21,10%)	-R$	43.602,73
Valor Máximo a ser Aditado (VMA) para a manutenção da proporcionalidade da diferença entre o VGA e o VGC	R$	391.984,05

Valor Global do Aditivo a Preços da Contratada	R$	430.840,24
Desconto Complementar (DC) para a manutenção da proporcionalidade da diferença entre o VGA e o VGC	-R$	38.856,19
Valor Máximo a ser Aditado (VMA) para a manutenção da proporcionalidade da diferença entre o VGA e o VGC	R$	391.984,05

Assim, os valores finais do Aditivo são mostrados abaixo:

Valor Total do Acréscimo a Preços da Contratada	R$	430.840,24
Desconto Complementar (DC) do Acréscimo para a manutenção da proporcionalidade da diferença entre o VGA e o VGC	-R$	38.856,19
Valor Final do Acréscimo de Serviços	R$	391.984,05
Valor Total da Supressão a Preços da Contratada	-R$	38.856,19
Desconto Complementar (DC) da Supressão para a manutenção da proporcionalidade da diferença entre o VGA e o VGC	R$	-
Valor Final da Supressão de Serviços	R$	-
Valor Global Final do Aditivo (Acréscimo – Supressão)	**R$**	**391.984,05**

2.5 Resumos dos termos aditivos e reflexo financeiro do aditivo proposto

O quadro a seguir resume os Termos Aditivos celebrados e o reflexo financeiro do Aditivo Proposto:

QUADRO RESUMO DOS TERMOS ADITIVOS			
Descrição	**Acréscimos**	**Supressões**	**Total Consolidado**
1º Termo Aditivo	*R$ 391.984,05*	*R$ -*	*R$ 391.984,05*
	5,91%	*0,00%*	*5,91%*
TOTAL	***5,91%***	***0,00%***	***5,91%***

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O fundamento legal para o pleito do aditivo de serviços está disciplina no inc. I e §§ 1º e 2º do Art. 65 da Lei 8666/93, de 21 Jun 93, senão vejamos:

> **Art. 65** Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
> I - unilateralmente pela Administração:
>
> a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
> b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
>
> [...]
>
> § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (grifo nosso)
>
> § 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (grifo nosso)

CRO/T
2918
PLS

Acerca do cálculo do valor do aditivo foi observado os artigos 14 e 15 do Decreto nº 7983/2013 de 8 de abril de 2013, que tratam da formação dos preços das propostas e celebração de aditivos em obras e serviços de engenharia, in verbis:

> Art. 14 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
> [...]
>
> Art. 15 A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

Ou seja, o valor do aditivo supracitado mantém a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração e o valor global contratado, conforme consta na planilha orçamentária em anexo.

Dessa forma, a alteração supracitada não se destina a suprimir a vantagem econômica inicialmente obtida pela Administração, afastando quaisquer indícios de jogo de planilha.

Adicionalmente, em conformidade ao Inciso XIII, do Art. 55, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a empresa Contratada continua mantendo satisfatoriamente às condições de habilitação exigidas na Licitação.

Frisa-se que os acréscimos e supressões propostos, analisados individualmente, atendem os limites previstos no Art. 65, § 1°, da Lei 8666/93.

Outrossim, certifico, o adimplemento até o presente momento, das obrigações estipuladas por parte da Contratada.

O fundamento legal para o pleito do aditivo de prazo está disciplina noArt. 57, § 1º da Lei nº8.666, de 21 Jun 93.

4. CONCLUSÃO

Face ao conglomerado exposto, esta fiscalização é favorável, salvo melhor juízo, que seja aprovado um Termo Aditivo de acréscimo de serviços, consolidando um valor global final de R$ 391.984,05 (trezentos e noventa e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), representando 5,91%, enquandrando-se nos limites adimitidos por Lei.

Em decorrência do Aditivo de acréscimo de serviços, será necessário a celebração de Termo Aditivo visando à prorrogação da execução da obra de 120 dias. Visto o prazo decorrido para levatamento inicial, elabora de proposta do termo aditivo de serviço, análises do TA01, aprovação do TA01 e recebimento de créditos.

Cabe registrar que esse acréscimo de serviços não constituirá prejuízos para a Administração e tampouco para a Contratada, mantendo-se, assim, a equação econômico-financeira do Contrato.

5. ANEXOS

a) Planilha de cálculo do valor do aditivo;
b) Curva ABC; e
c) Memória de Cálculo do aditivo proposto.

Manaus - AM, 28 de agosto de 2023.

MATHEUS DANTAS BRAULIO:14780319722

Assinado de forma digital por MATHEUS DANTAS BRAULIO:14780319722
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CERTDATA, ou=Presencial, oid=2.16.86.1.2.1000127, cn=MATHEUS DANTAS BRAULIO:14780319722
Dados: 2023.08.29 18:42:13 -04'00'

MATHEUS DANTAS **BRAULIO** – 1° TEN
Fiscal substituto do Contrato

CRO/12
2919
PLS

CONCORDO

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS:02508903990
Assinado de forma digital por KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS:02508903990
Dados: 2023.08.30 10:52:32 -04'00'

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS – MAJ QEM FC
Chefe da Seção Técnica

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

a) Concordo com à presente justificativo.
b) A Seção Técnica encaminhe a DOM para análise.

FÁBIO BARROS DE SOUSA
Assinado de forma digital por FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
Dados: 2023.08.30 11:22:07 -04'00'

FABIO BARROS DE SOUSA – TC QEM FC
Ordenador de Despesas

CRO/12
2920
PLS

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DO ADITIVO - TC 02/2023 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª Cia DE FUZILEIROS DO 7º BIS - BOA VISTA/RR

ITEM (A)	REFERÊNCIA (B) (FONTE) - ORIGEM - CÓDIGO - DATABASE (DD/MM/AAAA)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (C)	UNID (D)	QUANT. ORIGINAL CONTRATADA (E)	QUANT. ADITIVO (F)	QUANT. TOTAL (G)	VALOR UNITÁRIO		ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS COM PREÇOS EQUILIBRADOS (ADICIONAIS)		REDUÇÕES CONTRATUAIS COM PREÇOS EQUILIBRADOS (SUPRIMIDOS)		OBSERVAÇÕES (N)
							PRESENTE (H)	CONTRATUAL (I)	ACRÉSCIMO (J)	ACUMULADO (K)	REDUÇÃO (L)	ACUMULADO (M)	
1		SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS											
1.4 (SEDUC)	CA 09/2022 SEC	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO 1 A 7 HECTARES	HC	0,00	0,00	10320,00	10320,00	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 2.963,20	R$ -	R$ 2.963,20	R$ -
1.5 (SEDUC)	CA 09/2022 SEC	PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS	HC	0,00	0,00	10320,00	10320,00	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 2.963,20	R$ -	R$ 2.963,20	R$ -
2		CANTEIRO AUXILIARES E ADMINISTRATIVO											
2.1		CANTEIRO:											
2.1.1	TABELA ADAM SEC 11738 PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	100,00	100,00	108,00	8,00	R$ 5.991,24	R$ 5.991,24	R$ 47.929,92	R$ -	R$ 47.929,92	R$ -
3		DEMOLIÇÃO COMPLEMENTARES											
3.1		ENSAIOS E TESTES											
3.1.2 (ACRÉSCIMO)	TABELA/2021 SINAPI	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MISTOS	UNID	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 45,91	R$ 45,91	R$ 916,40	R$ -	R$ 911,20	R$ -
3.1.3 (ACRÉSCIMO)	TABELA/2021 SINAPI	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRA NÃO TRABALHADA - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UNID	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 145,45	R$ 144,27	R$ 2.908,40	R$ -	R$ 2.885,80	R$ -
3.1.4 (ACRÉSCIMO)	TABELA/2021 SINAPI	ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - DE SOLO - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UNID	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 53,58	R$ 53,14	R$ 1.071,60	R$ -	R$ 1.063,20	R$ -
3.1.5 (ACRÉSCIMO)	TABELA/2021 SINAPI	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UNID	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 76,53	R$ 75,95	R$ 1.531,00	R$ -	R$ 1.519,00	R$ -
3.1.6 (ACRÉSCIMO)	TABELA/2021 SINAPI	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UNID	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 48,88	R$ 48,34	R$ 1.377,60	R$ -	R$ 1.344,80	R$ -
3.1.7 (ACRÉSCIMO)	TABELA/2021 SINAPI	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UNID	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 122,47	R$ 121,61	R$ 2.449,40	R$ -	R$ 2.430,20	R$ -
3.2		LIMPEZA DE OBRAS											
3.2.3 (SEDUC)	LEI 1114 09/2022 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (INCLUINDO LAMINA). AF_07/2020	M3	0,00	0,00	224,75	224,75	R$ 4,12	R$ 4,12	R$ 926,21	R$ -	R$ 926,21	
3.2.4 (SEDUC)	LEI 1114 09/2022 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	0,00	274,78	274,78	R$ 8,43	R$ 7,44	R$ 2.484,79	R$ -	R$ 2.199,02	R$ -
3.2.4 (SEDUC)	LEI 1114 09/2022 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM PAVIMENTO PRIMEIRA CATEGORIA (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	0,00	5748,11	5748,11	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 13.232,49	R$ -	R$ 13.232,49	R$ -
3.2.5 (SEDUC)	020040 09/2022 SEC	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO - INCLUSIVE FERRAMENTAS TERRAPLENAGEM	UNID	0,00	0,00	4,00	4,00	R$ 9.850,00	R$ 9.850,00	R$ 39.400,00	R$ -	R$ 39.400,00	R$ -
3.2.6 (SEDUC)	SINAPI 93582	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	0,00	0,00	12270,00	12270,00	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 5.889,60	R$ -	R$ 5.889,60	R$ -
4		MOVIMENTO DE TERRA											
4.2 (SEDUC)	100810 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	0,00	0,00	15320,00	15320,00	R$ 2,28	R$ 2,07	R$ 34.929,60	R$ -	R$ 31.712,40	R$ -
4.4 (SEDUC)	101294 09/2022 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM LOCAL DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCARIFICAÇÃO HIDRÁULICA (ESCARMA: 0,9 M³. 111HP). FEITA EM 3 CAMADAS SUCESSIVAS DE 1º M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15KM/H. AF_09/2020	M3	0,00	0,00	4743,31	4743,31	R$ 19,84	R$ 19,84	R$ 131.744,23	R$ -	R$ 131.744,24	R$ -
4.7 (SEDUC)	94995 09/2022 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	0,00	5413,91	5413,91	R$ 10,77	R$ 10,77	R$ 58.307,81	R$ -	R$ 58.307,81	R$ -

CRO/12
2921
PLS

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DO ADITIVO - TC 02/2023 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª Cia DE FUZILEIROS DO 7º BIS - BOA VISTA/RR

ITEM (A)	REFERÊNCIA (B)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (C)	UNID (D)	QUANT CONTRATADA	QUANT ACUM CONTRATUAL	PREÇO REF.	QUANT TA (E)	CUSTO DETALHADO		ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS COM PREÇOS UNITÁRIOS INCONTROVERSOS		ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS COM CUSTOS DIRETOS CONTROVERSOS		OBSERVAÇÕES (G)
								PARCIAIS (F)	CONTRATUAIS (G)	ACRÉSCIMOS (H)	SUPRESSÕES (I)	ACRÉSCIMOS (J)	SUPRESSÕES (K)	
										R$ 359.691,81	R$ -	R$ 359.772,29	R$ -	
										R$	359.691,81	R$	359.772,29	
										R$ 75.894,97	R$ -	R$ 72.067,95	R$ -	
										R$ 430.586,78	R$ -	R$ 430.840,24	R$ -	
										R$	430.586,78	R$	430.840,24	* desconto complementar *
									Cálculo dos descontos parciais	-R$ 12.402,78	R$ -	-R$ 72.816,19	R$ -	-R$ 72.816,19
									Cálculo do desconto total	-R$	12.402,78	R$	72.816,19	R$ 391.994,05
									Valores máximos PARCIAIS dos aditivos	R$ 391.994,05	R$ -	R$ 0,10	R$ -	
									Valor MÁXIMO do aditivo	R$	391.994,05	▲ desconto final calculado ▲		
									Valor inicial do Contrato(VIC)	R$ 6.630.295,30		5,91%	0,00%	5,91%
									Valor orçado pela Administração (VOA)	R$ 7.367.822,98		▲ percentagem	▲ Do	▲ aditivo
									Desconto	10.01%				
									BDI Adm	21.16%				
									BDI Contratual	21.16%				

Manaus, AM, 11 de agosto de 2023

NATHAYS SANTOS PRATLIS - 1º TEN
Fiscal Administrativo do Contrato

MILPARTS ENGENHARIA LTDA



CURVA ABC - TC 02/2023 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª Cia DE FUZILEIROS DO 7º BIS - BOA VISTA/RR

ITEM (A)	REFERÊNCIA (B) SINAPI - 09/2022 - Roraima (DESONERADO)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (C)	UNID (D)	QUANT CONTRATADA	QUANT ADITIVO CONTRATADA	QUANT TOTAL (E)	QUANT EX (F)	CUSTO UNITÁRIO		ADITIVAÇÕES CONTRATUAIS COM CUSTOS PROPOSTOS (CONTRATADA)		% ACUMULADA
								PARTICULAR (F)	CONTRATADA (G)	ACRÉSCIMOS (J)	%	
2.6 (NOVO)	101256 09/2022 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,9 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_01/2020	M3	0.00	0.00	4743.31	4743.31	R$ 19,54	R$ 19,54	R$ 131.764,23	36,63%	36,63%
2.3 (NOVO)	94295 09/2022 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0.00	0.00	5413.91	5413.91	R$ 10,77	R$ 10,77	R$ 58.307,81	16,21%	52,84%
3.1.1 (ACRÉSCIMO)	CBMRR ADAF SEC 11738 PROFISA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	100,00	100,00	108,00	8,00	R$ 5.991,24	R$ 5.949,24	R$ 47.929,92	13,33%	66,17%
3.2.3 (NOVO)	020245 09/2022 SBC	MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA REBOCA TERRAPLENAGEM	UND	0,00	0,00	4,00	4,00	R$ 9.850,00	R$ 9.850,00	R$ 39.400,00	10,95%	77,12%
2.5	100574 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	0,00	0,00	15320,00	15320,00	R$ 2,28	R$ 2,07	R$ 34.929,40	9,71%	86,83%
3.2.4	93369 09/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2020	MXKM	0,00	0,00	5748,11	5748,11	R$ 2,65	R$ 2,65	R$ 15.232,49	4,23%	91,07%
1.5 (NOVO)	285 09/2022 SBC	PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS(TERRAPLENAGEM)	M2	0,00	0,00	15320,00	15320,00	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 8.579,20	2,38%	93,45%
2.1.2 (NOVO)	5904995 SICRO 3 09/2022	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	0,00	0,00	12270,00	12270,00	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 5.889,60	1,64%	95,09%
1.4 (NOVO)	26 09/2022 SBC	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES	M2	0,00	0,00	15320,00	15320,00	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 3.983,20	1,11%	96,20%
3.1.3 (ACRÉSCIMO)	74022/010 SINAPI	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 145,43	R$ 144,29	R$ 2.908,60	0,81%	97,01%
3.2.6	100973 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 4 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	0,00	294,78	294,78	R$ 8,43	R$ 7,66	R$ 2.484,95	0,69%	97,70%
3.1.7 (ACRÉSCIMO)	74022/006 SINAPI	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UND	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 122,47	R$ 121,51	R$ 2.449,40	0,68%	98,38%
3.1.5 (ACRÉSCIMO)	74022/004 SINAPI	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UND	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 76,55	R$ 75,95	R$ 1.531,00	0,43%	98,80%
3.1.6 (ACRÉSCIMO)	74022/005 SINAPI	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UND	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 68,88	R$ 68,54	R$ 1.377,60	0,38%	99,19%
3.1.4 (ACRÉSCIMO)	74022/014 SINAPI	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UND	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 53,58	R$ 53,16	R$ 1.071,60	0,30%	99,49%
3.1.2 (ACRÉSCIMO)	74022/002 SINAPI	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UND	3,00	3,00	23,00	20,00	R$ 45,92	R$ 45,96	R$ 918,40	0,26%	99,76%



CURVA ABC - TC 02/2023 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª Cia DE FUZILEIROS DO 7º BIS - BOA VISTA/RR

ITEM [A]	REFERÊNCIA [B] SINAPI - 09/2022 - Roraima (DESONERADO)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS [C]	UNID [D]	QUANT CONTRATADA	QUANT APURAL CONTRATADA	QUANT MED	QUANT EA [E]	CUSTO UNITÁRIO		ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM CUSTOS PROPOSTOS (CONTRATADA)		% ACUMULADA
								REFERÊNCIA [F]	CONTRATUAL [G]	ACRÉSCIMO [H]	%	
3.2.2 (NOVO)	101114 09/2022 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	0,00	0,00	226,75	226,75	R$ 4,12	R$ 4,12	R$ 934,21	0,26%	100,00%
										R$ 353.691,81	100,00%	

Za de Agosto de 2023
MATHEUS DANTAS BRAULIO - 1º TEM
Fiscal substituto do Contrato

MLOBATO ENGENHARIA LTDA



MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Obra
CC 09/2022 - Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR_

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Roraima
SBC - 09/2022 - Roraima
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 06/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo
SIURB - 01/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo
SUDECAP - 08/2022 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 08/2022 - São Paulo
FDE - 07/2022 - São Paulo
AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 09/2022 - Goiás

B.D.I.
21,1%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,16%
Mensalista: 69,81%

Cronograma Físico e Financeiro Previsto

Item	Descrição	Total Por Etapa	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00% 57.680,21	15,00% 8.652,03	36,00% 20.188,07	50,00% 28.840,11							
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 720.852,00	2,00% 14.409,04	4,17% 30.042,85	5,17% 37.247,17	8,17% 44.451,89	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 16.028,59	20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12								
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00% 0,00										
5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 26.453,40										
6	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	100,00% 22.911,13	15,00% 3.436,67	36,00% 8.018,80	50,00% 11.455,67							
7	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 118.448,25	20,00% 23.689,65	25,00% 29.612,06	36,00% 41.458,85							
8	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 54.936,88		25,00% 13.734,22	30,00% 16.481,06	45,00% 24.721,60						
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇO DE VISITAS E CAIXAS	100,00% 45.816,74										
10	ESCORAMENTO EM VALAS	0,00% 0,00										
11	ASSENTAMENTOS DE TUBOS E PEÇAS	0,00% 0,00										
12	LIGAÇÕES PREDIAIS AGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE	0,00% 0,00										
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 1.260.762,07				10,00% 126.076,21	17,50% 220.633,36	19,50% 245.848,60	21,50% 271.063,85	20,50% 258.456,22	11,00% 138.683,63	
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)	100,00% 122.498,91			10,00% 12.249,89	30,00% 36.749,67	17,00% 20.824,81	20,00% 24.499,78	23,00% 28.174,75	10,00% 9.769,77	13,00% 12.700,64	10,00% 14.054,58
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 57.697,21										
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00% 281.667,87										
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00% 221.896,16									10,00% 12.542,78	25,00% 33.956,95
18	PAREDES / PAINÉIS	100,00% 135.427,79									6,00% 84.438,07	12,50% 175.912,64
19	COBERTURA	100,00% 1.407.301,10						50,00% 2.702,38	50,00% 2.702,38			
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00% 5.404,76										
21	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	100,00% 213.788,75										
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00% 415.344,20								8,00% 54.023,40	14,00% 94.540,95	21,00% 141.811,42
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	100,00% 675.292,49										
24	PINTURAS	100,00% 210.126,57										
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% 8.770,75										
26	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 499.642,50										
27	URBANIZAÇÃO	100,00% 44.096,00										
	[illegible]cenlagem		0,81%	1,58%	2,23%	3,5%	4,09%	4,57%	5,01%	5,31%	5,64%	5,98%
	[illegible]		$3.392,51	104.801,22	147.730,88	231.999,36	271.601,03	303.093,61	331.983,82	362.292,19	373.949,11	396.278,44
	[illegible]entagem Acumulado		0,81%	2,39%	4,61%	8,11%	12,21%	16,78%	21,79%	27,1%	32,74%	39,72%
	[illegible]usto Acumulado		$3.392,50	158.193,72	306.924,60	537.923,97	809.424,99	1.112.518,60	1.444.502,42	1.796.794,61	2.170.743,72	2.667.022,16

MLOBATO ENGENHARIA LTDA

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - São Jorge - Manaus / AM
(92) 4104-7316 / msmengenhariamao@gmail.com

CRO/12
2925
PLS

MILOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.362.072/0001-85

mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/26	abr/25
4,17% 30.042,85	9,18% 37.319,41	4,17% 30.042,85	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,17% 30.042,85	2,16% 15.561,78
										20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	
		10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94		10,00% 2.645,94		10,00% 2.645,94
												10,00% 11.844,83	10,00% 11.844,83
							10,00% 4.581,67	25,00% 11.454,19	20,00% 9.163,35	10,00% 4.581,67	20,00% 9.163,35	15,00% 6.872,51	
15,00% 14.864,58	16,00% 15.833,56	12,00% 11.733,67	10,00% 8.769,72	9,00% 8.792,75									
			10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	
			15,00% 33.284,27	15,00% 33.284,27	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52		
22,00% 29.794,11	25,00% 33.856,95	18,00% 24.377,60											
14,00% 187.022,15	14,00% 187.022,15	11,00% 154.803,12	13,00% 182.949,14	12,50% 175.812,84	11,50% 161.838,63	5,50% 77.401,56							
							15,00% 32.066,31	15,00% 32.066,31	20,00% 42.757,75	20,00% 42.757,75	20,00% 42.757,75	5,00% 10.689,44	5,00% 10.689,44
			10,00% 41.534,42	10,00% 41.534,42	10,00% 41.534,42	15,00% 62.301,63	15,00% 62.301,63	15,00% 62.301,63	10,00% 41.534,42	15,00% 62.301,63			
20,00% 135.058,50	19,00% 128.305,57	18,00% 121.552,65											
					10,00% 21.012,58	18,00% 37.872,60	17,00% 35.721,35	10,00% 21.012,58	15,00% 31.518,84	15,00% 31.518,84	15,00% 31.518,84		
						15,00% 1.015,81	15,00% 1.015,81	10,00% 1.015,81	90,00% 3.723,91				
		11,00% 54.960,68	12,50% 62.455,31	13,00% 64.953,53	12,50% 62.455,31	15,00% 74.946,38	17,50% 87.437,44	12,50% 62.455,31	8,00% 29.978,55				
			15,00% 6.608,40	10,00% 4.405,60	10,00% 4.405,60	18,00% 8.808,40	20,00% 8.811,20	20,00% 8.811,20	10,00% 4.405,60				
6,13%	6,22%	6,03%	5,96%	5,83%	5,6%	8,13%	4,71%	4,21%	3,67%	3,39%	2,61%	1,32%	0,61%
406.572,20	412.135,64	400.105,90	394.517,69	386.799,83	371.363,65	340.202,32	312.043,36	279.224,95	243.188,66	221.825,29	166.751,19	87.810,53	40.741,97
44,86%	51,04%	57,1%	63,06%	68,88%	74,48%	79,61%	84,32%	88,53%	92,2%	95,59%	98,06%	99,39%	100,0%
2.973.594,36	3.385.729,59	3.785.835,49	4.180.353,78	4.567.153,61	4.938.807,26	5.279.709,58	5.590.762,93	5.869.977,88	6.113.166,43	6.334.991,63	6.501.742,82	6.589.553,35	6.630.256,32

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - São Jorge - Manaus / AM
(92) 4104-7316 / msmengenhariamao@gmail.com

CRO/12
2926
PJ.S

Obra
Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR

B.D.I.
21,1%

Cronograma Físico e Financeiro Proposto

Item	Descrição	Total Por Etapa	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00% 97.680,21	100,00%				15,00% 8.952,03	35,00% 20.186,07	50,00% 28.640,11
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 720.482,00					2,00% 14.409,04	4,17% 30.042,65	5,17% 37.247,37
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 16.026,59					20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	
5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 28.459,40							
6	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	100,00% 22.911,13					15,00% 3.436,67	35,00% 8.018,90	50,00% 11.455,57
7	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 118.448,25					20,00% 23.689,65	25,00% 29.612,06	35,00% 41.468,88
8	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 54.936,88						25,00% 13.734,22	30,00% 16.481,06
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇO DE VISITAS E CAIXAS	100,00% 45.916,74							
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00% 1.260.782,07							10,00% 12.249,88
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)	100,00% 122.498,81							
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 97.697,21							
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00% 281.957,87							
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00% 221.895,16							
18	PAREDES / PAINÉIS	100,00% 135.427,79							
19	COBERTURA	100,00% 1.407.301,10							
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00% 6.404,75							
21	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	100,00% 213.788,75							
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00% 415.344,20							
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	100,00% 675.292,49							
24	PINTURAS	100,00% 219.126,87							
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% 6.770,75							
26	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 499.642,50							
27	URBANIZAÇÃO	100,00% 44.056,00							
28	1º ADITIVO DE SERVIÇO	100,00% 391.984,06					100,00% 391.984,06		
Porcentagem			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,32%	1,49%	2,10%
Custo			0,00	0,00	0,00	0,00	445.376,56	104.801,22	147.730,88
Porcentagem Acumulado			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,32%	7,80%	9,90%
"to Acumulado			0,00	0,00	0,00	0,00	445.376,56	550.177,78	697.908,66

MLOBATO ENGENHARIA LTDA

CRO/12
2927
PLS

dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
6,17% 44.451,69	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	4,17% 30.042,85	5,18% 37.319,41	4,17% 30.042,85	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89
									10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94
45,00% 24.721,60												
10,00% 126.078,21	17,50% 220.633,36	19,50% 245.848,60	21,50% 271.063,85	20,50% 258.456,22	10,00% 126.078,20							
30,00% 36.749,67	17,00% 20.824,91	20,00% 24.499,78	23,00% 28.174,75									
				10,00% 9.789,72	13,00% 12.700,64	15,00% 14.654,58	15,00% 14.654,58	16,00% 15.631,55	12,00% 11.723,67	10,00% 9.789,72	9,00% 8.792,75	
										10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79
										15,00% 33.284,27	15,00% 33.284,27	10,00% 22.189,52
					10,00% 13.842,78	25,00% 33.856,95	22,00% 29.794,11	25,00% 33.856,95	18,00% 24.377,00			
					8,00% 84.438,07	12,50% 175.912,64	14,00% 197.022,15	14,00% 197.022,15	11,00% 154.803,12	13,00% 182.949,14	12,50% 175.912,64	11,50% 161.839,63
		50,00% 2.702,38	50,00% 2.702,38									
										10,00% 41.534,42	10,00% 41.534,42	10,00% 41.534,42
				8,00% 54.023,40	14,00% 94.540,95	21,00% 141.811,42	20,00% 135.058,50	19,00% 128.305,57	18,00% 121.552,65			
												10,00% 21.012,56
									11,00% 54.960,68	12,50% 62.455,31	13,00% 64.953,53	12,50% 62.455,31
										15,00% 6.608,40	10,00% 4.405,60	10,00% 4.405,60
3,29% 231.999,36 13,19% 929.908,02	3,85% 271.501,03 17,04% 1.201.409,05	4,30% 303.093,61 21,34% 1.504.502,68	4,71% 331.883,82 26,05% 1.836.486,48	5,00% 352.292,19 31,04% 2.188.778,67	5,30% 373.949,09 36,38% 2.562.727,76	5,62% 396.278,44 41,97% 2.959.006,20	5,77% 406.572,20 47,73% 3.365.578,40	5,85% 412.135,64 53,58% 3.777.714,04	5,67% 400.106,90 59,25% 4.177.819,94	5,60% 394.617,89 64,85% 4.572.337,83	5,49% 386.799,83 70,34% 4.959.137,66	5,27% 371.353,65 75,60% 5.330.491,31

CRO/12
2928
PLS

jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25
4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,17% 30.042,85	2,16% 15.561,76
				20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	
10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94		10,00% 2.645,94		10,00% 2.645,94
						10,00% 11.844,83	10,00% 11.844,83
	10,00% 4.581,67	25,00% 11.454,19	20,00% 9.163,35	10,00% 4.581,67	20,00% 9.163,35	15,00% 6.872,51	
10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	
10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52		
5,50% 77.401,56							
	15,00% 32.068,31	15,00% 32.068,31	20,00% 42.757,75	20,00% 42.757,75	20,00% 42.757,75	5,00% 10.689,44	5,00% 10.689,44
15,00% 62.301,63	15,00% 62.301,63	15,00% 62.301,63	10,00% 41.534,42	15,00% 62.301,63			
18,00% 37.622,80	17,00% 35.721,35	10,00% 21.012,56	15,00% 31.518,84	15,00% 31.518,84	15,00% 31.518,84		
15,00% 1.015,61	15,00% 1.015,61	15,00% 1.015,61	55,00% 3.723,91				
15,00% 74.946,38	17,50% 87.437,44	12,50% 62.455,31	6,00% 29.978,55				
15,00% 6.908,40	20,00% 8.811,20	20,00% 8.811,20	10,00% 4.405,60				
4,83% 340.202,32 80,43% 5.670.693,63	4,43% 312.643,35 84,85% 5.982.736,98	3,96% 279.224,95 88,81% 6.261.961,93	3,45% 243.188,56 92,26% 6.505.150,48	3,15% 221.825,20 95,41% 6.726.975,68	2,37% 166.751,18 97,77% 6.893.726,87	1,25% 87.810,53 99,02% 6.981.537,40	0,58% 40.741,97 99,60% 7.022.279,37

Total Geral 7.050.627,09

CRO/12
2929
PLS

PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR DO ADITIVO - TC 02/2023 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª Cia DE FUZILEIROS DO 7º BIS - BOA VISTA/RR

1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

1.4 (NOVO) LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES

LOCAL	ÁREA			QUANT.	TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	15320,00			1,00	15.320,00	M2
			À EXECUTAR		15.320,00	M2
			PLANILHA		-	M2
			ACRÉSCIMO		15.320,00	M2

1.5 (NOVO) PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS(TERRAPLENAGEM)

LOCAL	ÁREA			QUANT.	TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM	15320,00			1,00	15.320,00	M2
			À EXECUTAR		15.320,00	M2
			PLANILHA		-	M2
			ACRÉSCIMO		15.320,00	M2

2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

2.1 PESSOAL

2.1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ADMINISTRAÇÃO CONFORME PLANILHA				108,00	108,00	LOTES
			À EXECUTAR		108,00	LOTES
			PLANILHA		100,00	LOTES
			ACRÉSCIMO		8,00	LOTES

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 ENSAIOS E TESTES

3.1.2 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ENSAIO DE SOLO NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM				23,00	23,00	UND.
			À EXECUTAR		23,00	UND.
			PLANILHA		3,00	UND.
			ACRÉSCIMO		20,00	UND.

3.1.3 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ENSAIO DE SOLO NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM				23,00	23,00	UND.
			À EXECUTAR		23,00	UND.
			PLANILHA		3,00	UND.
			ACRÉSCIMO		20,00	UND.

CRO/12
2930
PLS

3.1.4 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ENSAIO DE SOLO NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM				23,00	23,00	UND.
			À EXECUTAR		23,00	UND.
			PLANILHA		3,00	UND.
			ACRÉSCIMO		20,00	UND.

3.1.5 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ENSAIO DE SOLO NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM				23,00	23,00	UND.
			À EXECUTAR		23,00	UND.
			PLANILHA		3,00	UND.
			ACRÉSCIMO		20,00	UND.

3.1.6 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ENSAIO DE SOLO NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM				23,00	23,00	UND.
			À EXECUTAR		23,00	UND.
			PLANILHA		3,00	UND.
			ACRÉSCIMO		20,00	UND.

3.1.7 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ENSAIO DE SOLO NA EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM				23,00	23,00	UND.
			À EXECUTAR		23,00	UND.
			PLANILHA		3,00	UND.
			ACRÉSCIMO		20,00	UND.

3.2 LIMPEZA DE OBRAS

3.2.2 (NOVO) ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

LOCAL	VOLUME				TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM(TABELA DE VOLUMES) - SOLO MOLE ORGÂNICO	226,75				226,75	M3
			À EXECUTAR		226,75	M3
			PLANILHA		-	M3
			ACRÉSCIMO		226,75	M3

CRO/12
2936
PLS

3.2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

LOCAL	VOLUME ESCAVADO	FATOR DENSIDADE NATURAL/DENS SOLTA	EMPOLA-MENTO		TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME	226,75	1,30	30,00%		294,78	M3
			À EXECUTAR		**294,78**	**M3**
			PLANILHA		**-**	**M3**
			ACRÉSCIMO		**294,78**	**M3**

3.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAL	VOLUME	FATOR DENSIDADE NATURAL/DENS SOLTA	EMPOLA-MENTO	DMT(KM)	TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM(TABELA DE VOLUMES) - SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA	294,78	1,30	30,00%	15,00	5.748,11	M3xKM
			À EXECUTAR		**5.748,11**	**M3xKM**
			PLANILHA		**-**	**M3xKM**
			ACRÉSCIMO		**5.748,11**	**M3xKM**

3.2.5 MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM

LOCAL				QUANT.	TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM(ESCAVADEIRA HIDRAULICA)				1,00	1,00	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM(MOTONIVELADORA)				1,00	1,00	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM(ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO)				1,00	1,00	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM(RETROESCAVADEIRA)				1,00	1,00	UND.
			À EXECUTAR		**4,00**	**UND.**
			PLANILHA		**-**	**UND.**
			ACRÉSCIMO		**4,00**	**UND.**

CRO/12
2932
PLS

3.2.6 **LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL**

LOCAL	ÁREA			QUANT.	TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM(TABELA DE VOLUMES)	12270,00			1,00	12.270,00	M2
			À EXECUTAR		12.270,00	M2
			PLANILHA		-	M2
			ACRÉSCIMO		12.270,00	M2

8 SERVIÇOS DIVERSOS

8.5 **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019**

LOCAL	ÁREA/VOLUME				TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM(TABELA DE VOLUMES)	15320,00				15.320,00	M2
			À EXECUTAR		15.320,00	M2
			PLANILHA		-	M2
			ACRÉSCIMO		15.320,00	M2

8.6 (NOVO) **ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020**

LOCAL	VOLUME COMPACTADO	m³/km	EMPOLAMENTO		TOTAL	UND.
JAZIDA DO 10°GAC	5413,91	1,50	30,00%		10.557,12	M3
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM(TABELA DE VOLUMES)	226,75	1,50	30,00%		442,16	M3
			À EXECUTAR		10.114,96	M3/km
			PLANILHA		-	M3/km
			ACRÉSCIMO		10.114,96	M3/km


CRO/12
2933
PLS

8.7 (NOVO) **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019**


LOCAL	ÁREA/VOLUME				TOTAL	UND.
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA - CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM(TABELA DE VOLUMES)	5413,91				5.413,91	M3
			À EXECUTAR		5.413,91	M3
			PLANILHA		-	M3
			ACRÉSCIMO		5.413,91	M3



DISTANCIA DO 7°BIS PARA JAZIDA DO 10° GAC = 1,5KM

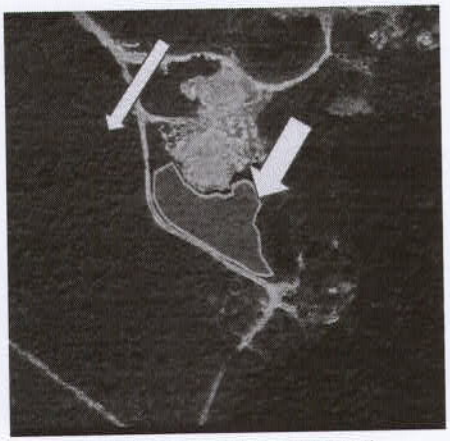

JAZIDA DO 10° GAC (1,5KM DO 7°BIS)

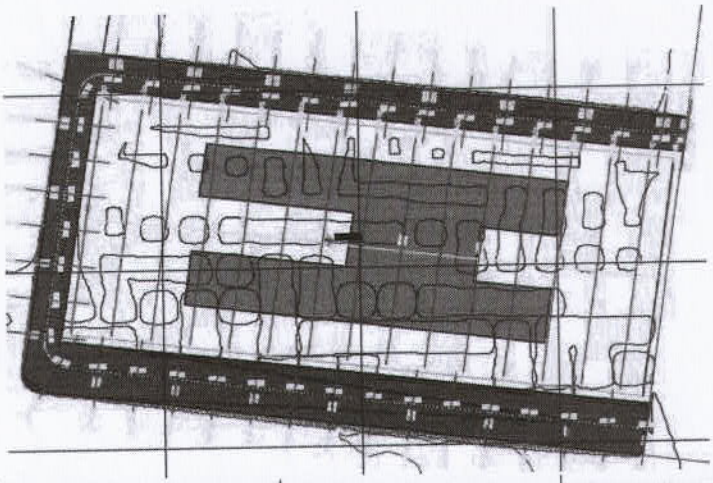

1.0	TERRAPLENAGEM		QUANT.
1.1	Desmatamento, Destocamento e limpeza	m²	15,320.00
1.2	Escavação e carga de material	m³	226.75
1.3	Escavação e carga de material 1ª categ. Jazida	m³	5,187.16
1.4	Compactação de Aterro	m³	5,413.91
1.5	Transporte material 1ª categ. Jazida DMT =	m³	6,743.31
1.6	Regularização de platos e taludes	m²	15,320.00

MLOBATO ENGENHARIA LTDA

CRO/12
2934
PLS

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - TC 02/2023

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª Cia DE FUZILEIROS DO 7º BIS - BOA VISTA/RR

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74022/023	SINAPI	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO EPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	45,56	45,56
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	25,06	30,07
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	25,83	15,49
				MO sem LS =>	20,32	LS =>	22,80	MO com LS => 43,12
				Valor do BDI =>	9,61			Valor com BDI => 55,17

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74022/010	SINAPI	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	144,29	144,29
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8000000	25,06	95,22
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9000000	25,83	49,07
				MO sem LS =>	64,36	LS =>	72,19	MO com LS => 136,55
				Valor do BDI =>	30,44			Valor com BDI => 174,73

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74022/014	SINAPI	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	53,16	53,16
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	25,06	35,08
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	25,83	18,08
				MO sem LS =>	23,71	LS =>	26,59	MO com LS => 50,30
				Valor do BDI =>	11,21			Valor com BDI => 64,37

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74022/005	SINAPI	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	75,95	75,95
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,06	50,12
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,83	25,83
				MO sem LS =>	33,88	LS =>	37,99	MO com LS => 71,87
				Valor do BDI =>	16,02			Valor com BDI => 91,97

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74022/009	SINAPI	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	68,34	68,34
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	25,06	45,10
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	25,83	23,24
				MO sem LS =>	30,49	LS =>	34,19	MO com LS => 64,68
				Valor do BDI =>	14,41			Valor com BDI => 82,75

3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74022/008	SINAPI	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	121,51	121,51
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2000000	25,06	80,19
Composição Auxiliar	88321	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6000000	25,83	41,32
				MO sem LS =>	54,20	LS =>	60,79	MO com LS => 114,99
				Valor do BDI =>	25,63			Valor com BDI => 147,14

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,48	0,48
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiv	Custo Horário
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre estiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	268,1655	87,2610	268,1655
								Custo Horário de Equipamentos =>	268,1655
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Serverde	1,0000000			19,6890		19,6890
								Custo Horário da Mão de Obra =>	19,6890
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	287,8545
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0388
								Custo do FIC =>	0,0170
								Produção de Equipe =>	622,9500
								Custo Unitário de Execução =>	0,4621
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	0,56

CRO/12
2935
PLS

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,6 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	7,46	7,46
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,6 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0151000	62,45	0,94
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,6 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0085000	169,44	1,40
Composição Auxiliar	87826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0267000	158,91	4,24
Composição Auxiliar	87827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0203000	43,44	0,88
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,31
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	9,03

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,65	2,65
Composição Auxiliar	91385	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0090000	271,16	2,44
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0039000	54,44	0,21
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,55			Valor com BDI =>	3,20

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4,12	4,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	17,40	0,53
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHI	0,0195000	65,22	1,27
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0115000	202,11	2,32
				MO sem LS =>	0,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,97
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,98

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000029	SBC	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES	PROJETOS	m²	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	004249	SBC	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO 1 A 5 HECTARES	Material	m²	1,0000000	0,26	0,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,26

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000285	SBC	PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS	PROJETOS	m²	1,0000000	8,00	8,00
Insumo	004858	SBC	PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS PARA EDIFICACAO	Material	m²	1,0000000	8,00	8,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	8,00

CRO/12
2936
PLS

8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	057101	SBC	ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA VALAS COM PA MECANICA	SANEAMENTO		m³	1,0000000	12,88	12,88
Composição Auxiliar	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1940000	25,68	2,97
Insumo	032149	SBC	PA CARREGADEIRA PNEUS CATERPILLAR 1,72m3 105CV	Material		H	0,1030000	99,15	10,21
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	12,88

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020045	SBC	MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM	PREPARACAO DO TERRENO		UN	1,0000000	9.850,00	9.850,00
Insumo	007811	SBC	MOBILIZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM	Material		UN	1,0000000	9.850,00	9.850,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	9.850,00

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101256	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	19,54	19,54
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0127000	219,59	2,78
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0032000	81,26	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0158000	17,40	0,27
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0550000	271,19	14,91
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0244000	54,44	1,32
				MO sem LS =>	1,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,95
				Valor do BDI =>	4,12			Valor com BDI =>	23,66

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m²	1,0000000	2,28	2,28
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0010000	330,00	0,33
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0070000	56,78	0,39
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		CHP	0,0001000	252,55	0,02
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		CHI	0,0080000	81,03	0,64
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		CHP	0,0020000	212,17	0,42
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0080000	17,40	0,13
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMICOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E		CHI	0,0060000	58,79	0,35
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI	0,48			Valor com BDI =>	2,76
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	2,76

MLOBATO ENGENHARIA LTDA

CRO/12
2937
PLS


Relatório de Acompanhamento Simplificado

12ª RM

202212000405 - Construção / 2ª Cia Fzo Sl / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS, Boa Vista/RR

N° Contrato: 02/2023 Última medição: 03 ago 2023



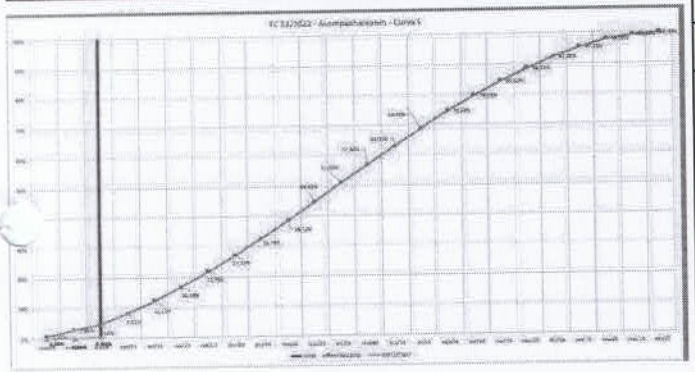

Situação Físico-Financeira	Valor (R$)	%
Contratado	6.630.295,32	100,00
Empenhado	500.000,00	7,54
Liquidado	58.188,85	0,88
Pago	0,00	0,00
Ordem de Serviço	17 abr 2023	
Prazo de Execução	06 abr 2025	
Vigência Contratual	20 set 2025	
Prev. Cronograma (%)	0.0000	Obra no Prazo
Situação Física Real (%)	0.8700	

Observações:

AO 156M Fiscal: 2° Ten Wanessa / 1º Ten Braulio(Substituto) | Empresa: M Lobato Engenharia |1) Situação: Obra em Andamento; 2) Serviços em Execução: Entregue projetos de instalações elétricas, Hidráulico eSanitário; | 3) Impedimentos: TA 01 de serviços de terraplanagem entregue ; | 4) Providências: TA 01 em análise| 5) Outras info: não há

CRO/12
2938
PLS

Ficha de Informações Gerais de Obra

Objeto	Construção do Pavilhão 2° Cia de Fuzileiros no 7° BIS, em Boa Vista/RR						OM	7° BIS
Regime de Execução		Empreitada por preço unitário		Projeto Básico		202212008		
Contrato n°	02/2023	N° OPUS:	202212000405 / 202212008		Valor Contratual (Inicial)	R$		6.630.295,32
Licitação	CP 09/2022	Data Lim Proposta Preço p/ Licitação:	01/07/2022		Valor Contratual (Atual)	R$		6.630.295,32
Empresa	MLOBATO ENEGENHARIA EIRELI 24.342.972/0001-85	ART Obra ou Serviço:			Valor Total (Incluindo Valores Apostilados)	R$		6.630.295,32
Ordem de Sv: Oficio n° 140 Sec Tec/CRO/12	Data da OS:	08/05/2023	Prazo de execução (inicial)	720	Prazo de Execução (Inicial)	27/04/2025	Prazo de Execução (Atual)	27/04/2025
Vigência	Inicio:	04/04/2023	Prazo de Vigência (inicial)	900	Vigência Contratual (Inicial)	20/09/2025	Vigência Contratual (Atual)	20/09/2025

Termos Aditivos	Nº	Dias Execução (TA Prazo)	Dias Vigência (TA Prazo)	Novo Prazo Execução	Nova Vigência Contratual	Acréscimo Sv (TA Valor)	Supressão Sv (TA Valor)	Valor Aditivo
	TOTAL	0	0	TOTAL		R$ -	R$ -	R$ -

Termos de Apostilamentos	Nº		I(n-1)	I(n)	% Reaj	Saldo Reajustado	Valor Reajuste
						TOTAL	R$ 0,00

Empenhos	Valores Iniciais			Reforços / Anulações			Valor Atual	% do valor da Obra
	Número	Valor R$	Data	Número	Valor R$	Data		
	2023NE000034	R$ 500.000,00	04/04/2023				R$ 500.000,00	7,54%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
								0,00%
	Total						R$ 500.000,00	7,54%
Empenhos (Reajustes)					R$ -		R$ -	
	Total						R$ 0,00	0,00%

Notas Fiscais	Medição	Empenho utilizado	Número	Valor R$	Data	Nº Ordem Bancária	Data OB	% do valor da Obra
514	01	2023NE000034	034	58.188,85	11/08/2023			0,88%
								0,00%
								0,00%
			Total(R$)	R$ 58.188,85			Total (%)	0,88%

NOTAS FISCAIS (REAJUSTES)	Medição	Empenho utilizado	Número	Valor R$	Data	Nº Ordem Bancária	Data OB	% do valor do Reajuste
			Total(R$)	R$ -			Total (%)	0,00%

CRO/12 2939 PLS

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**24.342.072/0001-85**	DUNS®:	**945041997**
Razão Social:	**MLOBATO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**M LOBATO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/06/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**13/12/2023**
FGTS	Validade:	**30/09/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**28/02/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/09/2023**
Receita Municipal	Validade:	**29/09/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2024**

Emitido em: 06/09/2023 16:55

CPF: 445.291.042-49 Nome: WIN GREGSON MOREIRA SILVA

Ass: _____

CRO/12
2940
PLS

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 23/08/2023 16:17:27
Usuário: 44529104249

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
24342072	MLOBATO ENGENHARIA LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CRO/12
2941
PLS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.342.072/0001-85
Certidão nº: 46721908/2023
Expedição: 06/09/2023, às 16:57:15
Validade: 04/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.342.072/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CRO/12
2942
PLS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:12:56 do dia 06/09/2023 , com validade até o dia 06/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: YSy6rpqj6yDos1Crpplm

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CRO/12 2943 PLS

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/09/2023 16:56:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CRO/12 2944 PLS

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: *007113333* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 05/09/2023, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MLOBATO ENGENHARIA EIRELI, vinculado ao CNPJ: 24.342.072/0001-85. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 6 de setembro de 2023.

PEDIDO Nº: *0007113333*

CRO/12
2945
FLS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO **Nº 02/2023**, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS** DA 12ª REGIÃO MILITAR E A EMPRESA **MLOBATO ENGENHARIA EIRELI**.

A UNIÃO, por intermédio da COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR, com sede na Avenida Coronel Teixeira, 2061, Bairro Ponta Negra, na cidade de Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 09.583.415/0001-00, neste ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, **Tenente-Coronel FÁBIO BARROS DE SOUSA**, nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº 828.781.613-00, portador da matrícula funcional militar nº 013091084-7, doravante denominada CONTRATANTE, e empresa **MLOBATO ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **24.342.072/0001-85**, sediada na Avenida Dr. Theomario Pinto da Costa, nº 811, sala 410, Skye Platinum Office, Bairro: Chapada, CEP.: 69050-055 em Manaus/AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, portador da Carteira de Identidade nº 2096258-4, expedida pela SSP/AM e CPF nº **001.136.022-43**, tendo em vista o que consta no Processo nº 64333.004129/2022-21 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência Pública nº 09/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, e seguindo a justificativa técnica para aditivo.

CRO/12
2946
FLS

1.1.2. **ACRESCENTAR +5,91%** do valor inicial atualizado do contrato a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R$ 391.984,05** (trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, e §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/1993; e conforme as devidas justificativas, anexa ao processo.

1.1.3. O valor total consolidado do aditivo (VFA) é de **R$ 391.984,05** (trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos);

1.1.4. O percentual acumulado de acréscimo do objeto é de **+5,91%;**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 167017
Fonte: 0188000000
Programa de Trabalho: 171497
Elemento de Despesa: 339039
Plano Interno: D8SAFCTCOSE

2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

3. CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada.

3.1.1 Com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual.

3.1.2 Atualizar, após acréscimos no valor original, o valor da garantia correspondente a 5% do valor atualizado do instrumento original em epigrafe, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: justificativa técnica para aditivo de prazo e serviço ao Termo de contrato 24 de 2022., referente a **Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR.**

CRO/12
2947
FLS

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em **3 (três)** vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Manaus/AM, _____ de _____ de 2023.

pela CONTRATANTE

_____
FÁBIO BARROS DE SOUSA – Tenente Coronel
CPF: 828.781.613-00
Ordenador de Despesas da CRO/12

pela CONTRATADA

_____
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
CPF nº 001.136.022-43
MLOBATO ENGENHARIA EIRELI

ROL DE TESTEMUNHA:

1ª: _____
MARCIO MENEZES AGERTT – 1º Ten Adjunto da SALC

2ª: _____
WIN GREGSON MOREIRA SILVA – ST Aux Sec Cont

CRO/12
2 948
FLS

MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

OFÍCIO Nº74-SALC/CRO/12
EB: 64333.003296/2023-36

Manaus, AM, 11 de setembro de 2023.

À Senhora
FRANCISLÉA N. C. de M. FALCÃO
Consultora Jurídica da União no Estado do Amazonas
Rua Salvador, nº440, Edifício Soberane, 16º Andar, Sala 1600.
69.057-040 Manaus-AM

Assunto: solicitação de parecer jurídico para o primeiro termo aditivo de prazo de execução e acréscimo - minuta de TA 1 ao TC 02/2023, referente a CP 09/2022.

Consultora Jurídica da União no Estado do Amazonas,

Encaminho o Processo Administrativo abaixo descrito para análise jurídica, de acordo com o art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993, conforme o seguinte formulário para tramitação:

Data Limite: 15 dias	**Termo Aditivo, se for o caso:** solicitação de parecer jurídico da minuta de Termo Aditivo 1 ao TC 02/2023, referente a CP 09/2022. **FLS:** 2947 páginas.
e-mail: licitacro12@gmail.com	**Telefone:** (92) 3238-7514/6853
NUP: 64333.004129/2022-21	**Nº de volumes:** 12 PASTAS
Prazo: 15 dias	**Sigla do Órgão:** CRO/12

FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300

Assinado de forma digital por FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=PF A1, cn=FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
Dados: 2023.09.11 13:13:38 -04'00'

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra - Manaus/AM - CEP: 69037-000 FONE: (92) 3238-7514
cro12rm@gmail.com

CRO/12
2949
FLS

Prazo de Execução: 120 dias **Valor de acréscimo: R$ 391.984,05**	**Modalidade:** Concorrência Pública 09/2022.

Data de abertura do processo: 29 de agosto de 2022

MODELOS DA AGU

EDITAL E ANEXO: Foram adotados? (X) SIM ( ) NÃO

Qual o modelo utilizado: não é o caso

Houve alteração: ( ) SIM (X) NÃO

Relação dos itens modificados: não é o caso

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

ASSUNTO/OBJETO: solicitação de parecer jurídico para termo aditivo de acréscimos e supressões de serviços do TC 02/2023, decorrente a CP 09/2022 referente ao serviço de **Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR.**

IDENTIFICAÇÃO DO TEMA: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AQUISIÇÕES – Processos e consultas relativas à aquisição onerosa de bens mediante fornecimento único ou parcelado, ainda que a aquisição seja o meio necessário à execução direta de outra atividade ou empreendimento do órgão licitante.	**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** - Processos e consultas relativas a contratações de obras e serviços de engenharia, comuns ou especiais, que necessitem da participação e do acompanhamento dos profissionais cujo exercício das atividades seja fiscalizado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) ou pelo Conselho de

FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300

Assinado de forma digital por FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
Dados: 2023.09.11 13:14:12 -04'00'

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra - Manaus/AM - CEP: 69037-000 FONE: (92) 3238-7514
cro12rm@gmail.com

CRO/12
2950
FLS

	Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), incluindo os serviços vinculados de fiscalização.
SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - Processos e consultas relativas à contratação de serviços com a disponibilização de trabalhadores da empresa nas instalações da administração pública, mesmo nas hipóteses de haver fornecimento de bens necessários à execução do serviço.	**PATRIMÔNIO** - Processos e consultas que tratem do patrimônio imobiliário da União, incluindo os procedimentos de transferência, onerosa ou não, bem como os atos antecedentes necessários.
SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - Processos e consultas relativas à contratação de serviços sem a disponibilização de trabalhadores da empresa nas instalações da administração pública, mesmo nas hipóteses de haver fornecimento de bens necessários à execução do serviço.	**RESIDUAL** - Processos e consultas cujo tema não se enquadre nos demais.
CONCILIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Processos ou documentos referentes a Conciliações e que versem sobre Representação em Inquéritos Civis do Ministério Público Federal ou do Trabalho.	
Observação:	

Certifico o SOBRESTAMENTO do processo **NUP 64333.004129/2022-21,** objetivando auxiliar a verificação e análise por parte dessa CJU/AM, assumindo o compromisso da não movimentação do mesmo a partir de 08/09/2023.

Atenciosamente,

FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300

Assinado de forma digital por FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
Dados: 2023.09.11 13:14:50 -04'00'

FABIO BARROS DE SOUSA - Tenente Coronel
Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª Região Militar

"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS."

Avenida Coronel Teixeira, Nr 2061, Bairro Ponta Negra - Manaus/AM - CEP: 69037-000 FONE: (92) 3238-7514
cro12rm@gmail.com

Classificação: 004.CRO/12

2957

DIEx Simplificado Nº 117-SALC/CRO/12
EB: 64333.003510/2023-54

Manaus, AM, 21 de setembro de 2023

Do Chefe da Salc
Ao Sr Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras, Chefe da Seção Técnica

Assunto: Parecer Jurídico 1436 ao TC 02/2023 referente a CP 09/2022

Anexos:
1) Parecer 1436 - CP 09_2022.pdf

1. Segue anexo Parecer CJU referente ao Termo Aditivo 1 ao TC 02/2023, decorrente a CP 09/2022.

2. Em consequência, solicito a Seção Técnica que tome as medidas necessárias, no que tange sua competência, para sanar ou justificar as oportunidades de melhoria apontadas.

João Paulo Faria de Carvalho - Cap
Chefe da Salc

200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS.

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap João Paulo Faria de Carvalho**, em 21/09/2023, às 14:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

ZZKU-86Gb-F/Fr-aMwP

CRO/12
2952
FLS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO ESPECIALIZADA VIRTUAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
NÚCLEO JURÍDICO

PARECER n. 01436/2023/NJUR/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU

NUP: 64333.004129/2022-21
INTERESSADOS: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR - CRO/12ª RM
ASSUNTOS: TERMO ADITIVO E OUTROS

- DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. TERMO ADITIVO DEPRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, BEM COMO ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DA 2ª COMPANHIA DE FUZILEIROS DO 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA EM BOA VISTA/RR.
- CONDICIONAMENTO DA PRORROGAÇÃO AO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES FEITAS NO PRESENTE PARECER, ESPECIALMENTE A INDICAÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Trata o presente processo administrativo de consulta, encaminhada pela **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR - CRO/12ª RM** a esta Consultoria Jurídica Especializada Virtual de Obras e Serviços de Engenharia, acerca de minuta de Aditivo ao Contrato nº 02/2023, de obra de engenharia para a construção Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva em Boa Vista/RR, para fins de análise e elaboração de parecer jurídico, nos termos do artigo 11, VI, "a", da Lei Complementar nº 73, de 1993, do artigo 8º - F da Lei nº 9.028, de 1995 e do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

02. O processo, encaminhado em meio eletrônico, por intermédio do Sistema SAPIENS, instruído, por cópias digitalizadas dos autos, dentre os documentos que compõem o processo, no que interesse mais diretamente à presente manifestação (além das peças relativas à contratação e primeiro aditivo), os seguintes:

CRO/12
2953

- Contrato (fls. 2896/2901);
- Publicação de Extrato de Contrato (fl. 2907);
- Solicitação de Aditivo pela Contratada (fls. 2913/2914);
- Justificativa do Fiscal de Contrato (fls. 2915/2918);
- Concordância do OD (fl. 2919);
- Curva ABC (fls. 2922/2923);
- Cronograma Físico-Financeiro previsto (fls. 2924/2925);
- Cronograma Físico-Financeiro proposto (fls. 2926/2928);
- Planilha de Cálculo do Valor do Aditivo (fls. 2929/2936);
- Relatório de Acompanhamento Simplificado (fl. 2937);
- Certidões de Regularidade da Contratada (fls. 2939/2944); e
- Minuta de Aditivo (fls. 2945/2947);

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

PRELIMINARMENTE: FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PRESENTE PARECER

03. Lembramos que a análise dos aspectos técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade do presente processo não se mostra tarefa afeta à Consultoria Jurídica, a qual não possui conhecimento específico nem competência legal para manifestar-se acerca de questões outras que aquelas de cunho estritamente jurídico, conforme sedimentado na Boa Prática Consultiva n° 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU.

04. No mais, tratando-se aqui de ato de aditamento a contrato administrativo, não nos compete neste momento apreciar a regularidade jurídica do procedimento original, que culminou com a contratação, ou dos eventuais aditamentos anteriores, pois presumivelmente já apreciados prévia e conclusivamente pelo órgão de assessoramento jurídico, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 e art. 11, inciso VI, "a" e "b", da Lei Complementar n° 73/93.

05. Passemos, assim, à análise dos aspectos relacionados à legalidade do segundo termo aditivo, objeto deste parecer.

Do Acréscimo e Supressão de Valores

06. Em razão de constatação, pela fiscalização da obra, a pedido da OM e por provocação da Contratada (fls. 2913/2914), foi constatada a necessidade de acréscimo de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico, projeto executivo de terraplanagem, limpeza do terreno e movimentação da terra, considerando a declividade e níveis diferentes identificados, na área de construção, o que implicou em necessários ajustes no custo do serviço contratado, com acréscimo de valores, conforme pormenorizado na Justificativa do Fiscal de Contrato (fls. 2915/2918).

CRO/12
2954

07. O objeto do aditivo, neste aspecto, encontra respaldo jurídico, nas disposições do art. 58, inciso I, bem como de seu § 1°, e art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93. Ainda assim, apesar da viabilidade de concretização por ato unilateral da Administração, optou-se pela via bilateral.

08. Com efeito, conforme justificado no documento acima referido, a cumulação dos acréscimos necessários, resultam num acréscimo final de 5,91%, do valor incialmente contratado, logo, bem abaixo do limite legalmente permitido (25%).

09. De maneira que, não nos imiscuindo no mérito de natureza técnica, a que nos foge a competência, a motivação encontra respaldo legal na Lei nº 8.666/93.

Da Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato

10. A prorrogação aqui examinada é mera consequência das alterações supra referidas, tratadas no tópico anterior, o que implicou na necessidade do estabelecimento de outro cronograma de execução da obra e, respectivo, desembolso financeiro.


11. A prorrogação de prazo de vigência do contrato lastreia-se no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, a saber:

> "Art. 57 (...)
> § 1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
> (...)
> § 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
> § 3° É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado".

12. A possibilidade de prorrogação do prazo de vigência contratual, no caso concreto, passa, necessariamente, pela abordagem sobre a distinção que é feita entre contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua vigência.

13. Para Hely Lopes Meirelles:

A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra nos ajustes por tempo determinado. Necessário, portanto, distinguir os contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua vigência: Nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a obra ou do serviço ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos, o prazo de vigência do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo moratório e prazo extintivo do contrato.



14. Também segundo entendimento esposado por Carlos Ari Sundfeld, os contratos administrativos distinguem-se entre contratos por objeto e contratos por prazo. Exemplo dos primeiros é a empreitada de obra; dos segundos, o contrato de prestação de serviços de vigilância. O prazo nessas duas modalidades contratuais desempenha função muito distinta. No contrato de empreitada, o prazo contratualmente estabelecido não serve à definição do objeto, mas apenas à demarcação do tempo concedido ao contratado para a sua implementação. No contrato de vigilância, o prazo contratual define a extensão do objeto (Ex.: prestação do serviço de vigilância por seis meses).


15. Nessa esteira, o prazo inicialmente ajustado pelas partes tem por escopo, exatamente, limitar o tempo que seria necessário para a execução da obra. Com efeito, a inobservância de tal prazo na execução do contrato serviria apenas para configurar ou não a situação de mora da contratada no que pertine ao cumprimento de suas obrigações, com a consequente aplicação das sanções contratuais, se fosse o caso.

16. Portanto, os prazos previstos nos contratos por escopo são prazos moratórios, o que significa dizer que a expiração destes não extingue o ajuste.

17. Nesse diapasão, o Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geralda União, no esforço de pacificar a matéria no âmbito da Advocacia-Geral da União e da Administração Pública federal, discorreu no Parecer nº 133/2011/DECOR/CGU/AGU:

> 29. O prazo de vigência corresponde ao "prazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes incumbem". Já o prazo de execução é o tempo determinado no contrato para que o contratado execute o seu objeto, após a execução do objeto pelo contratado. A Administração possui ainda um prazo para recebê-lo e efetuar o pagamento. Por esse motivo, distinguem-se o prazo de execução e o prazo de vigência, já que, enquanto a Administração não efetua o pagamento, ainda há obrigações pendentes e o contrato continua vigente.
>
> [...]
>
> 40. É importante destacar que deverá haver previsão contratual dos dois prazos: tanto o de vigência quanto o de execução, pois não se admite contrato com prazo indeterminado e o interesse público exige que haja previsão de fim tanto para a execução do objeto do contrato quanto para que a Administração cumpra a sua prestação na avença.
>
> [...]
>
> 42. Por outro lado, caso o termo final do prazo de vigência esteja para ser atingido e a Administração e o contratado pretendam estendê-lo, é necessário formalizar a prorrogação. Esta, se cabível, deve ter previsão no instrumento contratual e ser motivada, indicando-se os fatos e os dispositivos legais que lhe servem de fundamento, para fins de controle e transparência, e deve ser autorizada, por meio de termo aditivo devidamente aprovado pela assessoria jurídica, pela autoridade competente para celebrar o contrato. Conforme preceitua o § 2º do artigo 57 da Lei nº8.666/93, "toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato".
>
> [...]

18. Assim, passando-se ao exame dos elementos constantes da instrução dos autos, denota-se que há previsão no instrumento contratual acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de vigência da avença (Cláusula Segunda, subitem 2.4).



19. Conforme a Orientação Normativa AGU n° 3/2009, "na análise dos processos relativos à prorrogação de prazo, cumpre aos órgãos jurídicos verificar se não há extrapolação do atual prazo de vigência, bem como eventual ocorrência de solução de continuidade nos aditivos precedentes, hipóteses que configuram a extinção do ajuste, impedindo a sua prorrogação."

20. No caso, considerando que o Contrato n° 02/2022, firmado em 04/04/2023, com prazo inicial de vigência de 720 dias corridos, prevê sua vigência até 2009/2025, a contratação não sofreu solução de continuidade, por não ter alcançado o prazo de vigência pactuado.

21. Da Justificativa de Alteração Contratual do Fiscal, trazida aos autos (fls. 2915/2918), com o devido aprovo do OD (fl. 2919), vislumbra-se a necessidade da prorrogação de vigência e execução do serviço.

22. **O fundamento jurídico para a prorrogação da vigência no âmbito do contrato em tela (por escopo) dessume-se dos argumentos acima colacionados no bojo do Parecer n° 133/2011/DECOR/CGU/AGU e do contido no art. 57, § 1°, inciso I, e §§ 2° e 3° da Lei n° 8.666, de 1993. No entanto, apesar da supra referida concordância do OD, há a necessidade de sua expressa autorização**.

Cronograma físico-financeiro

23. Considerando-se que o cronograma físico-financeiro consiste na divisão da obra ou serviço de engenharia, em fases que deverão ser executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevê as atividades que serão realizadas e os respectivos prazos de execução ao final, das quais a Administração deverá verificar o devido cumprimento, em comparação com as especificações dos projetos e atestar as condições daquilo que foi entregue pela contratada, a fim de determinar as correções devidas, pelo executor da obra, ou comunicar ao setor financeiro competente a possibilidade de deflagração dos procedimentos, pertinentes ao pagamento da etapa cumprida. A alteração do prazo de vigência pode, ou não, determinar a alteração das etapas previstas no cronograma, conforme análise do setor técnico.

24. **A atualização do** Cronograma Físico-Financeiro Vigente encontra-se proposta no documento de fls. 2926/2928.

Regularidade fiscal e trabalhista da contratada

25. No que tange à regularidade fiscal, ela deverá ser mantida durante toda a execução contratual, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666, de 1993. Além disso, com o advento da Lei nº 12.440, de 2011, sobreveio também a necessidade de comprovação de regularidade trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. Cabe ao Administrador, pois, zelar pela efetiva validade dessas certidões na ocasião da prorrogação.

CRO/12
2957
Fls

26. Ademais, em vista da exigência imposta no art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 2002, e do teor da Orientação Normativa Interna n. 01, desta Consultoria Jurídica da União, consultando-se previamente o CADIN, o SICAF e o CEIS e, também, conforme recomendação do TCU constante do acórdão nº 1.793/2011-P, é necessária a consulta ao cadastro nacional de condenações cíveis por atos de improbidade administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (disponível em www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

27. **No caso, os documentos juntados** (fls. 2939/2944), **demonstram a manutenção das condições de habilitação iniciais da Contratada. Deve o Órgão zelar, pela atualização das respectivas certidões, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo.**

Dotação Orçamentária

28. Por fim, considerando que, da alteração contratual resultou em acréscimo final do valor originariamente contratado, em R$ 391.984,05, há necessidade de demonstrar nos autos a existência de suplementação de dotação orçamentária, o que não foi feito. A omissão deve ser suprida, mediante a juntada da respectiva declaração do OD.

Da minuta de Aditivo

29. Finalmente, quanto à minuta de fls. 2945/2947, nenhuma ressalva ou recomendação a fazer.

CONCLUSÃO

31. Isto posto, abstraindo-nos de qualquer imersão ao mérito de valores, cálculos e outras questões de natureza eminentemente técnica, condiciona-se a juridicidade da pretendida prorrogação de vigência, acréscimo e supressão de valores contratado, **ao atendimento das recomendações feitas nos parágrafos 22, 27 e 28 acima**.

32. Por força da recente alteração legislativa no tema, está a autoridade assessorada obrigada a observar a regra de que "A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta", nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Decreto-lei nº 4.657, de 1942 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -, na redação que lhe conferiu a Lei nº 13.655, de 2018.

33. Parecer Jurídico dispensado da aprovação do Coordenador-Geral, conforme art. 21 do Regimento Interno desta Consultoria especializada em Obras e Serviços de Engenharia (Portaria E-CJU/Engenharia/CGU/AGU nº 01, de 2 de julho de 2020).



Fortaleza, 12 de setembro de 2023.

RENÊ GARCEZ MOREIRA
ADVOGADO DA UNIÃO
CJU/CE/CGU/AGU

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 64333004129202221 e da chave de acesso 46a01eb9

Documento assinado eletronicamente por RENÊ GARCEZ MOREIRA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1277959834 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): RENÊ GARCEZ MOREIRA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 12-09-2023 16:47. Número de Série: 513858800984975917601861473 24. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

Classificação:

CRO/12
2959
FLS

MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

DIEx nº 651-Sec Tec/CRO/12
EB: 64333.004904/2023-20

Manaus, AM, 15 de dezembro de 2023

Do Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras
Ao Sr Chefe da Salc
Assunto: Resposta ao PARECER N. 01436/2023 - CJU referente ao 1º Termo Aditivo - TC 02/2023

Referências:
a) Diex Simplificado nº 117-SALC/CRO/12, de 21 SET 23.

1. Adequação ao PARECER N. 01436/2023/NJUR/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU:

ITENS	VÍCIO/IRREGULARIDADE	SUGESTÃO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA	SOLUÇÃO ADOTADA (com a devida justificativa)
22	O fundamento jurídico para a prorrogação da vigência no âmbito do contrato em tela (por escopo) dessume-se dos argumentos acima colacionados no bojo do Parecer nº 133/2011/DECOR/CGU/AGU e do contido no art. 57, § 1º, inciso I, e §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666, de 1993. No entanto, apesar da supra referida concordância do OD, há a necessidade de sua expressa autorização.	Providenciar tal autorização previamente à celebração do Termo Aditivo.	A cargo da SALC providenciar tal autorização previamente à celebração do Termo Aditivo.
27	No caso, os documentos juntados (fls. 2939/2944), demonstram a manutenção das condições de habilitação iniciais da Contratada. Deve o Órgão zelar, pela atualização das respectivas certidões, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo.	Tal atualização é realizada constantemente em todos os pagamentos.	Tal atualização é realizada constantemente em todos os pagamentos.
28	Por fim, considerando que, da alteração contratual resultou em acréscimo final do valor originariamente contratado, em R$ 391.984,05, há necessidade de demonstrar nos autos a existência de suplementação de dotação orçamentária, o que não foi feito. A omissão deve ser suprida, mediante a juntada da respectiva declaração do OD.	Providenciar tal declaração previamente à celebração do Termo Aditivo.	A cargo da SALC providenciar tal declaração previamente à celebração do Termo Aditivo.

2. Isto posto, entendo que os questionamentos da CJU estão esclarecidos podendo o processo dar prosseguimento, conforme conclusão do Parecer Jurídico nº 01436/2023/NJUR/E-CJU/ENGENHARIA/CGU/AGU.

Classificação:

CRO/12
2960
FLS

VINÍCIUS DIAS JORGE - 1º Ten
Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras

200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS.

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VINÍCIUS DIAS JORGE**, em 15/12/2023, às 14:13 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

gSuc-7clj-Xs6i-Jnvl

CRO/12
2961
FLS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 2º GPT E
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

Nota nº 3061, de 18 de dezembro de 2023, da(o) SALC
Para o BOLETIM INTERNO

Publique-se
Em ____/_____/____

FÁBIO BARROS DE SOUSA - Ten Cel
Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - publicação.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017

Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: **2/2023.** Nº Processo: **64333.004129/2022-21.** Concorrência. **Nº 9/2022**. Contratante: **COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12.** Contratado: **24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA.** Objeto: **Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023**, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a **R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR**. Vigência: **18/12/2023 a 20/09/2025**. Valor Total Atualizado do Contrato: **R$ 6.630.295,32.** Data de Assinatura: **18/12/2023.**

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

FÁBIO BARROS DE SOUSA - Ten Cel
Chefe da Comissão Regional de Obras da 12ª RM

Publicado no BOLETIM INTERNO nº _____, de ____/_____/____, item _____

Referência: Nota para Boletim Interno de 18/12/2023

Teior DOU e BI

CRO/12
2.962
PJ

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**24.342.072/0001-85**	DUNS®:	**945041997**
Razão Social:	**MLOBATO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**M LOBATO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/06/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/06/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/01/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**08/06/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/12/2023**
Receita Municipal	Validade:	**30/12/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CRO/12
2-963
PJ

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:59:25 do dia 19/12/2023 , com validade até o dia 18/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: R0Ylm473a2VlnXkY4lK5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CRO/12
2964
FLS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/12/2023 10:00:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CRO/12
2965

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.342.072/0001-85
Certidão nº: 73025456/2023
Expedição: 19/12/2023, às 09:58:25
Validade: 16/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.342.072/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CRO/12
2.966
FLS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2023 - UASG 160017

Nº Processo: 64333.000460/2023-53.
Concorrência Nº 4/2023. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a do remanescente da construção do bloco 01 (um) de PNR para ST/SGT do CMDO da 1ª BDA INF, em Boa Vista - RR. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 18/12/2023 a 07/12/2025. Valor Total: R$ 5.492.525,92. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 11/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 69/2020.
Nº Processo: 64333.004053/2020-72.
Tomada de Preços. Nº 24/2020. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual em por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, referente a obra de engenharia para adequação do pavilhão almoxarifado do parque regional de manutenção/12, em Manaus/Am. Vigência: 18/12/2023 a 28/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 374.957,78. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 64333.004129/2022-21.
Concorrência. Nº 9/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR. Vigência: 18/12/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 6.630.295,32. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 22/2022.
Nº Processo: 64333.004132/2022-45.
Concorrência. Nº 8/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2022, por 106 (cento e seis) dias, periodo de 10/09/2024 a 24/12/2024, prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 30 (trinta) dias, com inicio em 18 de abril de 2024, encerrando-se em 17 de maio de 2024, acrescentar +4,79%, equivalente a R$ 165.827,47 suprimir -0,09%, equivalente a -R$ 3.389,53,o valor total consolidado do aditivo (VFA) é de R$ 162.437,94. Vigência: 18/12/2023 a 24/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.620.863,15. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 21/2022.
Nº Processo: 64333.003061/2022-63.
Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 02.118.049/0001-79 - R G CARDOSO LTDA. Objeto: Com o reajuste de R$ 4.634,72 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) o valor total do contrato estabelecido na cláusula terceira - do valor do contrato, passa de R$ 95.780,63 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), para R$ 100.415,35 (cem mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme diex 941-SEC TEC, de 14 de dezembro de 2023 e memória para decisão nº 349-S4/dom (04dez23), vigência: 02/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.415,35. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

12ª REGIÃO MILITAR

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593006422/2023-43.
Pregão Nº 12/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO.
Contratado: 37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador gera power brasil gf3-300 300kva, quer serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e seus apêndices, estudos técnicos preliminares e seus anexos do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/12/2023 a 18/12/2024. Valor Total: R$ 16.498,92. Data de Assinatura: 15/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593006422/2023-43.
Pregão Nº 13/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO.
Contratado: 37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a eventual aquisição de peças novas/genuínas, destinadas exclusivamente ao reparo/conserto do grupo gerador gera power brasil gf3-300, 300kva para suprir demandas de manutenções corretivas contingentes vinculadas com o pregão 23/2023..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/12/2023 a 18/12/2024. Valor Total: R$ 32.600,00. Data de Assinatura: 15/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

COMANDO MILITAR DO LESTE

1ª REGIÃO MILITAR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NUP: 64279.000644/2022-34
Por determinação do §4º, do art. 22, Portaria nº 1.845, de 29 SET 22, tendo em vista que o Sr. JULIO CESAR FRANCISCO (CPF xxx.5892.xxx-04) encontra-se em lugar incerto e não sabido, dá-se ciência da Sindicância instaurada, pela Portaria nº 57-SIND - Dano Aux PFP2 - Asse Ap As Jurd/1ª RM, por edital, para apurar possíveis indícios de irregularidade administrativa em razão da ocorrência de pagamentos indevidos efetuados em favor da ex-pensionista MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA (Prec-CP nº 98/2743953) após seu falecimento em 12/07/2017. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intima-se o interessado para comparecer à inquirição, na condição de testemunha, no dia 27 de DEZEMBRO de 2023, às 9:00 no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (em frente à estação de trem/metrô de Triagem) - Rua Licinio Cardoso, nº 96 - São Francisco Xavier, Rio de janeiro - RJ, CEP: 20960-015."

1º SGT - ANDERSON GUEDES INEZ
Sindicante

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NUP: 642 79.043907/2021-19
Por determinação do §40, do art. 22, Portaria n° 1.845, de 29 SET, tendo em vista que o Sr. RONALDO AFONSO REIS (RG 07.XXX.477-6 - DETRAN/RJ) encontra-se em lugar incerto e não sabido, dá-se ciência da Sindicância instaurada, pela Portaria n° 249-SIND - Dano - Aux PFP2 - Asse Ap As Jurd/1°RM, de 29 de dezembro de 2022, por edital, para apurar possíveis indícios de irregularidade administrativa em razão da ocorrência de pagamentos indevidos efetuados em favor do ex-pensionista civil, Sr ARISTIDES RODRIGUES REIS (Matrícula 031 75499) após seu falecimento em 06/02/2020. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intima-se a interessada para comparecer à inquirição, na condição de testemunha, no dia 19 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, no Posto de Atendimento da Seção de Veteranos e Pensionistas / Barra (Seção do Encarregado), situada na Avenida Salvador Allende n° 3773, Barra da T/uca, no interior das instalações do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), Rio de Janeiro, CEP 22783-127."

1º Sgt - RONIER PIMENTEL ALMEIDA
Sindicante

BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 UASG 160242

OBJETO: A Direção da Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro torna público que o Ordenador de Despesas, o Coronel de Infantaria KLAUBER ROGERIO CANDIAN, homologa o Pregão 20/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada no segmento de engenharia clínica para a prestação de serviços contínuos de gestão, intervenção e assessoria em tecnologia de saúde, a fim de atender as necessidades do Hospital Militar de Resende. A ata de julgamento encontra-se no sítio: www.comprasnet.gov.br

CEL - KLAUBER ROGERIO CANDIAN
Ordenador de despesas

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A MARQUES COSTA & SILVA NETO - CNPJ: 15.407.625/0001-40.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 23/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado na Copa do 3º pavimento da 1ª Região Militar - Ala Duque de Caxias, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2023 a 30 de Abril de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 13 de Novembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 20.794.945/0001-30.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 30/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e conservação predial, preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos (materiais, equipamentos, EPIs, uniformes, ferramentas e outros) necessários à execução de serviços nos sistemas e instalações prediais (instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate a incêndio, intervenções estruturais, pintura, marcenaria, serralheria, vidraçaria, e geradores), na forma estabelecida em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a ser realizado no banheiro dos Subtenetes/Sargentos da Cia Cmdo - 4º andar, da ala Visconde da Gávea, do Palácio Duque de Caxias, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
VIGÊNCIA: 20 de Dezembro de 2023 a 31 de Maio de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 15 de Dezembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 20.794.945/0001-30.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 31/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e conservação predial, preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos (materiais, equipamentos, EPIs, uniformes, ferramentas e outros) necessários à execução de serviços nos sistemas e instalações prediais (instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate a incêndio, intervenções estruturais, pintura, marcenaria, serralheria, vidraçaria, e geradores), na forma estabelecida em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a ser realizado no banheiro dos Cabos/Soldados da Cia Cmdo - 3º andar, da ala Visconde da Gávea, do Palácio Duque de Caxias, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
VIGÊNCIA: 20 de Dezembro de 2023 a 31 de Maio de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 15 de Dezembro de 2023.

CRO/12 2 967 FLS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2023 - UASG 160017

Nº Processo: 64333.000460/2023-53.
Concorrência Nº 4/2023. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a do remanescente da construção do bloco 01 (um) de PNR para ST/SGT do CMDO da 1ª BDA INF, em Boa Vista - RR. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 18/12/2023 a 07/12/2025. Valor Total: R$ 5.492.525,92. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 11/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 69/2020.
Nº Processo: 64333.004053/2020-72.
Tomada de Preços. Nº 24/2020. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual em por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, referente a obra de engenharia para adequação do pavilhão almoxarifado do parque regional de manutenção/12, em Manaus/Am. Vigência: 18/12/2023 a 28/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 374.957,78. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 64333.004129/2022-21.
Concorrência. Nº 9/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR. Vigência: 18/12/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 6.630.295,32. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 22/2022.
Nº Processo: 64333.004132/2022-45.
Concorrência. Nº 8/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2022, por 106 (cento e seis) dias, período de 10/09/2024 a 24/12/2024, prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 30 (trinta) dias, com início em 18 de abril de 2024, encerrando-se em 17 de maio de 2024, acrescentar +4,79%, equivalente a R$ 165.827,47 suprimir -0,09%, equivalente a -R$ 3.389,53,o valor total consolidado do aditivo (VFA) é de R$ 162.437,94. Vigência: 18/12/2023 a 24/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.620.863,15. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 21/2022.
Nº Processo: 64333.003061/2022-63.
Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 02.118.049/0001-79 - R G CARDOSO LTDA. Objeto: Com o reajuste de R$ 4.634,72 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) o valor total do contrato estabelecido na cláusula terceira - do valor do contrato, passa de R$ 95.780,63 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), para R$ 100.415,35 (cem mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme diex 941-SEC TEC, de 14 de dezembro de 2023 e memória para decisão nº 349-S4/dom (04dez23), vigência: 02/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.415,35. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

12ª REGIÃO MILITAR

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593006422/2023-43.
Pregão Nº 12/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO.
Contratado: 37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador gera power brasil gf3-300 300kva, quer serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e seus apêndices, estudos técnicos preliminares e seus anexos do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/12/2023 a 18/12/2024. Valor Total: R$ 16.498,92. Data de Assinatura: 15/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593006422/2023-43.
Pregão Nº 13/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO.
Contratado: 37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a eventual aquisição de peças novas/genuinas, destinadas exclusivamente ao reparo/conserto do grupo gerador gera power brasil gf3-300, 300kva para suprir demandas de manutenções corretivas contingentes vinculadas com o pregão 23/2023..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/12/2023 a 18/12/2024. Valor Total: R$ 32.600,00. Data de Assinatura: 15/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

COMANDO MILITAR DO LESTE

1ª REGIÃO MILITAR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NUP: 64279.000644/2022-34

Por determinação do §4º, do art. 22, Portaria nº 1.845, de 29 SET 22, tendo em vista que o Sr. JULIO CESAR FRANCISCO (CPF xxx.5892.xxx-04) encontra-se em lugar incerto e não sabido, dá-se ciência da Sindicância instaurada, pela Portaria nº 57-SIND - Dano Aux PFP2 - Asse Ap As Jurd/1ª RM, por edital, para apurar possíveis indícios de irregularidade administrativa em razão da ocorrência de pagamentos indevidos efetuados em favor da ex-pensionista MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA (Prec-CP nº 98/2743953) após seu falecimento em 12/07/2017. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intima-se o interessado para comparecer à inquirição, na condição de testemunha, no dia 27 de DEZEMBRO de 2023, às 9:00 no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (em frente à estação de trem/metrô de Triagem) - Rua Licínio Cardoso, nº 96 - São Francisco Xavier, Rio de janeiro - RJ, CEP: 20960-015."

1º SGT - ANDERSON GUEDES INEZ
Sindicante

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NUP: 642 79.043907/2021-19

Por determinação do §40, do art. 22, Portaria n° 1.845, de 29 SET, tendo em vista que o Sr. RONALDO AFONSO REIS (RG 07.XXX.477-6 - DETRAN/RJ) encontra-se em lugar incerto e não sabido, dá-se ciência da Sindicância instaurada, pela Portaria n° 249-SIND - Dano - Aux PFP2 - Asse Ap As Jurd/1°RM, de 29 de dezembro de 2022, por edital, para apurar possíveis indícios de irregularidade administrativa em razão da ocorrência de pagamentos indevidos efetuados em favor do ex-pensionista civil, Sr ARISTIDES RODRIGUES REIS (Matrícula 031 75499) após seu falecimento em 06/02/2020. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intima-se a interessada para comparecer à inquirição, na condição de testemunha, no dia 19 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, no Posto de Atendimento da Seção de Veteranos e Pensionistas / Barra (Seção do Encarregado), situada na Avenida Salvador Allende n° 3773, Barra da T/uca, no interior das instalações do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), Rio de Janeiro, CEP 22783-127."

1º Sgt - RONIER PIMENTEL ALMEIDA
Sindicante

BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 UASG 160242

OBJETO: A Direção da Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro torna público que o Ordenador de Despesas, o Coronel de Infantaria KLAUBER ROGERIO CANDIAN, homologa o Pregão 20/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada no segmento de engenharia clínica para a prestação de serviços contínuos de gestão, intervenção e assessoria em tecnologia de saúde, a fim de atender as necessidades do Hospital Militar de Resende. A ata de julgamento encontra-se no sítio: www.comprasnet.gov.br

CEL - KLAUBER ROGERIO CANDIAN
Ordenador de despesas

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A MARQUES COSTA & SILVA NETO - CNPJ: 15.407.625/0001-40.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 23/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado na Copa do 3º pavimento da 1ª Região Militar - Ala Duque de Caxias, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2023 a 30 de Abril de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 13 de Novembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 20.794.945/0001-30.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 30/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e conservação predial, preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos (materiais, equipamentos, EPIs, uniformes, ferramentas e outros) necessários à execução de serviços nos sistemas e instalações prediais (instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate a incêndio, intervenções estruturais, pintura, marcenaria, serralheria, vidraçaria, e geradores), na forma estabelecida em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a ser realizado no banheiro dos Subtenetes/Sargentos da Cia Cmdo - 4º andar, da ala Visconde da Gávea, do Palácio Duque de Caxias, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
VIGÊNCIA: 20 de Dezembro de 2023 a 31 de Maio de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 15 de Dezembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 20.794.945/0001-30.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 31/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e conservação predial, preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos (materiais, equipamentos, EPIs, uniformes, ferramentas e outros) necessários à execução de serviços nos sistemas e instalações prediais (instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate a incêndio, intervenções estruturais, pintura, marcenaria, serralheria, vidraçaria, e geradores), na forma estabelecida em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a ser realizado no banheiro dos Cabos/Soldados da Cia Cmdo - 3º andar, da ala Visconde da Gávea, do Palácio Duque de Caxias, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
VIGÊNCIA: 20 de Dezembro de 2023 a 31 de Maio de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 15 de Dezembro de 2023.

CRO/12 968 FLS

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 03/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 69/2020. Nº Processo: 64333.004053/2020-72. Tomada de Preços. Nº 24/2020. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual em por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, referente a obra de engenharia para adequação do pavilhão almoxarifado do parque regional de manutenção/12, em Manaus/Am. Vigência: 18/12/2023 a 28/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 374.957,78. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Apostilamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 21/2022. Nº Processo: 64333.003061/2022-63. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 02.118.049/0001-79 - R G CARDOSO LTDA. Objeto: Com o reajuste de R$ 4.634,72 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) o valor total do contrato estabelecido na cláusula terceira – do valor do contrato, passa de R$ 95.780,63 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), para R$ 100.415,35 (cem mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme diex 941-SEC TEC, de 14 de dezembro de 2023 e memória para decisão nº 349-S4/dom (04dez23), vigência: 02/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.415,35. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 2/2023. Nº Processo: 64333.004129/2022-21. Concorrência. Nº 9/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR. Vigência: 18/12/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 6.630.295,32. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 22/2022. Nº Processo: 64333.004132/2022-45. Concorrência. Nº 8/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2022, por 106 (cento e seis) dias, período de 10/09/2024 a 24/12/2024, prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 30 (trinta) dias, com início em 18 de abril de 2024, encerrando-se em 17 de maio de 2024, acrescentar +4,79%, equivalente a R$ 165.827,47 suprimir -0,09%, equivalente a -R$ 3.389,53,o valor total consolidado do aditivo (VFA) é de R$ 162.437,94. Vigência: 18/12/2023 a 24/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.620.863,15. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

b. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CRO/12
2969

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 03/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 69/2020. Nº Processo: 64333.004053/2020-72. Tomada de Preços. Nº 24/2020. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual em por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, referente a obra de engenharia para adequação do pavilhão almoxarifado do parque regional de manutenção/12, em Manaus/Am. Vigência: 18/12/2023 a 28/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 374.957,78. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Apostilamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 21/2022. Nº Processo: 64333.003061/2022-63. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 02.118.049/0001-79 - R G CARDOSO LTDA. Objeto: Com o reajuste de R$ 4.634,72 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) o valor total do contrato estabelecido na cláusula terceira – do valor do contrato, passa de R$ 95.780,63 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), para R$ 100.415,35 (cem mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme diex 941-SEC TEC, de 14 de dezembro de 2023 e memória para decisão nº 349-S4/dom (04dez23), vigência: 02/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.415,35. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 2/2023. Nº Processo: 64333.004129/2022-21. Concorrência. Nº 9/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR. Vigência: 18/12/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 6.630.295,32. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 22/2022. Nº Processo: 64333.004132/2022-45. Concorrência. Nº 8/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2022, por 106 (cento e seis) dias, período de 10/09/2024 a 24/12/2024, prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 30 (trinta) dias, com início em 18 de abril de 2024, encerrando-se em 17 de maio de 2024, acrescentar +4,79%, equivalente a R$ 165.827,47 suprimir -0,09%, equivalente a -R$ 3.389,53,o valor total consolidado do aditivo (VFA) é de R$ 162.437,94. Vigência: 18/12/2023 a 24/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.620.863,15. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

b. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CRO/12
1970

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**24.342.072/0001-85**	DUNS®:	**945041997**
Razão Social:	**MLOBATO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**M LOBATO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/06/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/06/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/01/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**08/06/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/01/2024**
Receita Municipal	Validade:	**19/01/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CRO/12
297
FLS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.342.072/0001-85
Certidão nº: 578862/2024
Expedição: 03/01/2024, às 10:41:38
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.342.072/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CRO/12
2 972
PJ

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:42:04 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 4fQdgxwqgkBMDlazis2F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CRO/12
2923
FLS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/01/2024 10:42:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLOBATO ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CRO/12
2.974

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO **Nº 02/2023**, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS** DA 12ª REGIÃO MILITAR E A EMPRESA **MLOBATO ENGENHARIA EIRELI**.

A UNIÃO, por intermédio da COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR, com sede na Avenida Coronel Teixeira, 2061, Bairro Ponta Negra, na cidade de Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº 09.583.415/0001-00, neste ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, **Tenente-Coronel FÁBIO BARROS DE SOUSA**, nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº 828.781.613-00, portador da matrícula funcional militar nº 013091084-7, doravante denominada CONTRATANTE, e empresa **MLOBATO ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **24.342.072/0001-85**, sediada na Avenida Dr. Theomario Pinto da Costa, nº 811, sala 410, Skye Platinum Office, Bairro: Chapada, CEP.: 69050-055 em Manaus/AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO**, portador da Carteira de Identidade nº 2096258-4, expedida pela SSP/AM e CPF nº **001.136.022-43**, tendo em vista o que consta no Processo nº 64333.004129/2022-21 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência Pública nº 09/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, e seguindo a justificativa técnica para aditivo.

CRO/12
2975

1.1.2. **ACRESCENTAR +5,91%** do valor inicial atualizado do contrato a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R$ 391.984,05** (trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, e §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/1993; e conforme as devidas justificativas, anexa ao processo.

1.1.3. O valor total consolidado do aditivo (VFA) é de **R$ 391.984,05** (trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos);

1.1.4. O percentual acumulado de acréscimo do objeto é de **+5,91%;**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 167017
Fonte: 0188000000
Programa de Trabalho: 171497
Elemento de Despesa: 339039
Plano Interno: D8SAFCTCOSE

2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

3. CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada.

3.1.1 Com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual.

3.1.2 Atualizar, após acréscimos no valor original, o valor da garantia correspondente a 5% do valor atualizado do instrumento original em epigrafe, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

4.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: justificativa técnica para aditivo de prazo e serviço ao Termo de contrato 24 de 2022., referente a **Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR.**

CRO/12
2976
FLS

5. CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6. CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em **3 (três)** vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Manaus/AM, 18 de dezembro de 2023.

pela CONTRATANTE

FÁBIO BARROS DE SOUSA – Tenente Coronel
CPF: 828.781.613-00
Ordenador de Despesas da CRO/12

pela CONTRATADA

MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
CPF nº 001.136.022-43
MLOBATO ENGENHARIA EIRELI

ROL DE TESTEMUNHA:

1ª: _____
MARCIO MENEZES AGERTT – Cap. 1º Adjunto da SALC

2ª: _____
WIN GREGSON MOREIRA SILVA – ST Aux Sec Cont

CRO/12 2977 FLS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2023 - UASG 160017

Nº Processo: 64333.000460/2023-53.
Concorrência Nº 4/2023. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a do remanescente da construção do bloco 01 (um) de PNR para ST/SGT do CMDO da 1ª BDA INF, em Boa Vista - RR. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 18/12/2023 a 07/12/2025. Valor Total: R$ 5.492.525,92. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 11/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 69/2020.
Nº Processo: 64333.004053/2020-72.
Tomada de Preços. Nº 24/2020. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual em por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, referente a obra de engenharia para adequação do pavilhão almoxarifado do parque regional de manutenção/12, em Manaus/Am. Vigência: 18/12/2023 a 28/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 374.957,78. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 64333.004129/2022-21.
Concorrência. Nº 9/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR. Vigência: 18/12/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 6.630.295,32. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 22/2022.
Nº Processo: 64333.004132/2022-45.
Concorrência. Nº 8/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2022, por 106 (cento e seis) dias, período de 10/09/2024 a 24/12/2024, prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 30 (trinta) dias, com início em 18 de abril de 2024, encerrando-se em 17 de maio de 2024, acrescentar +4,79%, equivalente a R$ 165.827,47 suprimir -0,09%, equivalente a -R$ 3.389,53,o valor total consolidado do aditivo (VFA) é de R$ 162.437,94. Vigência: 18/12/2023 a 24/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.620.863,15. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 160017

Número do Contrato: 21/2022.
Nº Processo: 64333.003061/2022-63.
Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 02.118.049/0001-79 - R G CARDOSO LTDA. Objeto: Com o reajuste de R$ 4.634,72 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) o valor total do contrato estabelecido na cláusula terceira - do valor do contrato, passa de R$ 95.780,63 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), para R$ 100.415,35 (cem mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme diex 941-SEC TEC, de 14 de dezembro de 2023 e memória para decisão nº 349-S4/dom (D4dez23), vigência: 02/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.415,35. Data de Assinatura: 18/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

12ª REGIÃO MILITAR

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593006422/2023-43.
Pregão Nº 12/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO.
Contratado: 37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do grupo gerador gera power brasil gf3-300 300kva, quer serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e seus apêndices, estudos técnicos preliminares e seus anexos do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/12/2023 a 18/12/2024. Valor Total: R$ 16.498,92. Data de Assinatura: 15/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2023 - UASG 160351

Nº Processo: 64593006422/2023-43.
Pregão Nº 13/2023. Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO.
Contratado: 37.243.365/0001-57 - AILLEZ SOLUCOES LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a eventual aquisição de peças novas/genuínas, destinadas exclusivamente ao reparo/conserto do grupo gerador gera power brasil gf3-300, 300kva para suprir demandas de manutenções corretivas contingentes vinculadas com o pregão 23/2023..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/12/2023 a 18/12/2024. Valor Total: R$ 32.600,00. Data de Assinatura: 15/12/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).

COMANDO MILITAR DO LESTE

1ª REGIÃO MILITAR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NUP: 64279.000644/2022-34

Por determinação do §4º, do art. 22, Portaria nº 1.845, de 29 SET 22, tendo em vista que o Sr. JULIO CESAR FRANCISCO (CPF xxx.5892.xxx-04) encontra-se em lugar incerto e não sabido, dá-se ciência da Sindicância instaurada, pela Portaria nº 57-SIND - Dano Aux PFP2 - Asse Ap As Jurd/1ª RM, por edital, para apurar possíveis indícios de irregularidade administrativa em razão da ocorrência de pagamentos indevidos efetuados em favor da ex-pensionista MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA (Prec-CP nº 98/2743953) após seu falecimento em 12/07/2017. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intima-se o interessado para comparecer à inquirição, na condição de testemunha, no dia 27 de DEZEMBRO de 2023, às 9:00 no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (em frente à estação de trem/metrô de Triagem) - Rua Licinio Cardoso, nº 96 - São Francisco Xavier, Rio de janeiro - RJ, CEP: 20960-015."

1º SGT - ANDERSON GUEDES INEZ
Sindicante

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NUP: 642 79.043907/2021-19

Por determinação do §40, do art. 22, Portaria n° 1.845, de 29 SET, tendo em vista que o Sr. RONALDO AFONSO REIS (RG 07.XXX.477-6 - DETRAN/RJ) encontra-se em lugar incerto e não sabido, dá-se ciência da Sindicância instaurada, pela Portaria n° 249-SIND - Dano - Aux PFP2 - Asse Ap As Jurd/1°RM, de 29 de dezembro de 2022, por edital, para apurar possíveis indícios de irregularidade administrativa em razão da ocorrência de pagamentos indevidos efetuados em favor do ex-pensionista civil, Sr ARISTIDES RODRIGUES REIS (Matrícula 031 75499) após seu falecimento em 06/02/2020. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intima-se a interessada para comparecer à inquirição, na condição de testemunha, no dia 19 de dezembro de 2023, às 10:00 horas, no Posto de Atendimento da Seção de Veteranos e Pensionistas / Barra (Seção do Encarregado), situada na Avenida Salvador Allende n° 3773, Barra da T/uca, no interior das instalações do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), Rio de Janeiro, CEP 22783-127."

1º Sgt - RONIER PIMENTEL ALMEIDA
Sindicante

BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 UASG 160242

OBJETO: A Direção da Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro torna público que o Ordenador de Despesas, o Coronel de Infantaria KLAUBER ROGERIO CANDIAN, homologa o Pregão 20/2023, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada no segmento de engenharia clínica para a prestação de serviços contínuos de gestão, intervenção e assessoria em tecnologia de saúde, a fim de atender as necessidades do Hospital Militar de Resende. A ata de julgamento encontra-se no sítio: www.comprasnet.gov.br

CEL - KLAUBER ROGERIO CANDIAN
Ordenador de despesas

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A MARQUES COSTA & SILVA NETO - CNPJ: 15.407.625/0001-40.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 23/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado na Copa do 3º pavimento da 1ª Região Militar - Ala Duque de Caxias, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.
VIGÊNCIA: 13 de Novembro de 2023 a 30 de Abril de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 13 de Novembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 20.794.945/0001-30.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 30/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e conservação predial, preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos (materiais, equipamentos, EPIs, uniformes, ferramentas e outros) necessários à execução de serviços nos sistemas e instalações prediais (instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate a incêndio, intervenções estruturais, pintura, marcenaria, serralheria, vidraçaria, e geradores), na forma estabelecida em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a ser realizado no banheiro dos Subtenetes/Sargentos da Cia Cmdo - 4º andar, da ala Visconde da Gávea, do Palácio Duque de Caxias, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
VIGÊNCIA: 20 de Dezembro de 2023 a 31 de Maio de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 15 de Dezembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: UNIÃO POR INTERMÉDIO DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 1ª REGIÃO MILITAR (160303) E A FS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI- CNPJ: 20.794.945/0001-30.
ESPÉCIE: Termo de contrato de prestação de serviço de engenharia n° 31/2023.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e conservação predial, preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos (materiais, equipamentos, EPIs, uniformes, ferramentas e outros) necessários à execução de serviços nos sistemas e instalações prediais (instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate a incêndio, intervenções estruturais, pintura, marcenaria, serralheria, vidraçaria, e geradores), na forma estabelecida em Planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, a ser realizado no banheiro dos Cabos/Soldados da Cia Cmdo - 3º andar, da ala Visconde da Gávea, do Palácio Duque de Caxias, que serão prestados nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
VIGÊNCIA: 20 de Dezembro de 2023 a 31 de Maio de 2024.
DATA DE ASSINATURA: Rio de Janeiro, RJ, 15 de Dezembro de 2023.

CRO/12
2978
FLS

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 03/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 69/2020. Nº Processo: 64333.004053/2020-72. Tomada de Preços. Nº 24/2020. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do objeto contratual em por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, referente a obra de engenharia para adequação do pavilhão almoxarifado do parque regional de manutenção/12, em Manaus/Am. Vigência: 18/12/2023 a 28/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 374.957,78. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Apostilamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 21/2022. Nº Processo: 64333.003061/2022-63. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 02.118.049/0001-79 - R G CARDOSO LTDA. Objeto: Com o reajuste de R$ 4.634,72 (quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) o valor total do contrato estabelecido na cláusula terceira – do valor do contrato, passa de R$ 95.780,63 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), para R$ 100.415,35 (cem mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), conforme diex 941-SEC TEC, de 14 de dezembro de 2023 e memória para decisão nº 349-S4/dom (04dez23), vigência: 02/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.415,35. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 2/2023. Nº Processo: 64333.004129/2022-21. Concorrência. Nº 9/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08 de maio de 2023, encerrando-se em 27 de abril de 2025, acrescentar +5,91% equivalente a R$ 391.984,05 referente construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR. Vigência: 18/12/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 6.630.295,32. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2023 - UASG 160017 Atendendo ao caput do art 82 das IG 12-02, torno pública a celebração do Extrato do Termo do Aditamento conforme dados a seguir: Número do Contrato: 22/2022. Nº Processo: 64333.004132/2022-45. Concorrência. Nº 8/2022. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 07.581.251/0001-56 - FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2022, por 106 (cento e seis) dias, período de 10/09/2024 a 24/12/2024, prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, por mais 30 (trinta) dias, com início em 18 de abril de 2024, encerrando-se em 17 de maio de 2024, acrescentar +4,79%, equivalente a R$ 165.827,47 suprimir -0,09%, equivalente a -R$ 3.389,53,o valor total consolidado do aditivo (VFA) é de R$ 162.437,94. Vigência: 18/12/2023 a 24/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.620.863,15. Data de Assinatura: 18/12/2023.

Em consequência, os interessados tomem conhecimento e providências decorrentes.

b. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Classificação:

DIEx Simplificado Nº 218-Sec Tec/CRO/12
EB: 64333.001532/2024-61

Manaus, AM, 23 de abril de 2024.

Do Chefe da Seção Técnica
Ao Sr Chefe da Salc

Assunto: Termo de Contrato 02/2023 - Justificativa para Apostilamento do 1º reajuste Contratual.

Anexos:
1) 022023_REAJ01_pdf_rev_02_CST. assinado.pdf
2) MD_41_2024_P_98_2024_assinado_DOM.pdf

Acerca do assunto, solicito confeccionar e propor ao senhor Ordenador de Despesas desta Comissão Regional de Obras, minuta de apostilamento ao **Termo de Contrato nº 02/2023**, relativo à **Licitação: Concorrência Pública - 09/2022** , cujo objeto trata-se da **Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR,** Informo ainda que, anexa a este, segue memória de decisão da DOM, favorável ao reajuste contratual.

[redacted] **- Maj**
Chefe da Seção Técnica

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [redacted] em 23/04/2024, às 18:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

AbPh-Yazz-tNRH-H4C3

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 12ª REGIÃO MILITAR
CHECK LIST – ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE REAJUSTE

1. Cada item da Lista de Verificação foram gerados pela FISCALIZAÇÃO do Contrato.
2. O resultado da inspeção da presente Lista de Verificação foi anotado nos campos disponíveis.

3. DADOS DO CONTRATO

3.1 Objeto: Construção do Pavilhão da 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS em Boa Vista

3.2	Empresa executora:	MLOBATO ENGENHARIA EIRELI			
3.3	Nº TC:	**02/2023**			
3.4	Valor inicial contratado:	R$	6.630.295,32		
3.5	Valor acrescido/%:	R$	-		
3.6	Valor suprimido/%:	R$	-		
3.7	Valor total apostilado:	R$	-		
3.8	Valor atual do contrato:	R$	7.022.279,37		
3.9	Vigência inicial do contrato:	04/04/2023	a	20/09/2025	
3.10	Aditamento de vigência:				
3.11	Vigência atual do contrato:	04/04/2023	a	20/09/2025	
3.12	Data da Ordem de Serviço:	08/05/2023			
3.13	Período de execução inicial:	08/05/2023	a	26/01/2023	
3.14	Aditamento de prazo de exec.:	120 dias			
3.15	Período atual de execução:	08/05/2023	a	25/08/2025	

4. INFORMAÇÕES QUANTO AO CRONOGRAMA

Valor previsto	%	Valor executado	%	Obra no prazo?
R$ 1.796.794,62	25,59%	R$ 2.041.994,40	29,08%	SIM

5. ANEXOS

ITEM		Conformidade		
		SIM	NÃO	Observações
5.1	Solicitação da Contratada	X		ok
5.2	Justificativa do fiscal	X		ok
5.3	Planilha de Cálculo do Valor do Rejuste	X		ok
5.4	Cronograma físico-financeiro vigente	X		ok
5.5	Cronograma físico-financeiro consolidado com o reajuste		X	não é o caso
5.6	Tabela de índices do INCC-DI	X		ok
5.7	Relatório de Acompanhamento Simplificado do OPUS	X		ok
5.8	Ficha de Informações Gerais de Obra (FIGO)	X		ok
5.9	Outros julgados necessários		X	não é o caso

6. DADOS RELEVANTES DO REAJUSTE


Período considerado no 1º Reajuste ao saldo contratual	Jul/22 a Jul/23
Índice INCC-DI no mês inicial	1043,760
Índice INCC-DI no mês inicial	1076,626
Valor previsto em cronograma no mês final	R$ 1.444.502,43
Valor atual do contrato	R$ 7.022.279,37
Saldo a reajustar	R$ 6.864.085,64
Percentual de reajuste	3,1488%
Valor do reajuste	R$ 216.136,33

7. DADOS RELATIVOS AO CRONOGRAMA

7.1 CRONOGRAMA VIGENTE

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO								
Ano	Ref Mês	Previsão	Previsto Acumulado	Executado	Exec Acumulado	% Prevista	% Executada	IDP
2023	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	100,0%
2023	6	53.392,51	53.392,51	0,00	0,00	0,8%	0,0%	0,0%
2023	7	104.801,22	158.193,73	58.188,85	58.188,85	2,3%	0,8%	36,8%
2023	8	147.730,88	305.924,61	412.954,79	471.143,64	4,4%	6,7%	154,0%
2023	9	231.999,36	537.923,97	564.943,69	1.036.087,33	7,7%	14,8%	192,6%
2023	10	271.501,03	809.425,00	120.855,39	1.156.942,72	11,5%	16,5%	142,9%
2023	11	303.093,61	1.112.518,61	624.206,72	1.781.149,44	15,8%	25,4%	160,1%
2023	12	331.983,82	1.444.502,43	260.844,96	2.041.994,40	20,6%	29,1%	141,4%
2024	1	352.292,19	1.796.794,62	0,00	2.041.994,40	25,6%	29,1%	113,6%
2024	2	373.949,11	2.170.743,73	0,00	2.041.994,40	30,9%	29,1%	94,1%
2024	3	396.278,44	2.567.022,17	0,00	2.041.994,40	36,6%	29,1%	79,5%
2024	4	406.572,20	2.973.594,37	0,00	2.041.994,40	42,3%	29,1%	68,7%
2024	5	412.135,64	3.385.730,01	0,00	2.041.994,40	48,2%	29,1%	60,3%
2024	6	400.105,90	3.785.835,91	0,00	2.041.994,40	53,9%	29,1%	53,9%
2024	7	394.517,89	4.180.353,80	0,00	2.041.994,40	59,5%	29,1%	48,8%
2024	8	386.799,83	4.567.153,63	0,00	2.041.994,40	65,0%	29,1%	44,7%
2024	9	371.353,65	4.938.507,28	0,00	2.041.994,40	70,3%	29,1%	41,3%
2024	10	340.202,32	5.278.709,60	0,00	2.041.994,40	75,2%	29,1%	38,7%
2024	11	312.043,35	5.590.752,95	0,00	2.041.994,40	79,6%	29,1%	36,5%
2024	12	279.224,95	5.869.977,90	0,00	2.041.994,40	83,6%	29,1%	34,8%
2025	1	243.188,55	6.113.166,45	0,00	2.041.994,40	87,1%	29,1%	33,4%
2025	2	221.825,20	6.334.991,65	0,00	2.041.994,40	90,2%	29,1%	32,2%
2025	3	166.751,19	6.501.742,84	0,00	2.041.994,40	92,6%	29,1%	31,4%
2025	4	87.810,53	6.589.553,37	0,00	2.041.994,40	93,8%	29,1%	31,0%
2025	5	40.741,95	6.630.295,32	0,00	2.041.994,40	94,4%	29,1%	30,8%
2025	6	391.984,05	7.022.279,37	0,00	2.041.994,40	100,0%	29,1%	29,1%

7.2 CURVA S

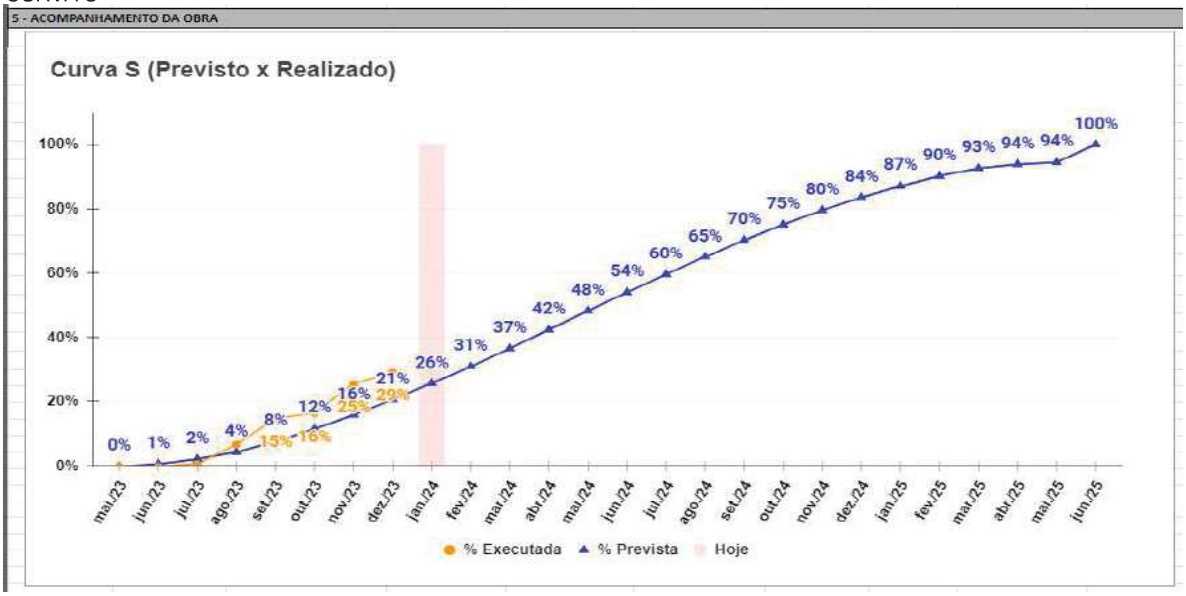

8. ENCAMINHAMENTO DO ADITIVO

Diretoria de Obras Militares	

9. CONTROLE DE TRAMITAÇÃO

AÇÃO	DATAS					
	1	2	3	4	5	6
Tramitação interna: dias ([6]-[1])						

[1] Protocolo do pedido reajuste;
[2] Despacho Ch CRO 12;
[5] Entrega na Sec Tec (Seap)
[6] Saída da Sec Tec ao Ch CRO 12;
[10] Assinatura do OD;
[11] Upload no OPUS.

10. FATOS RELEVANTES OU CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS DO FISCAL DE CONTRATO

11. CONFERÊNCIA

Documento assinado digitalmente
VINICIUS DIAS JORGE
Data: 09/02/2024 09:05:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA: _____

Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras

DATA: _____/_____/_____

11. OBSERVAÇÕES GERAIS E DESPACHO

CH SSEÇ FISC OBRAS:

CH SEC TEC:

CH CRO/12: FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300

Assinado de forma digital por FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
Dados: 2024.02.15 11:08:10 -04'00'

Ofício n. º 79/2023

Manaus/AM, 21 de setembro de 2023.

À
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR/CRO12
At. Ten Cel Fábio Barros de Sousa – Ordenador de Despesas

Ref.: **Contrato nº 02/2023**

Assunto: SOLICITAÇÃO DO 1º REAJUSTAMENTO ANUAL

MLOBATO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 24.342.072/0001-85, sediada na Av. Jacira Reis, 391, Sala 8A, Garden Center, São Jorge, CEP: 69.033-008, Manaus-AM, por seu representante legal, Sr. Matheus Felipe de Oliveira Lobato, portador da cédula de identidade RG 2096258-4 e do CPF 001.136.022-43, com fulcro na **cláusula 19 do projeto básico parágrafo 19.1, FORMALIZA**, a **solicitação do 1º reajustamento anual relativo ao contrato nº 02/2023**, cujo objeto é a Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR.

Atenciosamente,

MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

MLobato Engenharia Eireli
- Comercial: (92) 4104-7316
- E-mail: mlobatoengenhariamao@gmail.com
- Endereço: Av. Jacira Reis, 391, sala 8A, Garden Center, São Jorge, CEP 69.033-008, Manaus/AM

www.mlobatoengenharia.com.br

Protocolo nº 2507

CRO/12 – Sect
Recebido em 22/09/2023
às 09:39 Horas

22/09 | SSF ESC
- Analisar
- Propor SFC
- Incluir Contrato

Prosseguir

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITOBRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

JUSTIFICATIVA DE APOSTILAMENTO DO 1º REAJUSTAMENTO DO TC 02/2023

1. CONTRATO

1.1 Objeto:

Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS

1.2.1 Condições iniciais contratadas

- **Licitação:** Tomada de Preco 09/2022
- **Regime de execução:** Empreitada por preço unitário
- **Data da proposta:** set/22
- **Empresa contratada:** MLOBATO ENGENHARIA EIRELI
- **Valor inicial contratual:** R$ 6.630.295,32
- **Prazo de execução da obra:** 840 dias
- **Prazo de vigência da obra:** 900 dias
- **Data da Ordem de Serviço:** 08/05/2023
- **Período de execução da obra:** 08/05/2023 a 25/08/2025
- **Data da assinatura do contrato:** 04/04/2023
- **Período de vigência contratual:** 04/04/2023 a 20/09/2025

1.2.2 Termos Aditivos celebrados

- 1º Termo Aditivo de prazo de 120 dias

1.2.3 Termos de Apostilamento celebrados

- Não houve

1.2.4 Situação atual do contrato

- **Prazo de execução:** 840 dias
- **Termino da execução:** 25/08/2025
- **Prazo de vigência:** 900 dias
- **Termino da vigência:** 20/09/2025
- **Valor contratual atualizado (incluindo apostilamento):** R$ -
- **Valor total empenhado:** R$ 3.100.355,40

2. EXPOSIÇÃO DOS FATOS / JUSTIFICATIVA TÉCNICA

2.1 Justificativa técnica para o reajuste

A empresa contratada solicitou , em 21 SET 23, o apostilamento do 1º Reajuste de Preços ao saldo contratual do referido Contrato, tendo em vista já ter passado o interregno de mais de um ano, a contar da data de referência, conforme disciplina o Termo de Referência.

Face ao esposto, visto que o Termo de Referência determina a data de referência como a data de apresentação do orcamento, que no caso do presente contrato foi elaborada com base de JUL 22, esta será tomada para o cálculo.

O Reajustamento será calculado a partir da fórmula abaixo, prevista na Cláusula Oitava do TC 02/2023: $R_1 = \sum \mathbf{TAs} \times (I_2 - I_1)/I_1$. (Equação 1 - do 1º Reajuste)

Onde:

- $\mathbf{R_1}$ - é o valor do 1º Reajustamento;
- $\sum$ **TAs** - é a soma do saldo contratual e todos os aditivos a reajustar;
- $\mathbf{I_1}$ - é o índice do INCC do mês de apresentação da proposta, base para cálculo do reajuste;
- $\mathbf{I_2}$ - é o índice do INCC do 13º mês, contado a partir da apresentação da proposta;
- $\mathbf{(I_2 - I_1) / I_1}$ – é o percentual de reajuste do 1º Reajustamento.

Sendo:

- ∑ TAs = 6.864.085,64
- I_1 = INCC $_{JUL/22}$ = 1043,760
- I_2 = INCC $_{JUL/23}$ = 1076,626

Logo:

- (I_2 - I_1) / I_1 = (1076,626 - 1043,76)/1043,76 = 3,1488%
- R_1 = 216136,329
- **R_1 = R$ 216.136,33**

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
b. Cláusula Sexta – Do Reajustamento de precos em sentido amplo – do Termo de Contrato 02/2023
c. Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

4. CONCLUSÃO

Face ao exposto, esta fiscalização é de parecer favorável à aprovação do primeiro e segundo reajustamento contratual, referente ao saldo contratual do TC 02/2023 no valor de R$ 216.136,33 (Duzentos e dezesseis, cento e trinta e seis reais e trinta e tres centavos), conforme explanado no item 2.

5. ANEXOS

- Planilha orçamentária da administração;
- Cronograma físico-financeiro vigente;
- Cronograma consolidado com o cálculo do reajuste;
- Tabela de índices do INCC;
- Relatório de acompanhamento simplificado do OPUS;
- Ficha de Informações Gerais de Obra.

Manaus/AM, 02 de fevereiro 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
WANESSA RODRIGUES DA SILVA
Data: 07/02/2024 09:13:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WANESSA RODRIGUES DA SILVA – 2º TEN
Fiscal do Contrato

CONCORDO

gov.br Documento assinado digitalmente
KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS
Data: 15/02/2024 00:12:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS – MAJ QEM FC
Chefe da Seção Técnica

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

a) Concordo com a presente justificativa;
b) A Seção Técnica encaminhe para análise à DOM;
c) O Fiscal do Contrato providencie o carregamento da documentação pertinente no Sistema OPUS.

FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300

Assinado de forma digital por FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=34028316000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=FABIO BARROS DE SOUSA:82878161300
Dados: 2024.02.15 11:08:34 -04'00'

FABIO BARROS DE SOUSA – TC QEM FC
Ordenador de Despesas

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

Termo de Contrato nº 02/2023 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PROPOSTO

Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7° BIS, em Boa Vista/RR

1º Ano

Cronograma Físico-Financeiro - TC 02/2023	Mês Base										OS			
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Cronograma Físico-Financeiro - TC 02/2023 - Previsto												R$ 53.392,51	R$ 104.801,22	R$ 147.730,88
Cronograma Físico-Financeiro - TC 02/2023 - Executado													R$ 58.188,85	R$ 412.954,79
Consolidação discretizada	**R$ 0,00**	**R$ -**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 53.392,51**	**R$ 104.801,22**	**R$ 147.730,88**
Consolidação acumulada	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 53.392,51**	**R$ 158.193,73**	**R$ 305.924,61**
Valor do 1º reajustamento														R$ 4.651,75
Total discretizado com o 1º reajuste contratual	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 0,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 53.392,51**	**R$ 104.801,22**	**R$ 152.382,63**
Total acumulado com o 1º reajuste contratual	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 53.392,51**	**R$ 158.193,73**	**R$ 310.576,36**

INCC JUL/22	1043,760
INCC JUL/23	1076,626
D INCC (1º reajustamento)	**3,1488%**
Saldo a reajustar (1º reajustamento)	**R$ 6.864.085,64**
Valor do 1º Reajuste	**R$ 216.136,33**
TOTAL DEVIDO 1º REAJ:	**R$ 216.136,33**

WANESSA RODRIGUES DA SILVA – 2º TEN
Fiscal do Termo de Contrato 02/2023

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

set/23	**out/23**	**nov/23**	**dez/23**	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**
R$ 231.999,36	R$ 271.501,03	R$ 303.093,61	R$ 331.983,82	R$ 352.292,19	R$ 373.949,11	R$ 396.278,44	R$ 406.572,20	R$ 412.135,64	R$ 400.105,90
R$ 564.943,69	R$ 120.855,39	R$ 624.206,72	R$ 260.844,96						
R$ 231.999,36	**R$ 271.501,03**	**R$ 303.093,61**	**R$ 331.983,82**	**R$ 352.292,19**	**R$ 373.949,11**	**R$ 396.278,44**	**R$ 406.572,20**	**R$ 412.135,64**	**R$ 400.105,90**
R$ 537.923,97	**R$ 809.425,00**	**R$ 1.112.518,61**	**R$ 1.444.502,43**	**R$ 1.796.794,62**	**R$ 2.170.743,73**	**R$ 2.567.022,17**	**R$ 2.973.594,37**	**R$ 3.385.730,01**	**R$ 3.785.835,91**
R$ 7.305,20	R$ 8.549,02	R$ 9.543,81	R$ 10.453,51	R$ 11.092,98	R$ 11.774,91	R$ 12.478,02	R$ 12.802,15	R$ 12.977,33	R$ 12.598,53
R$ 239.304,56	**R$ 280.050,05**	**R$ 312.637,42**	**R$ 342.437,33**	**R$ 363.385,17**	**R$ 385.724,02**	**R$ 408.756,46**	**R$ 419.374,35**	**R$ 425.112,97**	**R$ 412.704,43**
R$ 549.880,92	**R$ 829.930,97**	**R$ 1.142.568,39**	**R$ 1.485.005,72**	**R$ 1.848.390,88**	**R$ 2.234.114,90**	**R$ 2.642.871,36**	**R$ 3.062.245,71**	**R$ 3.487.358,67**	**R$ 3.900.063,11**

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

jul/24	ago/24	set/24							
R$ 394.517,89	R$ 386.799,83	R$ 371.353,65	R$ 340.202,32	R$ 312.043,35	R$ 279.224,95	R$ 243.188,55	R$ 221.825,20	R$ 166.751,19	R$ 87.810,53
R$ 394.517,89	**R$ 386.799,83**	**R$ 371.353,65**	**R$ 340.202,32**	**R$ 312.043,35**	**R$ 279.224,95**	**R$ 243.188,55**	**R$ 221.825,20**	**R$ 166.751,19**	**R$ 87.810,53**
R$ 4.180.353,80	**R$ 4.567.153,63**	**R$ 4.938.507,28**	**R$ 5.278.709,60**	**R$ 5.590.752,95**	**R$ 5.869.977,90**	**R$ 6.113.166,45**	**R$ 6.334.991,65**	**R$ 6.501.742,84**	**R$ 6.589.553,37**
R$ 12.422,58	R$ 12.179,55	R$ 11.693,18	R$ 10.712,29	R$ 9.825,62	R$ 8.792,24	R$ 7.657,52	R$ 6.984,83	R$ 5.250,66	R$ 2.764,98
R$ 406.940,47	**R$ 398.979,38**	**R$ 383.046,83**	**R$ 350.914,61**	**R$ 321.868,97**	**R$ 288.017,19**	**R$ 250.846,07**	**R$ 228.810,03**	**R$ 172.001,85**	**R$ 90.575,51**
R$ 4.307.003,58	**R$ 4.705.982,96**	**R$ 5.089.029,79**	**R$ 5.439.944,40**	**R$ 5.761.813,37**	**R$ 6.049.830,56**	**R$ 6.300.676,63**	**R$ 6.529.486,66**	**R$ 6.701.488,51**	**R$ 6.792.064,02**

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

		Totais
R$ 40.741,95	R$ 391.984,05	R$ 7.022.279,37
		R$ 2.041.994,40
R$ 40.741,95	**R$ 391.984,05**	**R$ 7.022.279,37**
R$ 6.630.295,32	**R$ 7.022.279,37**	
R$ 1.282,88	R$ 12.342,79	**R$ 216.136,33**
R$ 42.024,83	**R$ 404.326,84**	**R$ 7.238.415,70**
R$ 6.834.088,85	**R$ 7.238.415,70**	

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

mlobato ENGENHARIA

Obra
CC 09/2022 - Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR_

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Roraima
SBC - 09/2022 - Roraima
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas

B.D.I.
21,1%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,16%
Mensalista: 69,81%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	* 100,00%	15,00%	35,00%	50,00%										
		57.680,21	8.652,03	20.188,07	28.840,11										
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	2,00%	4,17%	5,17%	6,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	5,18%	4,17%
		720.452,00	14.409,04	30.042,85	37.247,37	44.451,89	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	37.319,41	30.042,85
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	20,00%	20,00%											
		16.025,59	3.205,12	3.205,12											
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%													
		0,00													
5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%													
		26.459,40													10,00%
6	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	100,00%	15,00%	35,00%	50,00%										2.645,94
		22.911,13	3.436,67	8.018,90	11.455,57										
7	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	20,00%	25,00%	35,00%										
		118.448,25	23.689,65	29.612,06	41.456,89										
8	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		25,00%	30,00%	45,00%									
		54.936,88		13.734,22	16.481,06	24.721,60									
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇO DE VISITAS E CAIXAS	100,00%													
		45.816,74													
10	ESCORAMENTO EM VALAS	0,00%													
		0,00													
11	ASSENTAMENTOS DE TUBOS E PEÇAS	0,00%													
		0,00													
12	LIGAÇÕES PREDIAIS AGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE	0,00%													
		0,00													
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%													
		1.260.762,07				10,00%	17,50%	19,50%	21,50%	20,50%	11,00%				
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)	100,00%				126.076,21	220.633,36	245.846,60	271.063,85	258.456,22	138.683,83				
		122.498,91			10,00%	30,00%	17,00%	20,00%	23,00%						
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			12.249,89	36.749,67	20.824,81	24.499,78	28.174,75						
		97.697,21								10,00%	13,00%	15,00%	15,00%	16,00%	12,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%								9.769,72	12.700,64	14.654,58	14.654,58	15.631,55	11.723,67
		251.557,87													
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00%													
		221.895,16													
18	PAREDES / PAINÉIS	100,00%													
		135.427,79									10,00%	25,00%	22,00%	25,00%	18,00%
19	COBERTURA	100,00%									13.542,78	33.856,95	29.794,11	33.856,95	24.377,00
		1.407.301,10									6,00%	12,50%	14,00%	14,00%	11,00%
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00%									84.438,07	175.912,64	197.022,15	197.022,15	154.803,12
		5.404,75						50,00%	50,00%						
21	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	100,00%						2.702,38	2.702,38						
		213.788,75													
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00%													
		415.344,20													
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	100,00%													
		675.292,49								8,00%	14,00%	21,00%	20,00%	19,00%	18,00%
24	PINTURAS	100,00%								54.023,40	94.540,95	141.811,42	135.058,50	128.305,57	121.552,65
		210.125,57													
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	100,00%													
		6.770,75													
26	PAVIMENTAÇÃO	100,00%													
		499.642,50													11,00%
27	URBANIZAÇÃO	100,00%													54.960,68
		44.056,00													
	Porcentagem		0,81%	1,58%	2,23%	3,5%	4,09%	4,57%	5,01%	5,31%	5,64%	5,98%	6,13%	6,22%	6,03%
	Custo		53.392,51	104.801,22	147.730,88	231.999,36	271.501,03	303.093,61	331.983,82	352.292,19	373.949,11	396.278,44	406.572,20	412.135,64	400.105,90
	Porcentagem Acumulado		0,81%	2,39%	4,61%	8,11%	12,21%	16,78%	21,79%	27,1%	32,74%	38,72%	44,85%	51,06%	57,1%
	Custo Acumulado		53.392,50	158.193,72	305.924,60	537.923,97	809.424,99	1.112.518,60	1.444.502,42	1.796.794,61	2.170.743,72	2.567.022,16	2.973.594,35	3.385.729,99	3.785.835,89

MLOBATO ENGENHARIA LTDA

Mlobato Engenharia LTDA
Matheus Lobato
Engenheiro Civil
CREA 14529/AM

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - São Jorge - Manaus / AM
(92) 4104-7316 / msmengenhariamao@gmail.com

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,18% 30.114,89	4,17% 30.042,85	2,16% 15.561,76
							20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	20,00% 3.205,12	
10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94	10,00% 2.645,94		10,00% 2.645,94		10,00% 2.645,94
									10,00% 11.844,83	10,00% 11.844,83
				10,00% 4.581,67	25,00% 11.454,19	20,00% 9.163,35	10,00% 4.581,67	20,00% 9.163,35	15,00% 6.872,51	
10,00% 9.769,72	9,00% 8.792,75									
10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	10,00% 25.155,79	
15,00% 33.284,27	15,00% 33.284,27	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52	10,00% 22.189,52		
13,00% 182.949,14	12,50% 175.912,64	11,50% 161.839,63	5,50% 77.401,56							
				15,00% 32.068,31	15,00% 32.068,31	20,00% 42.757,75	20,00% 42.757,75	20,00% 42.757,75	5,00% 10.689,44	5,00% 10.689,44
10,00% 41.534,42	10,00% 41.534,42	10,00% 41.534,42	15,00% 62.301,63	15,00% 62.301,63	15,00% 62.301,63	10,00% 41.534,42	15,00% 62.301,63			
		10,00% 21.012,56	18,00% 37.822,60	17,00% 35.721,35	10,00% 21.012,56	15,00% 31.518,84	15,00% 31.518,84	15,00% 31.518,84		
			15,00% 1.015,61	15,00% 1.015,61	15,00% 1.015,61	55,00% 3.723,91				
12,50% 62.455,31	13,00% 64.953,53	12,50% 62.455,31	15,00% 74.946,38	17,50% 87.437,44	12,50% 62.455,31	6,00% 29.978,55				
15,00% 6.608,40	10,00% 4.405,60	10,00% 4.405,60	15,00% 6.608,40	20,00% 8.811,20	20,00% 8.811,20	10,00% 4.405,60				
5,95%	**5,83%**	**5,6%**	**5,13%**	**4,71%**	**4,21%**	**3,67%**	**3,35%**	**2,51%**	**1,32%**	**0,61%**
394.517,89	**386.799,83**	**371.353,65**	**340.202,32**	**312.043,35**	**279.224,95**	**243.188,55**	**221.825,20**	**166.751,19**	**87.810,53**	**40.741,97**
63,05%	**68,88%**	**74,48%**	**79,61%**	**84,32%**	**88,53%**	**92,2%**	**95,55%**	**98,06%**	**99,39%**	**100,0%**
4.180.353,79	**4.567.153,61**	**4.938.507,26**	**5.278.709,58**	**5.590.752,93**	**5.869.977,88**	**6.113.166,43**	**6.334.991,63**	**6.501.742,82**	**6.589.553,35**	**6.630.295,32**

MLobato Engenharia LTDA
Matheus Lobato
Engenheiro Civil
CREA 14529/AM

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - São Jorge - Manaus / AM
(92) 4104-7316 / msmengenhariamao@gmail.com

indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=59

Índice de Preço: INCC-DI/FGV

2021 **Ano: 2022** 2023

índice				
Mês	índice	Var% Mês	Acum. Ano%	Acum. 12 meses%
JAN	969,184	0,71%	0,71%	13,65%
FEV	972,904	0,38%	1,10%	11,97%
MAR	981,244	0,86%	1,97%	11,47%
ABR	990,543	0,95%	2,93%	11,52%
MAI	1.013,164	2,28%	5,28%	11,59%
JUN	1.034,824	2,14%	7,53%	11,57%
JUL	1.043,760	0,86%	8,46%	11,59%
AGO	1.044,679	0,09%	8,56%	11,17%
SET	1.045,616	0,09%	8,66%	10,70%
OUT	1.046,896	0,12%	8,79%	9,90%
NOV	1.050,701	0,36%	9,18%	9,56%
DEZ	1.051,632	0,09%	9,28%	9,28%

Índice de Preço: INCC-DI/FGV

2022 **Ano: 2023**

índice				
Mês	índice	Var% Mês	Acum. Ano%	Acum. 12 meses%
JAN	1.056,418	0,46%	0,46%	9,00%
FEV	1.056,896	0,05%	0,50%	8,63%
MAR	1.060,116	0,30%	0,81%	8,04%
ABR	1.061,635	0,14%	0,95%	7,18%
MAI	1.067,919	0,59%	1,55%	5,40%
JUN	1.075,540	0,71%	2,27%	3,93%
JUL	1.076,626	0,10%	2,38%	3,15%
AGO	1.078,412	0,17%	2,55%	3,23%
SET	1.082,104	0,34%	2,90%	3,49%
OUT	1.084,242	0,20%	3,10%	3,57%
NOV	1.084,986	0,07%	3,17%	3,26%


Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

Relatório de Acompanhamento Simplificado

12ª RM

202212000405 - Construção / 2ª Cia Fzo Sl / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS, Boa Vista/RR



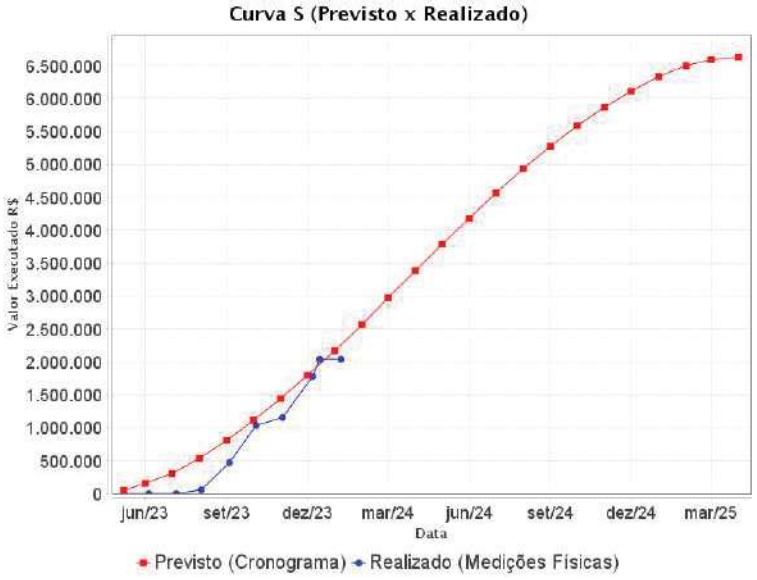

N° Contrato: 02/2023 Última medição: 08 jan 2024

Situação Físico-Financeira	Valor (R$)	%
Contratado	7.022.279,37	100,00
Empenhado	3.100.355,21	44,15
Liquidado	2.041.994,40	29,08
Pago	2.041.994,40	29,08
Ordem de Serviço	08 mai 2023	
Prazo de Execução	27 abr 2025	
Vigência Contratual	20 set 2025	
Prev. Cronograma (%)	37.7700	⚠ Obra Atrasada
Situação Física Real (%)	29.0800	

Observações:

AO 156M Fiscal: 2° Ten Wanessa / 2º Ten Vital (Substituto) | Empresa: M Lobato Engenharia |1) Situação: Obra em Andamento; 2) Serviços em Execução: Execução de escavação de blocos da fundação, forma e aço dos blocos da fundacao; | 3) Impedimentos: TA 02 em análise - Serviços de terraplanagem, estacas e projetos; | 4) Providências: TA02 sendo analisado| 5) Outras info: não há

02/2023 - Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR, em Boa Vista/RR

1 - INFORMAÇÕES DO OBJETO						
Objeto:	Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR					
Cidade/UF:	Boa Vista/RR	Grande Cmdo:	CMA		OM beneficiada:	7º BIS
Nº OPUS:	202212000405	Programa estratégico:			Ação Orç:	156M

2 - INFORMAÇÕES GERAIS (LICITAÇÃO E CONTRATO)						SITUAÇÃO DO CONTRATO:	Em andamento
Edital:	CP 09/2022	Valor Administração:	R$ 7.367.822,89	Desconto:	10,0%	Data Rfr Orç	01/09/2022
Nº Contrato:	02/2023	Empresa:	MLOBATO ENGENHARIA EIRELI			CNPJ:	24342072/0001-85
Responsável:	Matheus Felipe de Oliveira Lobato			Telefone:	(92) 4104-7316	Email:	mlobatoengenhariamao@gmail.com
Preposto:				Telefone:		Email:	
Fiscal Contrato/Técnico:	Ten Wanessa			Telefone:	(92) 994874497	Email:	cro12.bvb@gmail.com
Fiscal Contrato/Téc Substituto:	Ten Vital			Telefone:	(92) 999851372	Email:	mavital.itac@gmail.com

Valor Inicial:	Assinatura do Contrato	04/04/2023	Vigência Contratado (d)	900	Término da Vigência Inicial	20/09/2025
R$ 6.630.295,32	Início da Obra (Data da OS)	08/05/2023	Prazo Contratado (d)	840	Término de Prazo Execução	25/08/2025

3 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA			
ART Nº	Profissional	Finalidade	Data
AM20230383438	MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO	Execucao	16/05/2023

4 - INFORMAÇÕES GERENCIAIS

4.1 - VALOR ATUAL DO CONTRATO			
Valor Inicial	R$	6.630.295,32	
Acréscimos	R$	430.840,24	6,49%
Supressões	R$	(38.856,19)	0,58%
Reequilíbrio	R$	-	0,00%
Reajustes	R$	-	0,00%
Valor atual	R$	7.022.279,37	

DATA VIGÊNCIA ATUAL	
Assn Contr	04/04/2023
Prz Vgr In	900
Prz Vgr Aditivo	0
Vgr Atual	20/09/2025

DATA EXECUÇÃO ATUAL	
Data OS	08/05/2023
Prz Exec In	840
Prz Exec Aditivo	140
Exec Atual	12/01/2026

SITUAÇÃO FINANCEIRA			
Valor Empenhado	R$	3.100.355,40	44,15%
Valor Liquidado	R$	2.041.994,40	65,86%
Valor a Liquidar	R$	1.058.361,00	51,83%
Saldo para acréscimo de aditivo	R$	1.226.733,59	18,50%

R$ 3.921.923,97


NECESSIDADE DE RECURSOS (MÉDIA 3 ÚLTIMAS MEDIÇÕES)		
Me Liq (3 m)	R$	295.017,23
Nec Rcs	R$	3.921.923,97
Prv Nec Rcs (m)		13,29
Estm Dur Rcs		mar./25

NECESSIDADE DE RECURSOS (MÉDIA 5 ÚLTIMAS MEDIÇÕES)		
Me Liq (5 m)	R$	224.407,25
Nec Rcs	R$	3.921.923,97
Prv Nec Rcs (m)		17,48
Estm Dur Rcs		jul./25

SALDO DE RECURSO POR ANO DO RECURSO				
Saldo por ano	2024	R$	-	0,00%
RP	2023	R$	100.355,40	9,48%
RP	2022	R$	-	0,00%
RP	2021	R$	-	0,00%

OBSERVAÇÕES / IMPEDIMENTOS
TA 02 em análise, Pendente elaboracao do 1 Reajuste.

5 - ACOMPANHAMENTO DA OBRA

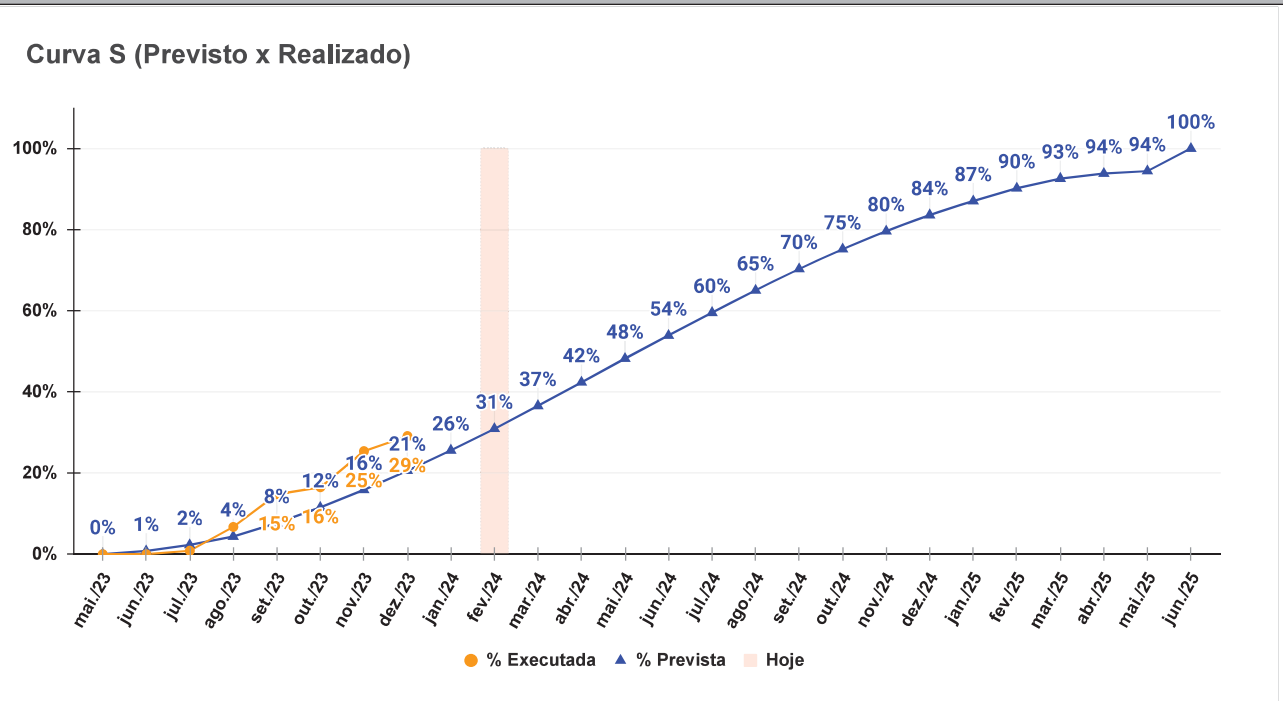

6 - NOTIFICAÇÕES/ PROCESSO ADMINISTRATIVO				
Nº NOT /PORT PA	DATA DE ENVIO/ABERTURA	MOTIVO	RESPOSTA DA EMPRESA	SANÇÃO

02/2023 - Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR, em Boa Vista/RR

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO								
Ano	Ref Mês	Previsão	Previsto Acumulado	Executado	Exec Acumulado	% Prevista	% Executada	IDP
2023	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	100,0%
2023	6	53.392,51	53.392,51	0,00	0,00	0,8%	0,0%	0,0%
2023	7	104.801,22	158.193,73	58.188,85	58.188,85	2,3%	0,8%	36,8%
2023	8	147.730,88	305.924,61	412.954,79	471.143,64	4,4%	6,7%	154,0%
2023	9	231.999,36	537.923,97	564.943,69	1.036.087,33	7,7%	14,8%	192,6%
2023	10	271.501,03	809.425,00	120.855,39	1.156.942,72	11,5%	16,5%	142,9%
2023	11	303.093,61	1.112.518,61	624.206,72	1.781.149,44	15,8%	25,4%	160,1%
2023	12	331.983,82	1.444.502,43	260.844,96	2.041.994,40	20,6%	29,1%	141,4%
2024	1	352.292,19	1.796.794,62	0,00	2.041.994,40	25,6%	29,1%	113,6%
2024	2	373.949,11	2.170.743,73	0,00	2.041.994,40	30,9%	29,1%	94,1%
2024	3	396.278,44	2.567.022,17	0,00	2.041.994,40	36,6%	29,1%	79,5%
2024	4	406.572,20	2.973.594,37	0,00	2.041.994,40	42,3%	29,1%	68,7%
2024	5	412.135,64	3.385.730,01	0,00	2.041.994,40	48,2%	29,1%	60,3%
2024	6	400.105,90	3.785.835,91	0,00	2.041.994,40	53,9%	29,1%	53,9%
2024	7	394.517,89	4.180.353,80	0,00	2.041.994,40	59,5%	29,1%	48,8%
2024	8	386.799,83	4.567.153,63	0,00	2.041.994,40	65,0%	29,1%	44,7%
2024	9	371.353,65	4.938.507,28	0,00	2.041.994,40	70,3%	29,1%	41,3%
2024	10	340.202,32	5.278.709,60	0,00	2.041.994,40	75,2%	29,1%	38,7%
2024	11	312.043,35	5.590.752,95	0,00	2.041.994,40	79,6%	29,1%	36,5%
2024	12	279.224,95	5.869.977,90	0,00	2.041.994,40	83,6%	29,1%	34,8%
2025	1	243.188,55	6.113.166,45	0,00	2.041.994,40	87,1%	29,1%	33,4%
2025	2	221.825,20	6.334.991,65	0,00	2.041.994,40	90,2%	29,1%	32,2%
2025	3	166.751,19	6.501.742,84	0,00	2.041.994,40	92,6%	29,1%	31,4%
2025	4	87.810,53	6.589.553,37	0,00	2.041.994,40	93,8%	29,1%	31,0%
2025	5	40.741,95	6.630.295,32	0,00	2.041.994,40	94,4%	29,1%	30,8%
2025	6	391.984,05	7.022.279,37	0,00	2.041.994,40	100,0%	29,1%	29,1%

CONTROLE DOS TERMOS ADITIVOS / REAJUSTES						
APROVADOS						
Nº	Tipo	Prz Exec	Prz Vgr	Acréscimo	Supressão	Total
TA-1	Prazo, Serviço	140	0	430.840,24	38.856,19	R$ 391.984,05
						R$ -

EM ANÁLISE / EM ELABORAÇÃO										
Nº	Tipo	Prz Exec	Prz Vgr	Acréscimo Solicitado	Supressão Solicitado	Total Solicitado	Total Aprovado	Nº Pedido	STATUS CRO 12	STATUS OPUS
TA-1	Serviço	120	N/A	391.984,05	0,00	391.984,05	391.922,31	705/2023	Para Celebrar	Atendido
TA-02	Serviço			752.986,17	49.586,19	703.417,98	0,00		Em elaboração	Não cadastrado

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA REAJUSTAMENTO						
Nº Reajuste	I (n-1)	I (n)	I (r)	Valor Contr	Saldo não Reaj	Valor Reaj
TA-1	Prazo, Serviço	140	0	430.840,24	38.856,19	391.984,05
Total						**391.984,05**

CADASTRO DAS NOTAS DE EMPENHO					
Data Emp	Nº NC	Nº NE	UG	AO	Valor (R$)
04/04/2023	2023NC400768	2023NE000034	160017	156M	500.000,00
06/10/2023		2023NE000234	160017	156M	1.000.000,00
01/11/2023	2023NC407862	2023NE000269	160017	156M	681.347,19
30/10/2023	C407598/2023NC4	2023NE000265	160017	156M	818.652,81
11/12/2023		2023NE000369	160017	156M	100.355,40
Total					**3.100.355,40**

RESUMO DOS VALORES PAGOS POR EMPENHO							
Nº NE	Soma de Valor (R$)	Liquidado	Saldo a liquidar	% Liquidado	Status NE	Data Empenho	Data Última Liq
2023NE000034	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%		30/10/2023	16/10/2023
2023NE000234	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0%		30/10/2023	18/12/2023
2023NE000269	681.347,19	541.994,40	139.352,79	79,5%		30/10/2023	13/12/2023
2023NE000265	818.652,81	0,00	818.652,81	0,0%		30/10/2023	-
2023NE000369	100.355,40	0,00	100.355,40	0,0%		11/12/2023	-
TOTAL	**3.100.355,40**	**2.041.994,40**	**1.058.361,00**	**65,9%**			

RESUMO DOS VALORES TOTAIS PAGOS

RESUMO GERAL - VALORES PAGOS

02/2023 - Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR, em Boa Vista/RR

CONTRATO	R$ 1.650.010,35	24,89%
ADITIVOS	R$ 0,00	0,00%
REAJUSTES	R$ 0,00	0,00%
REEQUILIBRIO	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 1.650.010,35**	**23,50%**

RESUMO POR PEÇAS - VALORES PAGOS		
Contrato	R$ 1.650.010,35	24,89%
TA-1	R$ 391.984,05	5,91%
	R$ 0,00	0,00%
TOTAL	**R$ 1.650.010,35**	**23,50%**

LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Medição	Nr	Empenho Ut	Nº NF	Valor NF (R$)	Data NF	OB	Data OB	Mês Exec	Ano Exec	Situação OPUS
Contrato	1	2023NE000034	514	R$ 58.188,85	11/08/2023	2023OB800503	29/08/2023	7	2023	Cadastrado
Contrato	2	2023NE000034	535	R$ 20.970,74	21/09/2023	2023OB800523	26/09/2023	8	2023	Cadastrado
Contrato	3	2023NE000034	542	R$ 28.856,36	06/10/2023	2023OB800605	16/10/2023	9	2023	Cadastrado
Contrato	3	2023NE000234	542	R$ 536.087,33	06/10/2023	2023OB800605	16/10/2023	9	2023	Cadastrado
Contrato	4	2023NE000234	558	R$ 120.855,39	10/11/2023	2023OB800670	17/11/2023	10	2023	Cadastrado
Contrato	5	2023NE000234	566	R$ 343.057,28	01/12/2023	2023NS002288	18/12/2023	11	2023	Cadastrado
Contrato	5	2023NE000269	566	R$ 281.149,44	01/12/2023	2023NS002288	18/12/2023	11	2023	Cadastrado
Contrato	6	2023NE000269	571	R$ 260.844,96	13/12/2023	2023OB800857	21/12/2023	12	2023	Cadastrado
TA-1	1	2023NE000034	535	R$ 391.984,05	21/09/2023	2023OB800523	26/09/2023	8	2023	Cadastrado

1. ASSUNTO:

Trata-se de análise da proposta do apostilamento do 1º reajustamento do saldo contratual atualizado com valor do termo aditivo nº 01, relativo ao Termo de Contrato nº 02/2023, alusivo à Construção do Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR.

2. REFERÊNCIA:

Cadastro OPUS no campo Pedido de Termo Aditivo/Reajustamento, pedido nº 98/2024, de 27/02/2024.

3. ANEXOS:

a. Documento 1: *Checklist* de Análise de Reajustamento;

b. Documento 2: Resumo do Contrato;

c. Documento 3: Justificativa do Reajustamento;

d. Documento 4: Relatório de Acompanhamento Simplificado;

e. Documento 5: Relatório de Acompanhamento Completo;

f. Documento 6: Cronograma Físico Financeiro; e

g. Documento 7: Planilha de Cálculo do Valor do Reajustamento S4/DOM.

4. ELEMENTOS DE APOIO À DECISÃO:

a. Dados contratuais

1) obra nº: 202212000405;

2) objeto: Construção do Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR;

3) termo de Contrato: nº 02/2023 – **CRO/12** ;

4) contratada: M LOBATO ENGENHARIA EIRELI;

5) referência de preços: SINAPI/RR – SET/22 – Não desonerado;

6) data da proposta de preços: 06/09/2022;

7) regime de execução: **Empreitada por preço unitário**;

8) valor contratual: R$ 6.630.295,32 ;

9) prazo de execução da obra: 720 dias corridos;

10) data da Ordem de Serviço: 17/04/2023;

11) período de execução da obra: 17/04/2023 até 06/04/2025;

12) prazo de vigência contratual: 900 dias corridos;

13) vigência contratual: 04/04/2023 até 20/09/2025;

14) situação física da obra em 05/02/2024 (última informação no OPUS): 30,35%; **(OBRA ATRASADA)**; e

15) o Termo de Contrato possui cláusula para reajuste? Não, entretanto no Projeto Básico no Item 19. REAJUSTE em seu subitem "***19.1 diz "Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento a que a proposta se referir"[...].***

b. Aditivos celebrados

Vide Documento 2.

c. Reajustamentos concedidos

Não há.

d. Do pedido

Pedido de Termo Aditivo/Reajustamento, pedido nº 98/2024, de 12/12/2023, com valor de **R$ 216.136,33**.

e. Critérios adotados

1) Arts. 40 e 55, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993; e

2) DIEx nº 142-S4/DOM – CIRCULAR, de 3 DEZ 19.

f. Da análise

1) Do mérito – análise do 1º reajustamento do Termo de Contrato nº 02/2023, atualizado.

a) Pré-requisitos para a concessão do primeiro reajustamento do Termo de Contrato, atualizado:

(1) Interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data base do orçamento da administração, pela variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) – **Jul/22**; e

(2) Valor Executado Acumulado em Jul/23 (VEA $_{Jul/23}$) maior ou igual ao Valor Previsto Acumulado na última versão apostilada do cronograma físico-financeiro para o mesmo período (VPA $_{Jul/23}$).

b) Constatações

O VEA $_{Jul/23}$ (R$ 0,00) **foi menor** que o VPA $_{Jul/23}$ (R$ 305.924,61);
O VEA $_{Set/23}$ (R$ 471.143,64) **foi maior** que o VPA $_{Jul/23}$ (R$ 305.924,61);

c) Conclusões

como o VEA $_{Jul/23}$ (R$ 0,00) **foi menor** que o VPA $_{Jul/23}$ (R$ 305.924,61), conclui-se que a contratada **não fazia jus** ao primeiro reajustamento do Termo de Contrato, atualizado; e

como o VEA $_{Set/23}$ (R$ 471.143,64) **foi maior** que o VPA de $_{Jul/23}$ (R$ 305.924,61), conclui-se que a contratada faz jus ao primeiro reajustamento do Termo de Contrato atualizado em Set/23.

d) Cálculo do valor do 1º reajustamento do Termo de Contrato, atualizado.

O cálculo será feito de acordo com a fórmula abaixo:

$$R_{1,TC+TA01} = V_{1,TC+TA01} \times \frac{(I_1 - I_0)}{I_0}$$

Onde:

$R_{1,\ TC+TA01}$ = Valor do 1º reajustamento procurado; e

$V_{1,\ TC+TA01}$ = Valor do Termo de Contrato + Valor dos Termos Aditivos - Valor Previsto Acumulado do contrato (em $_{Jul/23}$).

Sendo:

Valor do Termo de Contrato: **R$ 6.630.295,34;**

Valor do Termo Aditivo TA 01: **R$ 391.922,31**;

Valor Previsto Acumulado do valor do contrato atualizado (em $_{Jul/23}$): **R$ 305.924,61;**

$V_{1,\ TC+TA01}$ = R$ 6.630.295,34 + R$ 391.922,31 - R$ 305.924,61;

$V_{1,\ TC+TA01}$ = **R$ 6.716.293,04.**

I_0 = índice do INCC, coluna 6 (seis), da revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do mês ($_{Jul/22}$), contado a partir da data do orçamento de referência, = 1043,760; e

I_1 = índice do INCC, coluna 6 (seis), da revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do 13º mês ($_{Jul/23}$), contado a partir da data do orçamento de referência, = 1076,626.

$$\text{Índice do 1º reajustamento} = [\frac{(I_1 - I_0)}{I_0}] \times 100$$

$$\text{Índice do 1º reajustamento} = [\frac{(1076{,}626 - 1043{,}760)}{1043{,}760}] \times 100 = 3{,}1488\%$$

$$R_{1,TC+TA01} = V_{1,TC+TA01} \times \frac{(I_1 - I_0)}{I_0} = \text{R\$ } 6.716.293{,}04 \times 3{,}1488\% = \text{R\$ } 211.482{,}64$$

Dessa forma, o valor do 1º reajustamento do Termo de Contrato nº 02/2023, atualizado, ficou calculado no valor de **R$ 211.482,64**.

2) Resumo do reajustamento ao Termo de Contrato

A **Tabela 1** apresenta o valor do 1º reajustamento referente ao TC + TA-01, onde se observa que a totalidade de tal reajuste é de **R$ 211.482,64**.

Tabela 1 - Cálculo do reajustamento encontrado

Apostilamento	**1º Reajustamento**		
	Saldo a reajustar	**Índice**	**Valor do Reajuste**
TC nº 02/2023	**R$ 6.716.293,04**	**3,1488%**	**R$ 211.482,64**
SUBTOTAL			
TOTAL	**R$ 211.842,64**		

MD 41-2024-P-98-2024 Fonte: O signatário

5. PARECER DA S4:

a. o parecer é pela **APROVAÇÃO** do apostilamento do 1º reajustamento do saldo contratual, atualizado com os valores do termo aditivo nº 01, relativo ao Termo de Contrato nº 02/2023, no valor de **R$ 211.482,64**;

b. para o cálculo dos valores dos reajustamentos a DOM analisou o Cronograma Físico Financeiro atualizado;

c. o Valor Executado Acumulado (VEA) foi retirado do relatório completo do OPUS referente a cada obra (Documento 5);

d. a **CRO/12** deverá apostilar os índices do 1º reajustamento em 3,1488**%**, conforme modelo encaminhado por esta Diretoria;

e. o Valor Final do Reajustamento é de **R$ 211.842,64.**

É o parecer.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUZA
Data: 05/03/2024 15:30:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUZA – Eng Civil
Adjunto da Seção de Controle e Estatística – S4

Concordo:

Documento assinado digitalmente
gov.br CELSO ANDRE MOREIRA DA ROCHA
Data: 06/03/2024 14:40:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CELSO ANDRÉ MOREIRA DA ROCHA – Cel QEM
Chefe da Seção de Controle e Estatística – S4

6. DECISÃO DA DOM:

(**X**) Concordo com o parecer da S4. Encaminhe-se.

( ) Não concordo.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO EDUARDO LIMA DE MEDEIROS
Data: 11/03/2024 19:22:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gen Bda FRANCISCO EDUARDO LIMA DE MEDEIROS
Diretor de Obras Militares

DOCUMENTO 1

	CHECKLIST **ANÁLISE DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL**

REGISTRO DE INSPEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	
OM: CRO/12	**DATA:** 05/03/2024
DOCUMENTO REFERÊNCIA: Cadastro OPUS no campo Pedido de Termo Aditivo/Reajuste, pedido nº 98/2024, de 27/02/2024.	
RESPONSÁVEL: Eng.Civil Carlos Eduardo Machado de Souza	**CREA:** 29030/D-DF

1 Cada item do *checklist* deve ser verificado sobre o documento gerado e o resultado da verificação anotado nos campos disponíveis.

2 Valores possíveis:
Sim - o item foi satisfeito;
Não - o item não foi satisfeito;
N/A - o item não se aplica no contexto do documento (informar no campo "obs").

ITEM	***Sim***	***Não***	***Obs***
Pressupostos de admissibilidade:			
1 Atendimento ao DIEx nº 468-S4/DOM – CIRCULAR (EB: 64481.002928/2013-79)			
1.1 A Justificativa está assinada?	**X**		
1.2 Foi encaminhada ou consta no OPUS a proposta completa da empresa vencedora/contratada do certame licitatório?	**X**		
1.3 Foi encaminhado ou consta no OPUS o termo de contrato?	**X**		
1.4 Foi encaminhado ou consta no OPUS o cronograma físico-financeiro da obra, original do contrato e/ou em vigor (readequado e apostilado)?	**X**		
1.5 Foi encaminhada ou consta no OPUS a planilha de todas as medições efetuadas com as respectivas datas e valores?	**X**		
1.6 Foram encaminhados os termos aditivos anteriormente aprovados?	**X**		
1.7 Informações atualizadas no OPUS?	**X**		
2 - Verificação específica - reajuste do valor contratual			
2.1 O contrato estabelece que o valor contratual pode ser reajustado e qual o índice aplicável? (arts. 5º, §1º, 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93)?	**X**		
2.2 O reajuste observa a periodicidade anual, a partir da data limite para apresentação da proposta? (arts. 40, XI, 55, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01)?	**X**		
2.3 Há previsão de recursos orçamentários para o pagamento da despesa decorrente do reajuste? (art. 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666/93)	**X**		
2.4 Apostilamento. Nos termos do artigo 65, § 8°, da Lei nº 8.666/93, o reajuste do valor contratual realiza-se por simples apostila. Nada obstante, caso coincidente com outra alteração contratual que deva ser formalizada por meio de termo aditivo, recomenda-se a sua inclusão no respectivo aditamento contratual.	**X**		

DOCUMENTO 2

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO (RTC)

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª COMPANHIA DE FUZILEIROS DO 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, em BOA VISTA/RR.

DATA: 05/03/2024

Prazos		Vigência	Execução
Contrato Original TC nº	**02/2023**	04/04/2023	08/05/2023
	Dias	**900**	**720**
		20/09/2025	27/04/2025

Valor do Contrato Inicial	**R$**	**6.630.295,34**

Data	Termo Aditivo	Acréscimo	Supressão	Somatório	% (Acréscimo)	% (Supressão)
04/11/2023	TA 01	R$ 391.922,31	R$ -	R$ 391.922,31	**5,91%**	**0,00%**
Somatório		**R$ 391.922,31**	**R$ -**	**R$ 391.922,31**	**5,91%**	**0,00%**

TA 01 Aprovado por intermédio da Mémória para Decisão nº 273/2023 - S4/DOM, 28/09/2023.

Data	Apostilamento	Valor
05/03/2024	1º Reaj. TC	R$ 211.482,64
	Somatório	R$ 211.482,64
	TOTAL	**R$ 211.482,64**

TC nº 02/2023 **Pleito desta análise - Memória para Decisão nº 406/2023 - S4/DOM.** **05/03/2024**

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO + 1º REAJ. TC	**R$**	**7.233.700,29**

DOCUMENTO 3

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITOBRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

JUSTIFICATIVA DE APOSTILAMENTO DO 1º REAJUSTAMENTO DO TC 02/2023

1. CONTRATO

1.1 Objeto:

Construção do Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR

1.2 INFORMAÇÕES GERAIS

1.2.1 Condições iniciais contratadas

- **Licitação:** Tomada de Preco 09/2022
- **Regime de execução:** Empreitada por preço unitário
- **Data da proposta:** set/22
- **Empresa contratada:** MLOBATO ENGENHARIA EIRELI
- **Valor inicial contratual:** R$ 6.630.295,32
- **Prazo de execução da obra:** 840 dias
- **Prazo de vigência da obra:** 900 dias
- **Data da Ordem de Serviço:** 08/05/2023
- **Período de execução da obra:** 08/05/2023 a 25/08/2025
- **Data da assinatura do contrato:** 04/04/2023
- **Período de vigência contratual:** 04/04/2023 a 20/09/2025

1.2.2 Termos Aditivos celebrados

- 1º Termo Aditivo de prazo de 120 dias

1.2.3 Termos de Apostilamento celebrados

- Não houve

1.2.4 Situação atual do contrato

- **Prazo de execução:** 840 dias
- **Termino da execução:** 25/08/2025
- **Prazo de vigência:** 900 dias
- **Termino da vigência:** 20/09/2025
- **Valor contratual atualizado (incluindo apostilamento):** R$ -
- **Valor total empenhado:** R$ 3.100.355,40

2. EXPOSIÇÃO DOS FATOS / JUSTIFICATIVA TÉCNICA

2.1 Justificativa técnica para o reajuste

A empresa contratada solicitou , em 21 SET 23, o apostilamento do 1º Reajuste de Preços ao saldo contratual do referido Contrato, tendo em vista já ter passado o interregno de mais de um ano, a contar da data de referência, conforme disciplina o Termo de Referência.

Face ao esposto, visto que o Termo de Referência determina a data de referência como a data de apresentação do orcamento, que no caso do presente contrato foi elaborada com base de JUL 22, esta será tomada para o cálculo.

O Reajustamento será calculado a partir da fórmula abaixo, prevista na Cláusula Oitava do TC 02/2023: $R_1 = \sum \mathbf{TAs} \times (I_2 - I_1)/I_1$. (Equação 1 - do 1º Reajuste)

Onde:

- $\mathbf{R_1}$ - é o valor do 1º Reajustamento;
- $\sum \mathbf{TAs}$ - é a soma do saldo contratual e todos os aditivos a reajustar;
- $\mathbf{I_1}$ - é o índice do INCC do mês de apresentação da proposta, base para cálculo do reajuste;
- $\mathbf{I_2}$ - é o índice do INCC do 13º mês, contado a partir da apresentação da proposta;
- $\mathbf{(I_2 - I_1) / I_1}$ – é o percentual de reajuste do 1º Reajustamento.

Sendo:

- ∑ TAs = 6.864.085,64
- I_1 = INCC $_{JUL/22}$ = 1043,760
- I_2 = INCC $_{JUL/23}$ = 1076,626

Logo:

- (I_2 - I_1) / I_1 = (1076,626 - 1043,76)/1043,76 = 3,1488%
- R_1 = 216136,329
- **R_1 = R$ 216.136,33**

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
b. Cláusula Sexta – Do Reajustamento de precos em sentido amplo – do Termo de Contrato 02/2023
c. Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

4. CONCLUSÃO

Face ao exposto, esta fiscalização é de parecer favorável à aprovação do primeiro e segundo reajustamento contratual, referente ao saldo contratual do TC 02/2023 no valor de R$ 216.136,33 (Duzentos e dezesseis, cento e trinta e seis reais e trinta e tres centavos), conforme explanado no item 2.

5. ANEXOS

- Planilha orçamentária da administração;
- Cronograma físico-financeiro vigente;
- Cronograma consolidado com o cálculo do reajuste;
- Tabela de índices do INCC;
- Relatório de acompanhamento simplificado do OPUS;
- Ficha de Informações Gerais de Obra.

Manaus/AM, 02 de fevereiro 2024

[redacted] – 2º TEN
Fiscal do Contrato

CONCORDO

KLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS – MAJ QEM FC
Chefe da Seção Técnica

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

a) Concordo com a presente justificativa;
b) A Seção Técnica encaminhe para análise à DOM;
c) O Fiscal do Contrato providencie o carregamento da documentação pertinente no Sistema OPUS.

FABIO BARROS DE SOUSA – TC QEM FC
Ordenador de Despesas

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

DOCUMENTO 4


Relatório de Acompanhamento Simplificado

12ª RM

202212000405 - Construção / 2ª Cia Fzo Sl / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS, Boa Vista/RR

N° Contrato: 02/2023 Última medição: 05 fev 2024



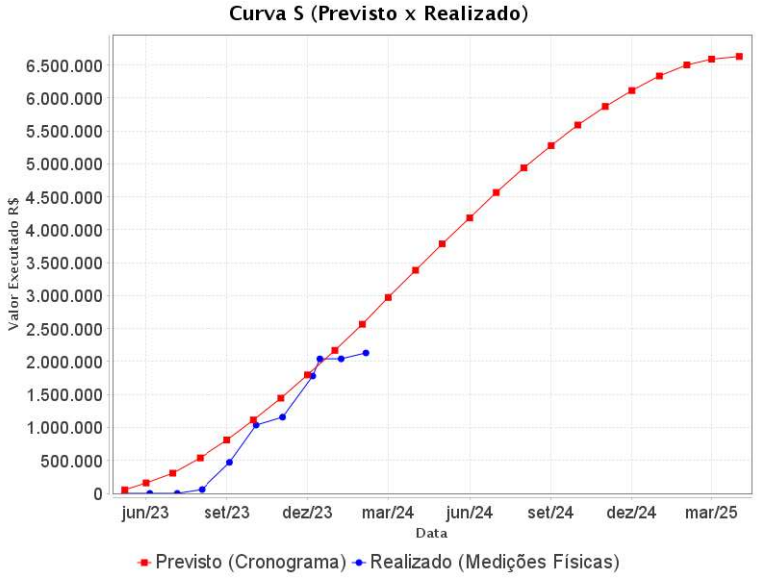

Situação Físico-Financeira	Valor (R$)	%
Contratado	7.022.279,37	100,00
Empenhado	3.100.355,40	44,15
Liquidado	2.131.506,55	30,35
Pago	2.041.994,40	29,08
Ordem de Serviço	08 mai 2023	
Prazo de Execução	27 abr 2025	
Vigência Contratual	20 set 2025	
Prev. Cronograma (%)	42.9400	⚠ Obra Atrasada
Situação Física Real (%)	30.3500	

Observações:

AO 156M Fiscal: 2° Ten Wanessa / 1º Ten Dunai (Substituto) | Empresa: M Lobato Engenharia |1) Situação: Obra em Andamento; 2) Serviços em Execução: Execução de escavação de blocos e vigas da fundação do bloco B, Escavação de vigas, forma, aço e concretagem das vigas baldrames do bloco A, inicio da alvenaria do bloco A; | 3) Impedimentos: TA 02 em análise - Serviços de terraplanagem, estacas e projetos; | 4) Providências: TA02 sendo analisado| 5) Outras info: não há

DOCUMENTO 5

Relatório de Acompanhamento Completo

02/2023 - Construção do Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em

Licitação

Objeto: Construção do Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR.

Edital:	09/2022	**Número D.O.U:**	123
OM Executante:	CRO / 12ª RM	**Data D.O.U:**	27/12/2022
Processo:	Concorrência	**Número BI:**	
Abertura:	30/11/2022	**Data BI:**	
Proposta:	16/12/2022		

Fornecedor

Nome/Razão social:	MLOBATO ENGENHARIA EIRELI		
Contato Principal:	(92) 9946-4664		
Natureza:	Pessoa Jurídica	**CPF/CNPJ:**	24.342.072/0001-85

Contrato

Objeto: Construção do Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR.

Número:	02/2023	**Fiscal:**	[redacted]
Finalidade:	Execução de Obra		
Número D.O.U:		**Número BI:**	
Data D.O.U:		**Data BI:**	

	Inicial	Aditivado/Reajustado	Atual
Valor Contratado:	R$ 6.630.295,32	R$ 391.984,05	R$ 7.022.279,37
Vigência (dias):	900	0	900
Vigência (data):	04/04/2023 a 20/09/2025	0	04/04/2023 a 20/09/2025

Total contratado	Total Empenho	Total Liquidado	Total Pago
R$ 7.022.279,37	R$ 3.100.355,40	R$ 2.131.506,55	R$ 2.041.994,40

Obras do contrato

Código	Descrição	Início Obra	Prazo	Aditivos	Término	Valor contratado
202212000405	Construção / 2ª Cia Fzo Sl / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS	08/05/2023	720	-	27/04/2025	R$ 6.630.295,32


Termos aditivos

Número	Data	Tipo	Número BI	Data BI	Vigência	Valor
7052023	04/11/2023	Valor		03/11/202		R$ 391.984,05
Objeto:	Construção do Pavilhão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR.					

Obra	Valor
202212000405 - Construção / 2ª Cia Fzo Sl / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS	R$ 391.984,05

Obra N. 202212000405 - Construção / 2ª Cia Fzo SI / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS

Curva S - Previsto x Realizado

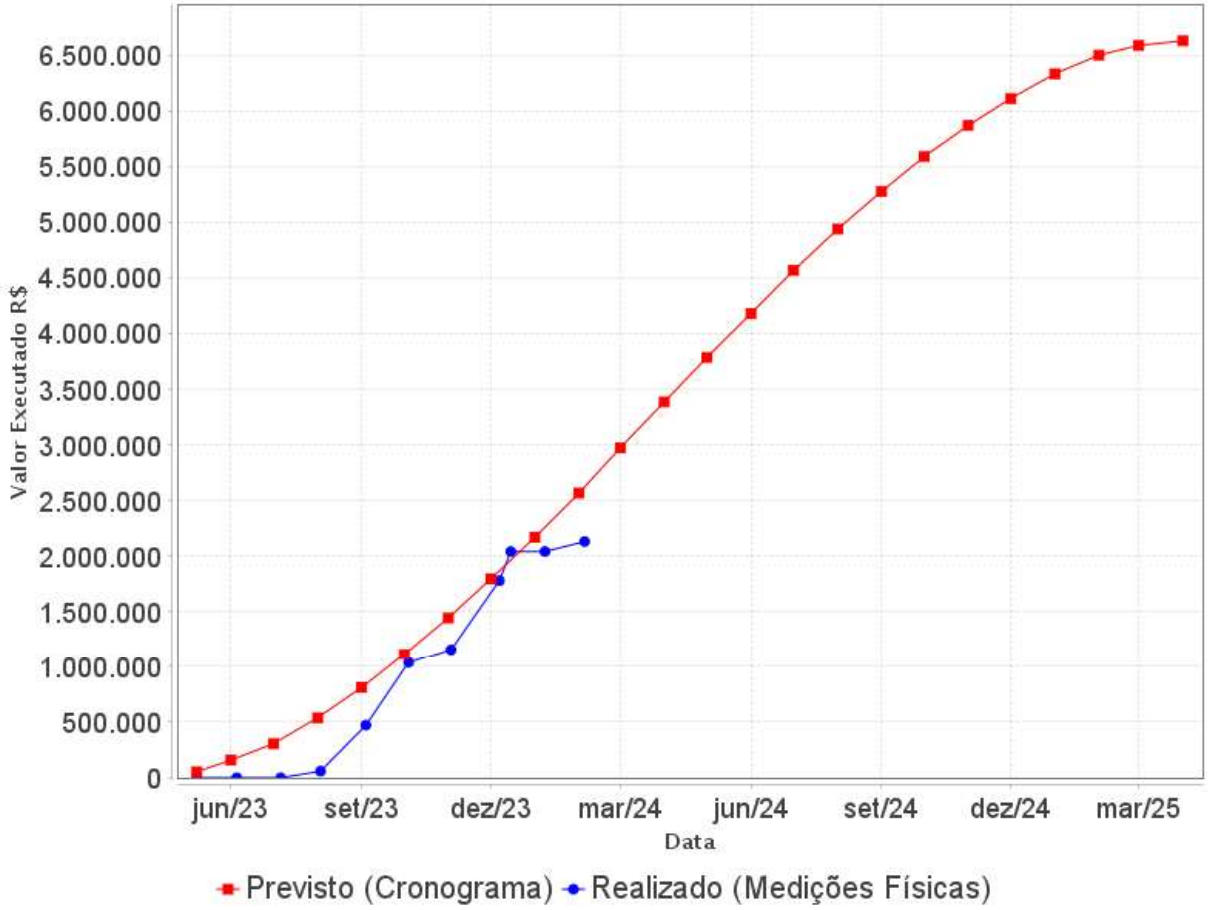

Acompanhamento físico - Visão consolidada

Etapa da obra	Represent. (Peso)	Total medido
Etapa Genérica	100,00	30.35
Percentual disponível para pagamento		**30,35**

Acompanhamento físico - Medições realizadas

Data	Engenheiro	Concluído
05/02/2024	[redacted]	30.35
08/01/2024	[redacted]	29.08
15/12/2023	[redacted]	29.08
07/12/2023	[redacted]	25.36
03/11/2023	[redacted]	17.45
04/10/2023	[redacted]	15.62
04/09/2023	[redacted]	6.22
03/08/2023	[redacted]	0.87
06/07/2023	[redacted]	0.00
05/06/2023	[redacted]	0.00

Acompanhamento financeiro - Notas de crédito DEC/DOM

Número	Data	UG Executora	UG Emitente	PTRes	Valor
2023NC406992	04/10/2023	C R O / 12ª R M	D E C	171405	R$ 1.000.000,00
2023NC400768	29/03/2023	C R O / 12ª R M	D E C	171405	R$ 500.000,00
2023NC411535	11/12/2023	C R O / 12ª R M	D E C	171405	R$ 100.355,40
2023NC407598	26/10/2023	C R O / 12ª R M	D E C	171405	R$ 391.922,31
2023NC407600	26/10/2023	C R O / 12ª R M	D E C	171405	R$ 426.730,50
2023NC407862	01/11/2023	C R O / 12ª R M	D E C	171405	R$ 681.347,19
Valor Total					**R$ 3.100.355,40**

Acompanhamento financeiro - Notas de empenho

Número	Data	PTRes	Valor
2023NE000034	03/04/2023	171405	R$ 500.000,00
2023NE000234	06/10/2023	171405	R$ 1.000.000,00
2023NE000265	30/10/2023	171405	R$ 818.652,81
2023NE000269	01/11/2023	171405	R$ 681.347,19
2023NE000369	11/12/2023	171405	R$ 100.355,40
Valor Total			**R$ 3.100.355,40**

Acompanhamento financeiro - Notas fiscais

Empenho	Data	Valor	Número OB	Data OB	Observação
2023NE000034	11/08/2023	R$ 58.188,85	2023OB80050	29/08/2023	NF 514 - 1ªMED
2023NE000034	21/09/2023	R$ 412.954,79	2023OB80056	29/09/2023	NF 335 2ªMED
2023NE000034	06/10/2023	R$ 28.856,36	2023OB80060	16/10/2023	NF 542 MED03
2023NE000234	06/10/2023	R$ 536.087,33	2023OB80060	16/10/2023	NF 542 MED03
2023NE000234	10/11/2023	R$ 120.855,39	2023OB80067	17/11/2023	NF 558 MED04
2023NE000234	01/12/2023	R$ 343.057,28	2023NS00228	18/12/2023	NF 266 MED05
2023NE000269	01/12/2023	R$ 281.149,44	2023NS00228	18/12/2023	NF 566 5MED
2023NE000269	13/12/2023	R$ 260.844,96	2023OB80085	21/12/2023	6MED NF 571
2023NE000269	21/02/2024	R$ 89.512,15			MED 07 NF 601
Valor Total			**R$ 2.131.506,55**		

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

mlobato ENGENHARIA

Obra
CC 09/2022 - Construção de Pavilhão 2ª Cia de Fuzileiros no 7º BIS, em Boa Vista/RR_

Bancos — **B.D.I**
SINAPI - 09/2022 - Roraima — 21,1%
SBC - 09/2022 - Roraima
ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 03/2022 - Minas

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,16%
Mensalista: 69,81%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00%	15,00%	35,00%	50,00%																					
		57.480,21	8.622,03	20.118,07	28.740,11																					
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%	2,00%	4,17%	5,17%	6,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	5,18%	4,17%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,17%	2,16%
		720.482,88	14.409,04	30.042,85	37.247,37	44.461,89	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	30.042,85	37.318,41	30.042,85	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.114,89	30.042,85	15.561,76
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	20,00%	20,00%																			20,00%	20,00%	20,00%	
		16.005,69	3.201,12	3.201,12																			3.205,12	3.205,12	3.205,12	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%																								
		0,00																								
5	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%													10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%
		26.489,40													2.645,94	2.645,94	2.645,94	2.645,94	2.645,94	2.645,94	2.645,94	2.645,94		2.645,94		2.645,94
6	SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)	100,00%	15,00%	35,00%	50,00%																					
		22.911,13	3.436,67	8.018,90	11.455,57																					
7	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	20,00%	25,00%	35,00%																				10,00%	10,00%
		118.448,25	23.689,65	29.612,06	41.458,89																				11.844,63	11.844,63
8	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		25,00%	30,00%	45,00%																				
		54.936,88		13.734,22	16.481,06	24.721,60																				
9	DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇO DE VISITAS E CAIXAS	100,00%																		10,00%	25,00%	20,00%	10,00%	20,00%	15,00%	
		45.816,74																		4.581,67	11.454,19	9.163,35	4.581,67	9.163,35	6.872,51	
10	ESCORAMENTO EM VALAS	0,00%																								
		0,00																								
11	ASSENTAMENTOS DE TUBOS E PEÇAS	0,00%																								
		0,00																								
12	LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE	0,00%																								
		0,00																								
13	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%				10,00%	17,50%	19,50%	21,50%	20,50%	11,00%															
		1.360.762,67				136.076,27	220.833,36	245.648,60	271.063,85	258.456,22	138.883,83															
14	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)	100,00%			10,00%	30,00%	17,00%	20,00%	23,00%																	
		122.486,91			12.249,69	36.746,67	20.824,81	24.496,78	28.174,75																	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%								10,00%	13,00%	15,00%	15,00%	16,00%	12,00%	10,00%	9,00%									
		87.697,21								8.769,72	12.700,64	14.654,58	14.654,58	15.631,55	11.723,67	8.769,72	8.792,75									
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	100,00%														10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		251.557,57														25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	25.155,79	
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00%														15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		221.895,16														33.284,27	33.284,27	22.189,52	22.189,52	22.189,52	22.189,52	22.189,52	22.189,52	22.189,52		
18	PAREDES / PAINÉIS	100,00%									10,00%	25,00%	22,00%	25,00%	18,00%											
		135.477,79									13.547,78	33.856,95	29.794,11	33.856,95	24.377,00											
19	COBERTURA	100,00%									6,00%	12,50%	14,00%	14,00%	11,00%	13,00%	12,50%	11,50%	5,50%							
		1.407.301,10									84.438,07	175.912,64	197.022,15	197.022,15	154.803,12	182.949,14	175.912,64	161.836,63	77.401,56							
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS	100,00%						50,00%	50,00%																	
		5.404,75						2.702,38	2.702,38																	
21	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	100,00%																		15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%
		113.786,75																		17.068,01	17.068,01	22.757,35	22.757,35	22.757,35	5.689,34	5.689,34
22	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00%														10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%			
		415.344,20														41.534,42	41.534,42	41.534,42	62.301,63	62.301,63	62.301,63	41.534,42	62.301,63			
23	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	100,00%								8,00%	14,00%	21,00%	20,00%	19,00%	18,00%											
		175.297,48								14.023,80	24.540,95	36.812,42	35.059,50	33.306,57	31.553,24											
24	PINTURAS	100,00%																10,00%	18,00%	17,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
		310.135,67																31.013,56	37.822,60	36.721,35	31.013,56	31.518,84	31.518,84	31.518,84		
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	100,00%																	15,00%	15,00%	5,00%	55,00%				
		6.770,75																	1.015,61	1.015,61	1.015,61	3.723,91				
26	PAVIMENTAÇÃO	100,00%													11,00%	12,50%	13,30%	12,50%	15,00%	17,50%	2,50%	5,00%				
		499.642,50													54.960,68	62.455,31	54.963,53	62.455,31	74.946,38	87.437,44	62.455,31	29.978,55				
27	URBANIZAÇÃO	100,00%														15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
		44.056,80														6.608,40	4.405,60	4.405,60	6.608,40	8.811,20	8.811,20	4.405,60				
Porcentagem			0,81%	1,58%	2,23%	3,5%	4,09%	4,67%	5,01%	5,31%	5,64%	5,98%	6,13%	6,22%	5,03%	5,85%	5,53%	5,6%	5,13%	4,7%	4,21%	3,67%	3,35%	2,61%	1,22%	0,61%
Custo			53.392,51	104.801,22	147.730,88	231.999,36	271.501,03	303.093,61	331.913,82	352.292,19	373.949,11	396.278,44	406.572,20	412.135,64	400.105,90	394.517,89	366.799,83	371.353,65	340.202,32	312.043,35	279.224,95	243.188,55	221.925,20	166.751,19	67.911,53	40.741,97
Porcentagem Acumulado			0,81%	2,39%	4,6%	8,11%	12,21%	16,78%	21,79%	27,1%	32,74%	38,72%	44,85%	51,06%	57,1%	63,05%	68,58%	74,18%	79,31%	84,32%	88,53%	92,2%	95,55%	98,06%	99,29%	100,0%
Custo Acumulado			53.392,50	158.193,72	305.924,50	537.923,97	809.424,99	1.112.518,60	1.444.512,42	1.796.794,61	2.170.743,72	2.567.022,16	2.973.594,35	3.385.729,99	3.785.835,85	4.180.353,79	4.557.153,61	4.928.507,26	5.268.709,58	5.580.752,93	5.859.977,88	6.113.166,43	6.334.991,63	6.501.742,82	6.569.653,35	6.610.395,32

MLOBATO ENGENHARIA LTDA

MLobato Engenharia LTDA
Matheus Lobato
Engenheiro Civil
CREA 14529/AM

DOCUMENTO 6

Página 3013

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

DOCUMENTO 7

PLANILHA DE CUSTO DO VALOR DO REAJUSTE - PCVR

2021120000695 TC Nº 02/2023

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 2ª COMPANHIA DE FUZILEIROS DO 7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, em BOA VISTA/RR.

		VALORES CONGELADOS APÓS O 1º REAJUSTAMENTO DE TC												VALORES CONGELADOS APÓS 2º REAJUSTAMENTO DE TC																						
		Mês Base	OS 08/05/2023		1º Ano				TA-01													2º Ano														
		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720									
		jul/22	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	Totais									
Termo de Contrato	TC nº 02/2023		R$ 53.392,51	R$ 104.801,22	R$ 147.730,88	R$ 231.999,36	R$ 271.501,03	R$ 303.093,61	R$ 331.983,82	R$ 352.292,19	R$ 373.949,11	R$ 396.278,44	R$ 406.572,20	R$ 412.135,64	R$ 400.105,90	R$ 394.517,89	R$ 386.799,83	R$ 371.353,65	R$ 340.202,32	R$ 312.043,35	R$ 279.224,95	R$ 243.188,55	R$ 221.825,20	R$ 166.751,19	R$ 87.810,53	R$ 40.741,97	R$ 6.630.295,34									
Consolidação discretizada	R$ -		R$ 53.392,51	R$ 104.801,22	R$ 147.730,88	R$ 231.999,36	R$ 271.501,03	R$ 303.093,61	R$ 331.983,82	R$ 352.292,19	R$ 373.949,11	R$ 396.278,44	R$ 406.572,20	R$ 412.135,64	R$ 400.105,90	R$ 394.517,89	R$ 386.799,83	R$ 371.353,65	R$ 340.202,32	R$ 312.043,35	R$ 279.224,95	R$ 243.188,55	R$ 221.825,20	R$ 166.751,19	R$ 87.810,53	R$ 40.741,97	R$ 391.922,31									
Consolidação acumulada	R$ -		R$ 53.392,51	R$ 158.193,73	R$ 305.924,61	R$ 537.923,97	R$ 809.425,00	R$ 1.112.518,61	R$ 1.444.502,43	R$ 1.796.794,62	R$ 2.170.743,73	R$ 2.567.022,17	R$ 2.973.594,37	R$ 3.385.730,01	R$ 3.785.835,91	R$ 4.180.353,80	R$ 4.567.153,63	R$ 4.938.507,28	R$ 5.278.709,60	R$ 5.590.752,95	R$ 5.869.977,90	R$ 6.113.166,45	R$ 6.334.991,65	R$ 6.501.742,84	R$ 6.589.553,37	R$ 6.630.295,34	R$ 7.022.217,65									
Valor do 1º reajustamento					R$ 7.305,20	R$ 8.549,02	R$ 9.543,81	R$ 10.453,51	R$ 11.092,98	R$ 11.774,91	R$ 12.478,02	R$ 12.802,15	R$ 12.977,33	R$ 12.598,53	R$ 12.422,58	R$ 12.179,55	R$ 11.693,18	R$ 10.712,29	R$ 9.825,62	R$ 8.792,24	R$ 7.657,52	R$ 6.984,83	R$ 5.250,66	R$ 2.764,98	R$ 1.282,88	R$ 199.141,79									
Total discretizado com o 1º reajuste contratual	R$ -		R$ 53.392,51	R$ 104.801,22	R$ 147.730,88	R$ 239.304,56	R$ 280.050,05	R$ 312.637,42	R$ 342.437,33	R$ 363.385,17	R$ 385.724,02	R$ 408.756,46	R$ 419.374,35	R$ 425.112,97	R$ 412.704,43	R$ 406.940,47	R$ 398.979,38	R$ 383.046,83	R$ 350.914,61	R$ 321.868,97	R$ 288.017,19	R$ 250.846,07	R$ 228.810,03	R$ 172.001,85	R$ 90.575,51	R$ 42.024,85	R$ 6.829.437,13									
Total acumulado com o 1º reajuste contratual	R$ -		R$ 53.392,51	R$ 158.193,73	R$ 305.924,61	R$ 545.229,17	R$ 825.279,22	R$ 1.137.916,64	R$ 1.480.353,97	R$ 1.843.739,13	R$ 2.229.463,15	R$ 2.638.219,61	R$ 3.057.593,96	R$ 3.482.706,92	R$ 3.895.411,36	R$ 4.302.351,83	R$ 4.701.331,21	R$ 5.084.378,04	R$ 5.435.292,65	R$ 5.757.161,62	R$ 6.045.178,81	R$ 6.296.024,88	R$ 6.524.834,91	R$ 6.696.836,76	R$ 6.787.412,27	R$ 6.829.437,13										
Percentagens discretizadas	0,00%		0,78%	1,53%	2,16%	3,50%	4,10%	4,58%	5,01%	5,32%	5,65%	5,99%	6,14%	6,22%	6,04%	5,96%	5,84%	5,61%	5,14%	4,71%	4,22%	3,67%	3,35%	2,52%	1,33%	0,62%										
Percentagens acumuladas	0,00%		0,78%	2,32%	4,48%	7,98%	12,08%	16,66%	21,68%	27,00%	32,64%	38,63%	44,77%	51,00%	57,04%	63,00%	68,84%	74,45%	79,59%	84,30%	88,52%	92,19%	95,54%	98,06%	99,38%	100,00%										

INCC	jul/22	1043,760
INCC	jul/23	1076,626
D INCC (1º reajustamento)		3,1488%
Saldo a reajustar (1º reajustamento)		R$ 6.716.293,04
Valor do 1º Reajuste		R$ 211.482,64
1º REAJUSTE - TC nº 02/2023		R$ 211.482,64

Página 3014

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO 1º REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO 02/2023 – CRO/12, ALUSIVO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 2ª CIA DE FUZILEIROS NO 7° BIS, EM BOA VISTA/RR.

CONTRATADA: MLOBATO ENGENHARIA EIRELLI.

O Ordenador de Despesas da **COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR (CRO/12)**, **Tenente-Coronel** [redacted] nomeado pela Portaria nº 485, de 12 de maio de 2022, publicada no DOU nº 91, de 16 de maio de 2022, inscrito no CPF nº 828.781.613-00, portador da matrícula funcional militar nº 013091084-7, no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no processo Administrativo nº **64333.004129/2022-21 (TC 02/2023)**, e diante do permissivo estatuído no art. 65, § 8º, da Lei 8.666/1993, **REGISTRA**, mediante o presente, o reajuste do preço constante na Cláusula TERCEIRA do mencionado instrumento em **3,1488%**.

Com o reajuste de **R$ 211.482,64 (duzentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)** o valor total do contrato estabelecido na **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**, passa de **R$ 7.022.279,37 (sete milhões, vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos),** para **R$ 7.233.762,01 (sete milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e um centavo)**, valor este adicionado com a celebração de **Termos Aditivos de acréscimo e supressão de serviços**, conforme **Memória para Decisão Nº 41 - S4/DOM (05/03/2024)**, anexa.

Manaus/AM, 23 de abril de 2024.

_____

[redacted] – Tenente Coronel
CPF: 828.781.613-00
Ordenador de Despesas da CRO/12

Classificação:

MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

DIEx nº 156-Sec Tec/CRO/12
EB: 64333.001166/2024-40

Manaus, AM, 26 de março de 2024

Do Chefe da SEAp da Seção Técnica
Ao Sr Chefe da Salc
Assunto: solicitação de empenho para a Nota de Crédito 2024NC401752 - TC 02/2023

Anexos:
1) 2024NC401752_200.000,00.pdf

Em atenção ao assunto, solicito ao senhor que seja proposto ao Ordenador de Despesas desta Comissão, o empenho da nota de crédito 2024NC401752, relativo a atendimento de obras, conforme dados a seguir:

TC	Edital	Objeto	Empresa	CNPJ	Valor (R$)	ND
02/2023	C P 09/2022	Construção / 2ª Cia Fzo Sl / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS	M L O B A T O ENGENHARIA EIRELI	24.342.072/0001-85	200.000,00	449051

JANAINA APARECIDA DE MORAES COSTA - Servidor Civil
Chefe da SEAp da Seção Técnica

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Servidor Civil Janaina Aparecida de Moraes Costa**, em 26/03/2024, às 16:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
26/03/24 17:18 USUARIO: ADELITA
DATA EMISSAO : 26Mar24 VALORIZACAO : 26Mar24 NUMERO : 2024NC401752
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160017 / 00001 - C R O/12
OBSERVACAO
B4PJT23PDRAMZP026#202212000405 CONSTRUCAO 2A CIA FZO SI CMDO FRON RORAIMA7O B
IS. EMPH CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC791 - PRAZO PARA EMPENH
O: 28032024
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	228713	1000000000	449051		110407	F1DTDEFOUTR	200.000,00

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 26Mar24 16:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**24.342.072/0001-85**	DUNS®:	**945041997**
Razão Social:	**MLOBATO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**M LOBATO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/06/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**08/04/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/04/2024**
Receita Municipal	Validade:	**18/04/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007523859 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 26/03/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

MLOBATO ENGENHARIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 24.342.072/0001-85. **********

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 27 de março de 2024.

PEDIDO Nº: ***0007523859***

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/03/2024 10:23:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLOBATO ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.342.072/0001-85
Certidão nº: 20599967/2024
Expedição: 27/03/2024, às 10:23:46
Validade: 23/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.342.072/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21

Data e hora da consulta: 27/03/2024 16:25
Usuário: ***.144.962-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160017	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.583.415/0001-00	AV.CEL. TEIXEIRA NR 2061 KM 3 - PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-7514 (CHEFIA)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	228713	1000000000	449051	110407	F1DTDEFOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2024	Global	64333.004129/2022-21	-	200.000,00

Favorecido

Código	Nome
24.342.072/0001-85	MLOBATO ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
JACIRA REIS 391 SALA 08 SAO JORGE	69033-008

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
6	CONCORRENCIA

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	23	-	I	-

Descrição
B4PJT23PDRAMZP026 202212000405 CONSTRUCAO 2A CIA FZO SI CMDO FRON RORAIMA7O BIS. EMPH CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC791. *2024NC401752 de 26MAR24* CP 09/22 TC 02/2023.

Local da Entrega
CMDO 7° BIS, Av. Gen. Sampaio - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, 69308-150.

Informação Complementar
20908.14-79

Sistema de Origem
CIPIPMAISB-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2024 15:20:23	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2024 16:25
Usuário: ***.144.962-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	B4PJT23PDRAMZP026 202212000405 CONSTRUCAO 2A CIA FZO SI CMDO FRON RORAIMA7O BIS. EMPH CFM MSG NR SIAFI 20233634990, DE 23 AGO 23. NC791. *2024NC401752 de 26MAR24* CP 09/22 TC 02/2023.	200.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	Inclusão	1,00000	200.000,0000	200.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
FABIO BARROS DE SOUZA	JOAO CARVALHO
***.781.613-**	***.843.768-**
27/03/2024 15:20:23	27/03/2024 15:18:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/03/2024 15:20:23	Alteração

Classificação:

160_2024NE00092

MINISTERIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
(COMISSÃO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL)

DIEx nº 166-Sec Tec/CRO/12
EB: 64333.001198/2024-45

Manaus, AM, 27 de março de 2024

Do Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras
Ao Sr Chefe da Salc
Assunto: solicitação de empenho para a Nota de Crédito 2024NC401758 - TC 02/2023

Anexos:
1) 2024NC401758_11.842,64.pdf

Em atenção ao assunto, solicito ao senhor que seja proposto ao Ordenador de Despesas desta Comissão, o empenho da nota de crédito 2024NC401758, relativo a atendimento de obras, conforme dados a seguir:

TC	Edital	Objeto	Empresa	CNPJ	Valor (R$)	ND
02/2023	CP 09/2022	Construção / 2ª Cia Fzo SI / Cmdo Fron RORAIMA / 7º BIS	MLOBATO ENGENHARIA EIRELI	24.342.072/0001-85	11.842,64	449051

VINÍCIUS DIAS JORGE - 1º Ten
Chefe da Subseção de Fiscalização de Obras

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VINÍCIUS DIAS JORGE**, em 27/03/2024, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
27/03/24 10:09 USUARIO: ADELITA
DATA EMISSAO : 27Mar24 VALORIZACAO : 27Mar24 NUMERO : 2024NC401758
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160017 / 00001 - C R O/12
OBSERVACAO
B4PJT23PDRAMZP026#202212000405 CONSTRUCAO2A CIA FZO SICMDO FRON RORAIMA7O BIS.
EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05JAN23. NC615 - PRAZO PARA EMPENHO
: 28032024
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232012	1000000000	449051		160502	F8MOZ01APTG	11.842,64

LANCADO POR : 77468490325 - HIDELFRANCIO UG : 160502 27Mar24 09:10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**24.342.072/0001-85**	DUNS®:	**945041997**
Razão Social:	**MLOBATO ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**M LOBATO ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/06/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**15/09/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**08/04/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/04/2024**
Receita Municipal	Validade:	**18/04/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/04/2024 11:11:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MLOBATO ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **24.342.072/0001-85**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.342.072/0001-85
Certidão nº: 21583854/2024
Expedição: 01/04/2024, às 11:12:41
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MLOBATO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.342.072/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

C E R T I D Ã O E S T A D U A L D E D I S T R I B U I Ç Ã O

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007530655 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 31/03/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M LOBATO ENGENHARIA EIRELI, vinculado ao CNPJ: 24.342.072/0001-85. **************

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 1 de abril de 2024.

PEDIDO N°: ***0007530655***

Data e hora da consulta: 01/04/2024 17:20
Usuário: ***.208.272-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160017	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.583.415/0001-00	AV.CEL. TEIXEIRA NR 2061 KM 3 - PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-7514 (CHEFIA)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	92

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232012	1000000000	449051	160502	F8MOZ01APTG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/04/2024	Global	64333.004129/2022-21	-	11.842,64

Favorecido

Código	Nome
24.342.072/0001-85	MLOBATO ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
JACIRA REIS 391 SALA 08 SAO JORGE	69033-008

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
6	CONCORRENCIA

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	23	-	I	-

Descrição

B4PJT23PDRAMZP026 202212000405 CONSTRUCAO2A CIA FZO SICMDO FRON RORAIMA7O BIS. EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05JAN23. NC615. 2024NC401758 DEC 27MAR24 * CP 09/2022 * TC 02/2023 *ID 20908.14-79.

Local da Entrega

CMDO 7° BIS, Av. Gen. Sampaio - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, 69308-150.

Informação Complementar

20908.14-79

Sistema de Origem

CIPIPMAISB-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2024 12:56:36	Alteração

Data e hora da consulta: 01/04/2024 17:20
Usuário: ***.208.272-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	11.842,64

Subelemento 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	B4PJT23PDRAMZP026 202212000405 CONSTRUCAO2A CIA FZO SICMDO FRON RORAIMA7O BIS. EMPH CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05JAN23. NC615. 2024NC401758 DEC 27MAR24 * CP 09/2022 * TC 02/2023 *ID 20908.14-79.	11.842,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2024	Inclusão	1,00000	11.842,6400	11.842,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FABIO BARROS DE SOUZA
***.781.613-**
01/04/2024 12:56:36

Responsável pela Nota de Empenho
JOAO CARVALHO
***.843.768-**
01/04/2024 12:30:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2024 12:56:36	Alteração

CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024 - UASG 160062

Nº Processo: 64211.003016/2024-57.
Inexigibilidade Nº 5/2024. Contratante: CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO.
Contratado: 37.897.521/0001-01 - CLEITON GONCALVES ARQUITETURA - SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de projeto executivo..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: A. Vigência: 17/04/2024 a 17/04/2025. Valor Total: R$ 15.000,00. Data de Assinatura: 17/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2024).

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - UASG 160007

Nº Processo: 64020005012202370. Objeto: Contratação de serviços de lavanderia, visando atender as necessidades do 4° Batalhão de Aviação do Exército, Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e Organizações Militares Participantes. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 02/05/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Avenida Presidente Kennedy, S/n, Buriti - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160007-5-90002-2024. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ADILSON INACIO DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/04/2024) 160007-00001-2024NE000001

2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2024 - UASG 160015

Nº Processo: 64282004142202223.
Pregão Nº 18/2023. Contratante: COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA.
Contratado: 96.666.862/0001-27 - ABC NAUTICA LTDA - ME. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (motor de popa).
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 29/04/2024 a 29/04/2025. Valor Total: R$ 376.620,00. Data de Assinatura: 29/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2024).

6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024 - UASG 160353

Nº Processo: 64044000993202471. Objeto: Aquisição de insumos de obras.. Total de Itens Licitados: 44. Edital: 02/05/2024 das 08h30 às 11h00 e das 14h30 às 17h59. Endereço: Av Cap Ene Garcez, 1037 - Mecejana, Mecejana - Boa Vista/RR ou https://www.gov.br/compras/edital/160353-5-90009-2024. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/05/2024 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CADSON DE SOUZA BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/04/2024) 160353-00001-2024NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 - UASG 160353

Nº Processo: 64044002074202432. Objeto: Aquisição de insumos asfálticos de Manaus.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 02/05/2024 das 08h30 às 11h00 e das 14h30 às 17h59. Endereço: Av Cap Ene Garcez, 1037 - Mecejana, Mecejana - Boa Vista/RR ou https://www.gov.br/compras/edital/160353-5-90024-2024. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2024 às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CADSON DE SOUZA BARBOZA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/04/2024) 160353-00001-2024NE000001

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160017

Número do Contrato: 7/2023.
Nº Processo: 64333.003280/2022-42.
Pregão. Nº 1/2023. Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 22.871.754/0001-50 - S F PAIM. Objeto: Acrescentar +24,77% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a r$ 76.771,67 (setenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, § 1º, da lei n.º 8.666/1993; e conforme as devidas justificativas, anexa ao processo. O valor total consolidado do aditivo (vfa) é de r$ 76.771,67 (setenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos).. Vigência: 24/04/2024 a 28/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 309.995,33. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2024).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 160017

Número do Contrato: 2/2023.
Nº Processo: 64333.004129/2022-21.
Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Primeiro termo de apostilamento do 1º reajustamento do saldo contratual atualizado relativo ao termo de contrato 02/2023 - cro/12, alusivo à obra de construção do pavilhão 2ª cia de fuzileiros no 7° bis, em boa vista/rr.. Vigência: 04/04/2023 a 20/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 7.233.762,01. Data de Assinatura: 24/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 24/04/2024).

12ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 14/2023

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 64321030260202364. , publicada no D.O.U de 28/03/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de transporte fluvial de cargas secas e frigorificadas do Comando da 12ª Região Militar. Novo Edital: 02/05/2024 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h30. Endereço: Av Dos Expedicionários, 6155 Ponta Negra - MANAUS - AMEntrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/05/2024, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAVID VIEIRA DE MATOS JUNIOR
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/04/2024) 160014-00001-2024NE000001

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 160020

Nº Processo: 64581033191.
Pregão Nº 3/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 12.417.472/0001-23 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme), para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 26/04/2024 a 26/04/2025. Valor Total: R$ 1.008.278,11. Data de Assinatura: 26/04/2024.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2024).

COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 2-SSMR/1, DE 17 DE ABRIL DE 2024
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O ESTÁGIO DE INSTRUÇÃO E DE PREPARAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS (EIPOT)/2024

O Comando da 1ª Região Militar, torna público e estabelece as normas específicas para a abertura de inscrição e a realização do Processo Seletivo acima, torna público e estabelece normas específicas para a abertura de inscrição e a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS), para incorporação no Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT), por profissionais com ensino de Nível Superior, para prestação de serviço militar temporário voluntário, conforme disponibilidade de vagas no âmbito da 1ª RM.

O presente Aviso de Convocação está em vigor desde a sua respectiva data de publicidade, dia 17 de abril de 2024. As inscrições estão previstas do dia 06 a 13 de maio de 2024, e para mais informações, acesse o link disponível no sítio eletrônico: www.1rm.eb.mil.br, no qual o Aviso referenciado está disponível na íntegra.

MICHAEL PORPINO DE LIMA - MAJ
Chefe da Seção de Serviço Militar

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90001/2024

O 1º Batalhão de Guardas torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 90001/2024, a qual foi considerada vencedora dos itens: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,17, 18, 19, 23e 27, a empresa MACROMMERCE LTDA - CNPJ:47.977.771/0001-05, cujo valor total é de R$ 39.873,40; dos itens: 15, 24, 26, 49, 52, 53, 62, 66, 67e 68, a empresa R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 20.240.470/0001-30, cujo valor total é de R$ 38.874,95; dos itens: 2, 4, 22, 25, 28, 50, 55 e 56, a empresa LD 209 MAGALHÃES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 32.969.392/0001-98, cujo valor total éde R$ 11.018,55; dos itens: 54, 57, 60, 61 e 63, a empresa GMAC ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.698.898/0001-32, cujo valor total é de R$ 37.886,00; dos itens: 5 e 13, a empresa COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA - CNPJ: 50.476.428/0001-83, cujo valor total é de R$ 1.384,75; dos itens: 20 e21, a empresa J.J. VITALLI - CNPJ: 08.658.622/0001-13, cujo valor total é de R$ 2.031,55; do item: 14, a empresa PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.497.089/0001-44, cujo valor total é de R$ 3.483,00; do item: 65, a empresa SZATA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 42.883.960/0001-97, cujo valor total é de R$ 3.744,00; do item: 58, a empresa 46.665.894 DOUGLAS ARAUJO DE ALMEIDA - CNPJ: 46.665.894/0001-30, cujo valor total é de R$ 8.140,00; do item: 64, a empresa 50.927.478 GILENILDO TEIXEIRA BARBOSA - CNPJ: 50.927.478/0001-30, cujo valor total é de R$ 723,00; do item: 59, a empresa R&A COMÉRCIO & CIA LTDA - CNPJ: 45.694.790/0001-90, cujo valor total é de R$ 6.391,75; do item: 12, a empresa GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELÉTRICA - CNPJ: 38.355.128/0001-89, cujo valor total é de R$8.450,00; do item: 51, a empresa GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 50.391.734/0001-17, cujo valor total é de R$ 990,00.

ÉRICO MERCÊS SARAIVA DE AQUINO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/04/2024)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 160298

Nº Processo: 64279075459202384. Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Total de Itens Licitados: 3. Edital: 02/05/2024 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Praca Duque de Caxias, 25 - Centro, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160298-5-90003-2024. Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/05/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

FELIPPE GOMES LIMA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 30/04/2024) 160298-00001-2024NE000001

Este Documento é Peça do Processo NUP 64333.004129/2022-21
